RINGKASAN EKSEKUTIF · PLAN VIVO PV CLIMATE

Pasir Village Forest Community Carbon Project

Hutan Desa Pasir, Kab. Mempawah, Kalimantan Barat · LPHD Pasir (SK.10885/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2019) · Fasilitator: SAMPAN Kalimantan · Acuan riset 20 Oktober 2026

STATUS KESIAPAN PIN

Siap menyusun. Belum siap mengajukan.

Target realistis pengajuan PIN: **Feb–Apr 2027**, setelah 13 kriteria kesiapan terpenuhi.

≈3 dari 13 kriteria sebagian berjalan; belum ada yang terbukti lengkap

KEPUTUSAN 1

Siap mengajukan PIN?

Belum. Belum ada bukti terverifikasi untuk Project Coordinator & mandat LPHD, peta Project Area, fungsi kawasan & blok, kecocokan metodologi, FPIC tahap (i), skrining E&S, dan notifikasi otoritas.

KEPUTUSAN 2

Apa yang harus selesai dulu?

13 kriteria (Vol. II §9.8). Paling kritis: **mandat & PC · fungsi kawasan/blok** (Permenhut 6/2026 Ps. 9) · **uji metodologi PT002 · FPIC tahap (i) · Annex 3–5**.

KEPUTUSAN 3

Bagaimana masuk project pipeline?

PIN disetujui = otomatis masuk pipeline. Email ke projects@planvivofoundation.org + fee USD 1,000 → review ±6 minggu → revisi ≤6 bulan, maks 3 putaran. Berlaku 3 tahun untuk PDD. **Bukan** sertifikasi.

KEPUTUSAN 4

Dari PIN sampai penjualan?

PDD → validasi → registrasi → registry → laporan/verifikasi → issuance, **ditambah** jalur nasional: DPP oleh pendamping teregistrasi → persetujuan Menhut → SRUK → PNBP → Otorisasi & CA bila diperlukan.

! Temuan yang mengubah rencana

1 **Potensi show-stopper hukum** PRR

Permenhut 6/2026 Ps. 9(1)(a) hanya menyebut hutan produksi & *blok pemanfaatan* hutan lindung. Bila Hutan Desa Pasir di blok perlindungan HL (umum di sabuk mangrove), perlu klarifikasi Kemenhut.

2 **Risiko metodologi** CR PSA

Jalur approved PM001 + PU002 + PT002 tidak boleh dipakai bila baseline sudah berisi "effective community management" — isu nyata bagi Hutan Desa berizin sejak 2019.

3 **Mangrove & gambut belum punya jalur penuh** CR

Metodologi & modul mangrove masih *pipeline*. Rewetting gambut tidak ada jalur: PM001 melarang aktivitas yang mengubah muka air tanah.

4 **Tidak ada kredit ex-ante untuk perlindungan** CR

Protection hanya menghasilkan rPVC/vPVC. fPVC (di muka) hanya untuk restorasi. Arus kas karbon muncul setelah registrasi & monitoring.

5 **Peran SAMPAN dikukuhkan, bersyarat** CR

Pemegang PS wajib didampingi mitra/pendamping *teregistrasi* yang menyusun DPP (Permenhut 6/2026 Ps. 6(2), 13). Fasilitasi ≠ hak menjual kredit.

6 **Preseden positif** CR

MRA KLH–Plan Vivo (Sept 2025). Proyek Hutan Desa Plan Vivo Bujang Raba disetujui Menhut & masuk SRUK (Juli 2026). PIN Hutan Desa Lemo Nakai & Mane telah approved.

→ Rekomendasi segera

1. Tandatangani PKS LPHD–SAMPAN; tetapkan Project Coordinator.
2. Pastikan fungsi kawasan & blok areal Hutan Desa.
3. Mulai registrasi SAMPAN sebagai pendamping/mitra teregistrasi.
4. Analisis tutupan lahan ≥10 th; uji applicability PT002.
5. Klasifikasi mangrove/gambut/mineral; cek riwayat rehabilitasi.
6. Minta introductory call dengan Plan Vivo (draf email tersedia).
7. Laksanakan & dokumentasikan FPIC tahap (i).
8. Kirim surat pemberitahuan ke otoritas (Annex 5).
9. Susun PIN paralel; QA internal sebelum submit.
10. Komunikasi akurat: "pipeline" ≠ "certified".

INFOGRAFIS 1 · JALUR DUA LINTASAN

Dari persiapan ke penjualan: Plan Vivo *dan* negara harus sama-sama hijau

Sertifikasi Plan Vivo saja tidak cukup. Setiap unit yang dijual memerlukan langkah paralel menurut Perpres 110/2025 dan Permenhut 6/2026.

Plan Vivo PV Climate	**Pre-PIN** Mandat, data spasial, FPIC (i), Annex 3–5 `Okt 2026 →`	**PIN** Template V1.4, email + USD 1,000 `review ±6 mgg`	**Pipeline** PIN approved & publik `≤3 th ke PDD`	**PDD** Template V5.7, metodologi approved `screening 6 mgg`	**Konsultasi + review** Publik 4 mgg, review 8 mgg `resmi`	**Validasi → Registrasi** VVB/IE, MoU, sertifikat `≤3 th sejak PDD`	**Annual Report** rPVC; verifikasi ≤5 th → vPVC `review 4+2 mgg`
Indonesia Perpres 110/2025 · Permenhut 6/2026	**Kelayakan areal** Fungsi & blok (Ps. 9); registrasi pendamping (Ps. 6) `segera`	**Notifikasi** Dinas, KPH, BPSKL, Ditjen PS, unit NEK		**Catat DPP** Disusun pendamping teregistrasi (Ps. 13, 20) `cek 5 + 14 hari kerja`	**SRN PPI** Pencatatan aksi mitigasi (Perpres Ps. 87)	**Lapor validasi** ke sistem kementerian (Ps. 22)	**Persetujuan Menhut** penerbitan non-SPE GRK (Ps. 24) `berlaku 6 bulan`
Pasar registry & transaksi	**LoI saja** tidak mengikat		**Pre-financing / ERPA bersyarat** persetujuan musyawarah			**Akun registry** S&P Global (KYC)	**Issuance + SRUK + PNBP** Otorisasi & CA hanya bila klaim NDC/CORSIA

SOP Masuk project pipeline (Procedures Manual V3.9 §2.2)


- `opsional` Intro call via projects@planvivofoundation.org — tidak wajib, dianjurkan
- `GATE G1` 13 kriteria kesiapan terpenuhi
- `submit` PIN Bahasa Inggris + Annex 1–6, bayar **USD 1,000** (≈ Rp17,9 jt)
- `±6 mgg` PIN review report: kelayakan, NIR, CAR (oleh Plan Vivo; E&S reviewer isi Section D)
- `≤6 bln` Revisi; tiap respons direview ±4 mgg; **maks 3 putaran** — lewat: fee baru atau ditolak
- `APPROVED` **Masuk project pipeline** + PIN dipublikasikan di planvivo.org/pipeline. Tidak ada aplikasi pipeline terpisah.
- `3 tahun` PDD wajib diajukan; bila tidak, keluar dari pipeline

≠ Status yang sering tertukar

STATUS	FORMAL?	HASILKAN UNIT?
Inquiry / intro call	Tidak	Tidak
Pre-screening terpisah	Tidak ada	—
PIN approved = pipeline	Ya	Tidak
Methodology pipeline	Untuk metodologi	Tidak boleh dipakai
Validated	Ya	fPVC (restorasi saja)
Registered / Certified	Ya (MoU)	Belum otomatis
Akun registry	Bukan status sertifikasi	Wadah unit
Issued (rPVC / vPVC)	Ya	Ya

⏱ Tiga skenario waktu

asumsi perencanaan



Durasi resmi Plan Vivo hanya mencakup waktu review; waktu respons proyek, ketersediaan auditor, dan proses nasional adalah asumsi. Critical path: mandat → fungsi kawasan → metodologi → FPIC → PIN → PDD → validasi → persetujuan Menhut.

Sumber: PV Climate Procedures Manual V3.9; Project Requirements V5.7; Perpres 110/2025; Permenhut 6/2026.

INFOGRAFIS 2 · ANGKA, KREDIT, 90 HARI, RISIKO

Angka yang harus dipegang tim sebelum berjanji kepada warga

≥60%
pendapatan PVC neto (setelah pungutan negara) langsung untuk partisipan & local stakeholders

20%
setiap vPVC masuk Risk Buffer; +10% Achievement Reserve untuk rPVC/fPVC

10.000
tCO2e/th: batas microscale (Independent Expert) vs macroscale (wajib VVB)

6 bln
masa berlaku persetujuan Menhut untuk penerbitan unit (Permenhut 6/2026 Ps. 24)

10–50 th
Crediting Period; risiko reversal dikelola ≥50 tahun

≤5 th
siklus verifikasi; Annual Report tiap 12 bulan tanpa putus

≤40%
pedoman biaya koordinasi, manajemen & MRV dari pendapatan PVC

5 th
batas maksimal start date sebelum validasi selesai


USD Fee resmi Plan Vivo (penerbit PVC)

PIN review		1,000
PDD review — macro		1,500
PDD review — micro		3,000
Koordinasi V&V — macro		1,000
Koordinasi V&V — micro		2,000
Tech spec tambahan		500
Concept note metodologi		350
Issuance per PVC	≤50.000/th · >50.000/th	0.40 · 0.35

Sumber: PV Climate – Costs & Fees. Biaya VVB/IE, audit KAP, PNBP & pajak di luar fee ini. Kurs perencanaan Rp17.930/USD (JISDOR 13/10/2026, sumber sekunder — verifikasi di BI). Hijau = macro, biru = micro.

PVC Dari 1.000 tCO2e ke unit yang bisa dijual

ilustrasi

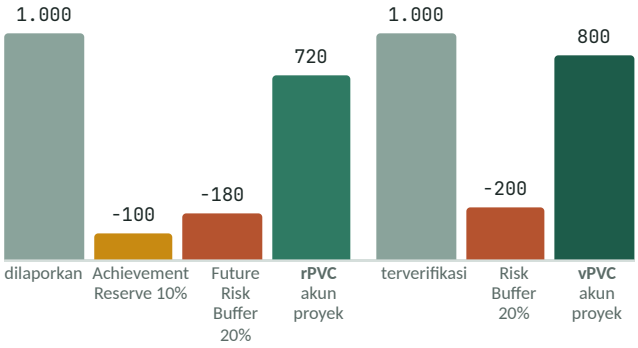

fPVC	ex-ante, **restorasi saja**; tak bisa di-retire
rPVC	dilaporkan, belum diverifikasi; tak bisa di-retire
vPVC	terverifikasi; satu-satunya yang bisa di-retire untuk klaim

Sebelum angka ini, metodologi juga memotong leakage & ketidakpastian; setelahnya ada fee issuance, PNBP, pajak. Bukan proyeksi Pasir.

M Status metodologi per intervensi

Avoided deforestation / degradation	Approved PM001+PU002+PT002 — bersyarat
Restorasi / ANR (hutan)	Approved PM001+PU001
Konservasi mangrove	Klarifikasi PT002? · modul khusus Pipeline
Restorasi mangrove	Klarifikasi PU001? · modul khusus Pipeline
Proteksi gambut (biomassa)	Approved biomassa saja; emisi tanah Klarifikasi
Rewetting / restorasi gambut	Tidak ada jalur
Konservasi tanpa ancaman	Tidak creditable

R Risiko kesiapan PIN

- Areal di blok perlindungan HL (Ps. 9)
- PT002 tidak applicable (pengelolaan sudah efektif)
- Areal dominan mangrove, metodologi belum approved
- Mandat LPHD belum jelas / konflik internal
- SAMPAN belum teregistrasi sebagai pendamping
- FPIC (i) tertunda atau ditolak
- Data spasial resmi lambat diperoleh
- Kapasitas penulisan PIN berbahasa Inggris

90 Rencana 90 hari · 20 Okt 2026 – 18 Jan 2027

M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13
Tim inti; arsip dokumen; email Plan Vivo	Rapat LPHD; minta SK & RKPS; memo hukum	Minta SHP, fungsi & blok kawasan	**PKS LPHD–SAMPAN ditandatangani**	Analisis tutupan; pemetaan partisipatif	Stakeholder analysis; surat ke otoritas	**Gate G1a: jalur metodologi**	FGD perempuan, pemuda, rentan	**Musyawarah FPIC (i); Annex 3–4**	Draf PIN bag. 1–2	Draf PIN bag. 3–4	QA internal; terjemahan	**Go / no-go submit PIN**

Sumber: PV Climate Project Requirements V5.7, Procedures Manual V3.9, Costs & Fees, daftar metodologi Plan Vivo (diakses 20/10/2026); Permenhut 6/2026.
