PLAN VIVO PV CLIMATE — PROJECT DEVELOPMENT MASTER GUIDELINE

Pasir Village Forest Community Carbon Project

Hutan Desa Pasir, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia

---

Lembaga Pengelola: LPHD Pasir (SK.10885/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2019)
Fasilitator: SAMPAN Kalimantan
Standar: Plan Vivo — PV Climate
Tanggal acuan riset: 20 Oktober 2026
Volume I–V + Lampiran A (PIN Working Draft, English)
Dokumen kerja — bukan opini hukum. Disusun dengan bantuan AI; seluruh fakta wajib diverifikasi sebelum digunakan.

Plan Vivo PV Climate — Project Development Master Guideline
Pasir Village Forest Community Carbon Project (Hutan Desa Pasir, Mempawah, Kalimantan Barat)
VOLUME I — STRATEGIC AND REGULATORY GUIDELINE
Bab 1 — Executive Summary
Bab 2 — Plan Vivo PV Climate Framework
Bab 3 — Official Requirements and Guideline Library
Bab 4 — Pasir Project Eligibility Assessment (Pre-PIN Eligibility Assessment Matrix)
Bab 5 — Indonesian Legal and Institutional Requirements
VOLUME II — PIN DEVELOPMENT DAN SUBMISSION
Bab 6 — Pre-PIN Readiness Assessment
Bab 7 — Complete PIN Preparation Handbook (section-by-section, mengikuti struktur resmi PIN Template V1.4)
Bab 8 — PIN Data and Document Requirements
Bab 9 — SOP Pengajuan PIN dan Proses Masuk Project Pipeline Plan Vivo — Hutan Desa Pasir
Bab 10 — Project Pipeline Entry and Status Verification
Bab 11 — PIN Quality Assurance Checklist
Lampiran Vol. II — PIN Working Draft Structure (English, Pasir-specific)
VOLUME III — TECHNICAL PROJECT DEVELOPMENT
Bab 12 — Methodology Selection and Applicability
Bab 13 — Institutional and Community Governance
Bab 14 — FPIC and Safeguards
Bab 15 — PIN-to-PDD Development
Bab 16 — Validation and Certification
Bab 17 — Monitoring and Verification
Bab 18 — Registry and Credit Issuance
VOLUME IV — COMMERCIAL AND FINANCIAL DEVELOPMENT
Bab 19 — Project Development Costs
Bab 20 — Carbon Financing Options
Bab 21 — Carbon Credit Commercialization
Bab 22 — Carbon Revenue and Benefit Sharing
Bab 23 — Financial and Commercial Risks
VOLUME V — IMPLEMENTATION MANUAL
Bab 24 — Complete Project Roadmap
Bab 25 — 90-Day Action Plan (20 Oktober 2026 – 18 Januari 2027)
Bab 26 — Master Document Checklist & Document Control System
Bab 27 — Roles and Responsibilities
Bab 28 — Project Readiness Dashboard (per 20/10/2026)
Bab 29 — Official Clarifications Required
Bab 30 — Immediate Recommendations for SAMPAN Kalimantan
LAMPIRAN A — PIN Working Draft (English) — Pasir Village Forest Community Carbon Project
OVERVIEW
1 General Information
2 Stakeholder Engagement
3 Project Design
4 Governance and Administration
ANNEXES

Plan Vivo PV Climate — Project Development Master Guideline

Pasir Village Forest Community Carbon Project (Hutan Desa Pasir, Mempawah, Kalimantan Barat)

Tanggal acuan riset: 20 Oktober 2026 · **Bahasa:** Bahasa Indonesia (istilah resmi tetap Bahasa Inggris)
Untuk: SAMPAN Kalimantan, LPHD Pasir, konsultan teknis, mitra pendanaan, calon pembeli

Isi

Volume	Berkas	Bab
I — Strategic & Regulatory	VOL-I_Strategic-dan-Regulatory-Guideline.md	1 Executive Summary · 2 Kerangka PV Climate · 3 Master Document Register · 4 Eligibility Matrix · 5 Hukum Indonesia
II — PIN	VOL-II_PIN-Development-dan-Submission.md	6 Pre-PIN Readiness · 7 PIN Handbook · 8 Data & Dokumen · 9 SOP Pengajuan PIN & Pipeline · 10 Status Pipeline · 11 QA Checklist
III — Teknis	VOL-III_Technical-Project-Development.md	12 Metodologi · 13 Tata Kelola · 14 FPIC & Safeguards · 15 PIN→PDD · 16 Validasi & Sertifikasi · 17 Monitoring & Verifikasi · 18 Registry & Issuance
IV — Komersial & Keuangan	VOL-IV_Commercial-dan-Financial-Development.md	19 Biaya · 20 Pembiayaan · 21 Komersialisasi · 22 Benefit Sharing · 23 Risiko
V — Implementasi	VOL-V_Implementation-Manual.md	24 Roadmap · 25 Rencana 90 Hari · 26 Dokumen & Kontrol · 27 Peran · 28 Dashboard · 29 Klarifikasi + email · 30 Rekomendasi
Lampiran A	LAMPIRAN-A_PIN-Working-Draft_Pasir_EN.md	Draf kerja PIN (English) dengan placeholder

Kode klasifikasi temuan

Kode	Arti
[CR] CONFIRMED REQUIREMENT	Tertulis eksplisit dalam dokumen resmi yang berlaku
[RP] RECOMMENDED PRACTICE	Praktik profesional yang dianjurkan, belum tentu wajib
[PSA] PROJECT-SPECIFIC ASSUMPTION	Perlu dikonfirmasi dengan data Hutan Desa Pasir
[OCR] OFFICIAL CLARIFICATION REQUIRED	Tidak dapat dipastikan dari dokumen yang tersedia
[PRR] POTENTIAL REGULATORY RISK	Perlu kajian hukum/kelembagaan

Placeholder: **[DATA REQUIRED]**, **[TO BE CONFIRMED]**, **[TECHNICAL ASSESSMENT REQUIRED]**.

Jawaban singkat empat keputusan

1. **Siap submit PIN?** Belum. Siap mulai menyusun. **Target submission 31 Maret 2027** (rentang Feb–Apr 2027); target PIN approved Juli–Sep 2027 (Vol. II §9.9). **Fee Plan Vivo:** PIN USD 1,000 (Rp17.930.000); total sampai registrasi USD 6,000 (Rp107.580.000) microscale / USD 3,500 (Rp62.755.000) macroscale, di luar biaya auditor (Vol. II §9.6). Kurs Rp17.930/USD. **Ekosistem:** Desa Pasir tidak memiliki mangrove (dikonfirmasi tim proyek); pertanyaan terbuka: gambut atau tanah mineral.
2. **Yang harus diselesaikan:** 13 kriteria (Vol. II §9.8), terutama mandat & Project Coordinator, fungsi kawasan/blok (Permenhut 6/2026 Ps. 9), uji metodologi PT002, FPIC tahap (i), Annex 3–5.
3. **Masuk pipeline:** PIN disetujui Plan Vivo = otomatis masuk project pipeline (PM V3.9 §2.2); tidak ada aplikasi terpisah; berlaku 3 tahun untuk PDD; bukan sertifikasi.
4. **PIN → penjualan:** PDD → validasi → registrasi → registry → Annual Report/verifikasi → issuance, **plus** jalur nasional: DPP oleh pendamping teregistrasi → persetujuan Menhut → SRUK → PNBP → (Otorisasi & CA bila diperlukan).

Sumber utama yang diverifikasi (diakses 20/10/2026)

Plan Vivo (resmi)

- Laman PV Climate & dokumen: https://www.planvivo.org/projects/certify-a-project/pvclimate · https://www.planvivo.org/projects/certify-a-project/pvclimate/documents
- Project Requirements V5.7; Procedures Manual V3.9; Methodology Requirements V1.2; V&V Requirements V1.1; V&V Procedures Manual V1.4; Glossary V1.5; PIN Template V1.4; PDD Template V5.7; Annual Report Template V5_1.3; Public Consultation Guidance V1.0; E&S Risk Management V1.0; E&S Assessment Guidance V1.0 (S3 assets.planvivo.org)
- Costs & Fees: https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/assets.planvivo.org/documents/PV-Climate-Documents/PV-Climate-Costs-Fees.pdf
- Metodologi/modul/tool approved & pipeline: https://www.planvivo.org/projects/certify-a-project/pvclimate/methodologies (PM001, PU002, PT002 dibaca langsung; draf PU00A dibaca)
- Pipeline proyek & PIN Indonesia (Lemo Nakai, Mane): https://www.planvivo.org/projects/carbon/pipeline
- MRA Indonesia: https://www.planvivo.org/news/plan-vivo-signs-mutual-recognition-agreement-with-indonesian-government
- SRUK & persetujuan Menhut (Bujang Raba): https://www.planvivo.org/news-insights/indonesia-launches-national-carbon-registry-alongside-first-ministerial-approvals-for-forestry-carbon-projects

Indonesia (resmi)

- Perpres 110/2025: https://jdih.kemenkoinfra.go.id/dokumen/file/perpres/2025/perpres-no.-110-tahun-2025.pdf
- Permenhut 6/2026: https://jdih.kehutanan.go.id/new2/uploads/files/PERMENHUT_6_2026.pdf
- Permen LHK 9/2021: https://jdih.kehutanan.go.id/new2/uploads/files/2021pmlhk009_menlhk_06102021150537.pdf
- PP 23/2021: https://jdih.kehutanan.go.id/new2/uploads/files/Salinan_PP_Nomor_23_Tahun_2021_menlhk_02222021080250.pdf
- Siaran pers KLH (SRUK; MRA): https://www.kemenlh.go.id/news/detail/indonesia-luncurkan-sistem-registri-unit-karbon-berstandar-internasional-menteri-lh-wujudkan-keadilan-iklim-indonesia
- FAQ OJK POJK 10/2026 (Bursa Karbon): situs ojk.go.id

Keterbatasan: teks Permen LH/BPLH 10/2026 (SRUK), isi MRA, tarif PNBP karbon, dan prosedur registrasi pendamping belum dapat diverifikasi. Data spesifik Hutan Desa Pasir (luas, fungsi kawasan, ekosistem) tidak tersedia secara publik dan **tidak diasumsikan**. Dokumen ini disusun dengan bantuan AI; seluruh fakta wajib diverifikasi manusia sebelum dipakai dalam PIN (lihat PIN Template Annex 6). Bukan opini hukum.

VOLUME I — STRATEGIC AND REGULATORY GUIDELINE

Pasir Village Forest Community Carbon Project — Hutan Desa Pasir, Kab. Mempawah, Kalimantan Barat Tanggal acuan riset: **20 Oktober 2026** · LPHD Pasir (SK.10885/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2019) · Fasilitator: SAMPAN Kalimantan · Standar: Plan Vivo — PV Climate

Kode klasifikasi: **[CR]** Confirmed Requirement · **[RP]** Recommended Practice · **[PSA]** Project-Specific Assumption · **[OCR]** Official Clarification Required · **[PRR]** Potential Regulatory Risk

---

Bab 1 — Executive Summary

1.1 Jawaban atas empat keputusan praktis

Keputusan	Jawaban singkat
1. Apakah kita siap menyusun dan mengajukan PIN?	**Siap mulai menyusun; belum siap mengajukan.** Per 20/10/2026 belum ada bukti terverifikasi untuk: Project Coordinator & mandat tertulis LPHD, peta Project Area, klasifikasi ekosistem, fungsi kawasan (HL/HP) dan blok/zona areal, kecocokan metodologi, keputusan FPIC tahap (i), skrining E&S, dan notifikasi otoritas. **Target PIN:** submission **31 Maret 2027** (rentang Feb–Apr 2027), PIN approved/masuk pipeline **Juli–September 2027** (Vol. II §9.9). Fee PIN review **USD 1,000 = Rp17.930.000**.
2. Apa yang harus diselesaikan sebelum submit?	13 kriteria kesiapan (Vol. II §9.8). Lima yang paling kritis: (a) mandat LPHD–SAMPAN & penetapan Project Coordinator; (b) **fungsi kawasan dan blok/zona areal Hutan Desa** (penentu kelayakan perdagangan karbon menurut Permenhut 6/2026 Pasal 9); (c) analisis tutupan lahan ≥10 th untuk menguji jalur metodologi PT002; (d) FPIC tahap (i); (e) Annex 3–5 PIN.
3. Proses resmi masuk project pipeline?	**PIN approved = masuk project pipeline** (Procedures Manual V3.9 §2.2). Tidak ada aplikasi pipeline terpisah. Jalur: email PIN (template V1.4) ke projects@planvivofoundation.org + fee USD 1,000 → PIN review report (≈6 minggu) → revisi ≤6 bulan, maks. 3 putaran → approval → PIN dipublikasikan di planvivo.org/pipeline. Pipeline berlaku 3 tahun untuk mengajukan PDD. Pipeline **bukan** registrasi/sertifikasi dan tidak menghasilkan PVC.
4. Langkah dari PIN sampai penjualan?	PDD (template V5.7, metodologi **approved**) → screening → konsultasi publik 4 minggu → review → validasi (VVB; atau IE bila <10.000 tCO2e/th) → MoU & registrasi → akun PV Climate Registry (S&P Global) → Annual Report → rPVC/vPVC → verifikasi ≤5 th. **Paralel di Indonesia (Permenhut 6/2026):** pencatatan DPP oleh mitra/pendamping **teregistrasi** → validasi/verifikasi → **persetujuan Menteri Kehutanan** untuk penerbitan non-SPE GRK oleh standar internasional (berlaku 6 bulan) → pencatatan di **SRUK** → PNBP per transaksi → bila dijual untuk NDC negara lain/CORSIA/kewajiban internasional: rekomendasi Menhut + **Otorisasi & Corresponding Adjustment** Menteri LH.

1.2 Temuan paling penting

1. **[CR]** Fee resmi Plan Vivo (PDF *PV Climate – Costs & Fees*; kurs Rp17.930/USD): PIN review USD 1,000 (Rp17.930.000); PDD review USD 1,500 (Rp26.895.000) macroscale / USD 3,000 (Rp53.790.000) microscale; koordinasi Validasi & Verifikasi USD 1,000 (Rp17.930.000) macro / USD 2,000 (Rp35.860.000) micro; issuance USD 0.40/PVC (Rp7.172) untuk ≤50.000 PVC/th. **Total fee Plan Vivo sampai registrasi: USD 6,000 (Rp107.580.000) microscale atau USD 3,500 (Rp62.755.000) macroscale**, belum termasuk biaya VVB/IE. Rincian: Vol. II §9.6.
2. **[CR]** Protection (REDD) **hanya** dapat menghasilkan rPVC/vPVC; fPVC (ex-ante) hanya untuk intervensi removal (restorasi). Implikasi: arus kas karbon untuk komponen perlindungan baru muncul setelah registrasi dan monitoring.
3. **[CR+PSA]** Jalur metodologi approved yang paling relevan: **PM001 + PU002 + PT002** (REDD di hutan yang dikelola masyarakat). PT002 **tidak dapat dipakai** bila baseline mencakup *effective*

community management — isu serius bagi Hutan Desa yang sudah berizin sejak 2019.
4. **[CR]** Desa Pasir **tidak memiliki mangrove** (dikonfirmasi tim proyek 21/10/2026), sehingga proyek tidak bergantung pada metodologi mangrove yang masih pipeline. Pertanyaan ekosistem yang tersisa: **gambut atau tanah mineral**. Restorasi/rewetting gambut tidak punya jalur karena PM001 melarang aktivitas yang memengaruhi muka air tanah; perlindungan hutan rawa gambut dapat dikreditkan untuk biomassa, sedangkan perlakuan emisi tanah gambut perlu klarifikasi.
5. **[CR — teks resmi] Perpres 110/2025** (10/10/2025) mencabut Perpres 98/2021; **Permenhut 6/2026** (diundangkan 13/04/2026) mencabut Permen LHK 7/2023 dan mengatur jalur unit non-SPE GRK dari standar internasional.
6. **[PRR]** Permenhut 6/2026 Pasal 9 ayat (1) huruf a: karbon yang dapat diperdagangkan dari kawasan hutan negara dibatasi pada **hutan produksi** dan **blok pemanfaatan hutan lindung** yang telah dibebani persetujuan. Jika sebagian/seluruh Hutan Desa Pasir berada di blok perlindungan hutan lindung (perlu dicek pada SK & RKPS), kelayakan perdagangan untuk areal itu **harus diklarifikasi** ke Kementerian Kehutanan, meskipun Permen LHK 9/2021 Pasal 121 membolehkan kegiatan penyerapan/penyimpanan karbon di blok perlindungan.
7. **[CR — teks resmi]** Permenhut 6/2026 Pasal 6(2): pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial **wajib didampingi mitra atau pendamping yang teregistrasi**; Pasal 13(1)(b): DRAM/DPP **disusun oleh mitra/pendamping teregistrasi**. Ini mengukuhkan peran SAMPAN — **dengan syarat SAMPAN teregistrasi**.
8. **[CR — sumber resmi Plan Vivo & KLH]** Plan Vivo dan Kementerian LH menandatangani **Mutual Recognition Agreement** (diumumkan 17/09/2025) yang mengakui PV Climate. Proyek Plan Vivo **Bujang Raba** (Hutan Desa, Jambi, KKI Warsi) termasuk empat proyek pertama yang memperoleh persetujuan Menteri Kehutanan (6/07/2026) dan masuk SRUK (diluncurkan 9/07/2026). Ini preseden kuat bahwa jalur Hutan Desa–Plan Vivo dapat berfungsi.
9. **[CR]** Dua PIN Hutan Desa Indonesia telah *approved* Plan Vivo: Lemo Nakai (KKI Warsi; PIN V3.0, 24/07/2024) dan Mane, Pidie (CFES & F&F; PIN V5.1, 28/05/2025) — menunjukkan beberapa putaran revisi wajar terjadi.

1.3 Rekomendasi inti (90 hari)

1. Tandatangani PKS LPHD–SAMPAN dan tetapkan Project Coordinator (rekomendasi kerja: SAMPAN, atas mandat LPHD) — **sekaligus** proses registrasi SAMPAN sebagai mitra/pendamping teregistrasi.
2. Peroleh salinan SK Hutan Desa + peta + **fungsi kawasan & blok/zona** (RKHD/RKPS).
3. Lakukan analisis tutupan lahan & reference region (uji PT002) dan klasifikasi gambut/tanah mineral.
4. Kirim email permintaan *introductory call* ke Plan Vivo (draf di Vol. V Bab 29).
5. Laksanakan FPIC tahap (i) dengan dokumentasi lengkap.
6. Susun PIN paralel; ajukan hanya bila 13 kriteria terpenuhi.


Bab 2 — Plan Vivo PV Climate Framework

2.1 Arsitektur standar

- **PV Climate** = standar karbon Plan Vivo untuk proyek berbasis masyarakat/petani kecil (Project Requirements V5.x). Proyek menghasilkan **Plan Vivo Certificates (PVCs)**.
- Dokumen inti: Project Requirements (PR), Methodology Requirements, Validation & Verification Requirements, Glossary + Procedures Manual (PM), V&V Procedures Manual, template PIN/PDD/Annual Report, dan metodologi/modul/tool.
- **Prinsip kunci [CR]:** intervensi Protection/Restoration/Improved Management; partisipan petani/komunitas skala kecil (PR §2.3); ≥60% pendapatan PVC langsung untuk partisipan & local stakeholders (PR §3.16.2); FPIC 3 tahap (PR §2.6); Risk Buffer 20% (PR §3.11); Crediting Period 10–

50 tahun (PR §3.15); risiko reversal dikelola ≥50 tahun (PR §3.11.1); verifikasi ≤ tiap 5 tahun (PR §4.7.1).
- **Ruang lingkup:** proyek tunggal atau berkelompok; proyek yurisdiksi/JREDD tidak disertifikasi; tidak ada batas geografis; *start date* hingga 5 tahun sebelum validasi selesai (PM §7).

2.2 Siklus sertifikasi resmi [CR — PM §1]



2.3 Macroscale vs Microscale [CR]

- **Microscale** (<10.000 tCO2e/th): boleh validasi/verifikasi melalui Plan Vivo + **Independent Expert (IE)** — lebih murah, tetapi vPVC **tidak** eligible label CCP/CORSIA (PM §8.2).
- **Macroscale** (≥10.000 tCO2e/th): wajib **VVB** yang disetujui Plan Vivo.
- Ambang dalam dokumen sedikit berbeda (lihat Vol. III §16.1) — **[OCR]** bila estimasi mendekati 10.000.

Bab 3 — Official Requirements and Guideline Library

3.1 Master Document Register

No	Dokumen resmi	Versi	Tanggal efektif / rilis	Fungsi	Tahap	Mandatory/Guidance	URL resmi
1	PV Climate Project Requirements	V5.7	30/04/2026 (rilis; ketentuan baru berlaku ≤12 bulan kecuali ditentukan lain — PM §11.1.2)	Persyaratan proyek	PIN–verifikasi	Mandatory	https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/assets.planvivo.org/documents/PV-Climate-Documents/PV-Climate_Project-Requirements_V5.7.pdf
2	PV Climate Procedures Manual	V3.9	30/04/2026	Prosedur PIN, PDD, validasi, registrasi, issuance, buffer, CA	Semua	Mandatory	.../PV-Climate_Procedures-Manual_V3.9.pdf
3	Methodology Requirements	V1.2	03/09/2024	Syarat metodologi	Metodologi	Mandatory (bagi developer metodologi)	.../PV-Climate_Methodology-Requirements_V1.2.pdf
4	Validation & Verification Requirements	V1.1	01/11/2023	Syarat V&V, VVB, IE	Validasi/verifikasi	Mandatory	.../PV-Climate_Validation-Verification-Requirements_V1.1.pdf
5	Validation & Verification Procedures Manual	V1.4	19/12/2025 (versi terakhir di tabel kontrol)	Prosedur audit, approval VVB/IE	Validasi/verifikasi	Mandatory	.../PV-Climate_Validation-and-Verification-Procedures-Manual_V1.4.pdf
6	Glossary	V1.5	23/03/2026	Definisi	Semua	Mandatory (interpretasi)	.../PV-Climate_Glossary_V1.5.pdf
7	PIN Template	V1.4	Tidak tercantum; versi di laman per 20/10/2026	Format PIN	PIN	Mandatory	.../PV-Climate_V5_PIN-Template_V1.4.docx

No	Dokumen resmi	Versi	Tanggal efektif / rilis	Fungsi	Tahap	Mandatory/Guidance	URL resmi
8	PDD Template	V5.7	Tidak tercantum; versi di laman per 20/10/2026	Format PDD	PDD	Mandatory	.../PV-Climate_PDD-Template_V5.7.docx
9	Annual Report Template	V5_1.3	Tidak tercantum	Pelaporan tahunan	Pasca-registrasi	Mandatory	.../PV-Climate_Annual-Report-Template_V5_1.3.docx
10	Methodology Concept Note / Methodology / Module templates	V1.1	Tidak tercantum	Pengembangan metodologi baru	Bila perlu	Mandatory bila mengembangkan metodologi	laman dokumen
11	Public Consultation Guidance Manual	V1.0	Tidak tercantum	Tata cara konsultasi publik PDD/metodologi	PDD	Guidance	.../PV-Climate_Public-Consultation-Guidance_V1.pdf
12	E&S Safeguards Risk Management in Plan Vivo Projects	V1.0	Agustus 2024	Exclusion list, screening, ESA, ESMP	PIN–implementasi	Guidance (kuesioner wajib via template)	.../ESRiskManagement_PlanVivoProjects_V1.0.pdf
13	E&S Assessment Guidance	V1.0	Tidak tercantum	Panduan ESA	PDD	Guidance	.../ESAssessmentGuidance_PlanVivoProjects_V1.0.pdf
14	Participatory Toolkit	—	Laman web	Tools 1–17	Semua	Recommended	https://www.planvivo.org/participatory-toolkit
15	Approved methodologies/modules/tools (PM001, PM002, PU001–PU009, PT001–PT006)	lihat Vol. III §12.1	lihat Vol. III	Kuantifikasi karbon	PDD	Mandatory (yang dipilih)	https://www.planvivo.org/projects/certify-a-project/pv climate/methodologies
16	PV Climate – Costs & Fees	tanpa versi	Diakses 20/10/2026	Fee resmi	Semua	Mandatory	https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/assets.planvivo.org/documents/PV-Climate-Documents/PV-Climate-Costs-Fees.pdf
17	PV Climate Registry (S&P Global)	—	—	Issuance, transfer, retirement	Pasca-registrasi	Mandatory	https://mer.markit.com/br-reg/public/customer-registration.jsp
18	Terjemahan Bahasa Indonesia: Glosarium V1.5, Persyaratan Metodologi V1.2, Manual Prosedur V3.9, Persyaratan Proyek V5.7, Persyaratan V&V V1.1, Manual Prosedur V&V V1.4	sama	—	Bahan sosialisasi	Semua	Referensi (versi Inggris yang mengikat **[OCR]**)	laman dokumen, folder "Dokumen-dalam-Bahasa-Indonesia"
19	Plan Vivo Standard V4 (2013) & dokumen V4	V4	2013	Arsip	—	**Tidak berlaku** untuk proyek baru	laman dokumen

(.../ = `https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/assets.planvivo.org/documents/PV-Climate-Documents/`)

Catatan versi [CR]: PM §11.1.2 — pembaruan berlaku dalam 12 bulan kecuali dinyatakan lain, dan proyek divalidasi/diverifikasi terhadap versi terbaru yang sudah berlaku. Selalu cek ulang laman dokumen pada hari submission.

3.2 Ringkasan per dokumen inti

(1) Project Requirements V5.7 — Bagian 1 Eligible Interventions (1.1 intervensi; 1.2 hak kelola, batas, larangan pemindahan paksa); 2 Stakeholder Engagement (2.1–2.6 termasuk FPIC); 3 Project Design (baseline 3.1–3.4; project logic 3.5; technical specification 3.6–3.8; risk management 3.9–3.13; agreements 3.14–3.18); 4 Monitoring & Reporting (4.1–4.10); 5 Governance & Administration (5.1–5.5). *Implikasi Pasir:* seluruh persyaratan dinilai bertahap: PIN menguji kelayakan dasar; PDD harus memenuhi semuanya. Persyaratan yang paling sensitif: 1.2.1 (hak manfaat dari penjualan PVC), 2.2 (Project Coordinator), 2.6 (FPIC), 3.7.3 (Regulatory Surplus), 3.13 (double counting), 3.16 (≥60%), 5.3.2 (bukti otoritas diinformasikan & tidak keberatan), 5.5.2 (audit keuangan tahunan). *Aksi:* gunakan matriks kelayakan Bab 4.

(2) Procedures Manual V3.9 — §1 proses; §2 PIN; §3 metodologi; §4 macroscale; §5 microscale; §6 registrasi & registry; §7 Annual Report; §8 verifikasi; §9 timeline; §10 update PDD; §11 update standar; §12–13 suspensi & dekertifikasi; §14–16 PVC, buffer, CA, loss events; §17 non-issuing. *Aksi:* SOP Vol. II Bab 9 dan roadmap Vol. III Bab 16 diturunkan dari dokumen ini.

(3) PIN Template V1.4 — lihat Vol. II Bab 7.

(4) PDD Template V5.7 — lihat Vol. III Bab 15 (17 annex).

(5) Methodology Requirements V1.2 — relevan hanya bila tidak ada metodologi approved yang cocok (mis. restorasi hidrologi gambut); concept note USD 350 dahulu.

(6) V&V Requirements V1.1 & Procedures Manual V1.4 — VVB/IE harus disetujui Plan Vivo; audit plan disetujui sebelum site visit; maks 3 FAR.

(7) E&S Risk Management V1.0 — tahap 1 PIN: Exclusion List + E&S Screening; tahap 2 PDD: E&S Assessment (tailored ESA; ESIA bila high risk) + ESMP (moderate); tahap 3 implementasi: monitoring tahunan, verifikasi, evaluasi akhir ESMP.

(8) Public Consultation Guidance V1.0 — PDD dipublikasikan di laman pipeline; feedback lewat email ke projects@; dipertimbangkan VVB saat validasi dan dimuat dalam validation report.

(9) Costs & Fees — lihat Vol. IV Bab 19.

Bab 4 — Pasir Project Eligibility Assessment (Pre-PIN Eligibility Assessment Matrix)

Status: **Confirmed Compliant / Partially Ready / Information Required / Potential Non-Compliance / Not Applicable**

Requirement	Referensi resmi	Bukti proyek Pasir (per 20/10/2026)	Status	Gap	Aksi	Prioritas
Intervensi masuk kategori Protection/Restoration/Improved Mgmt	PR 1.1.1	Belum ditetapkan	Information Required	Desain intervensi	Analisis driver + desain partisipatif	Tinggi
Manfaat livelihood bukan hanya dari PVC/upah	PR 1.1.2	—	Information Required	Usaha livelihood	Identifikasi HHBK/jasa lingkungan	Sedang

Requirement	Referensi resmi	Bukti proyek Pasir (per 20/10/2026)	Status	Gap	Aksi	Prioritas
Partisipan punya hak statutory/customary untuk mengelola & **memperoleh manfaat dari penjualan PVC**	PR 1.2.1	SK Hutan Desa 2019 (nomor)	Partially Ready	Salinan SK; hak atas manfaat karbon tunduk Permenhut 6/2026	Kajian hukum; konfirmasi Plan Vivo	**Kritis**
Areal di dalam Project Region, batas dipetakan	PR 1.2.2	—	Information Required	SHP	GIS	Tinggi
Tidak ada pemindahan paksa fisik/ekonomi	PR 1.2.3	—	Information Required	Analisis pembatasan akses	Skrining E&S	Tinggi
Kawasan **eligible untuk perdagangan karbon nasional**	Permenhut 6/2026 Ps. 9(1)(a)	Fungsi & blok belum diketahui	Information Required / **Potential Non-Compliance** bila blok perlindungan HL	Fungsi kawasan & blok	Cek SK, RKHD, peta kawasan; klarifikasi Ditjen PS	**Kritis**
Stakeholder analysis	PR 2.1	Identifikasi awal (belum terdokumentasi)	Partially Ready	Dokumen	Tool 1	Tinggi
Project Coordinator berbadan hukum & berkapasitas	PR 2.2.1	SAMPAN (legalitas belum dihimpun)	Information Required	Akta, pengalaman	Kumpulkan; putuskan PC	**Kritis**
Pembagian fungsi diformalkan tertulis	PR 2.2.2	PKS dalam persiapan	Partially Ready	PKS	Finalisasi	**Kritis**
Mitra/pendamping **teregistrasi** (hukum nasional)	Permenhut 6/2026 Ps. 6(2), 13(1)(b)	Belum diketahui	Information Required	Registrasi SAMPAN	Cek prosedur registrasi pendamping/mitra PS	**Kritis**
Partisipan residen, skala kecil, tidak bergantung tenaga upahan	PR 2.3	—	Information Required (kemungkinan besar terpenuhi **[PSA]**)	Data rumah tangga	Survei	Sedang
Desain partisipatif & inklusif	PR 2.4	Koordinasi awal	Partially Ready	Rangkaian FGD	Rencana	Tinggi
Stakeholder Engagement Plan	PR 2.5.1	—	Information Required	SEP	Draf	Sedang
FPIC 3 tahap; tahap (i)	PR 2.6; PIN Annex 4 §C	Persiapan	Information Required	BA tahap (i)	Musyawarah	**Kritis**
Baseline sesuai metodologi approved	PR 3.1–3.2	—	Information Required	Analisis tutupan	GIS	Tinggi
Metodologi approved applicable	PR 3.2 Guidance; PM §3	PT002 kandidat	Information Required	Uji "effective community management"; perlakuan tanah gambut	Analisis + tanya Plan Vivo	**Kritis**
Additionality & Regulatory Surplus	PR 3.7	—	Information Required / **[PRR]**	Kewajiban hukum pemegang PS	Kajian hukum	Tinggi
Tidak ada konversi ekosistem alami 10 th (restorasi)	PR 3.8, 3.9.13 Guidance	—	Information Required	Citra historis	GIS	Tinggi
Exclusion List	PR 3.9.2	—	Information Required	Annex 3	Isi	Sedang
Spesies asli	PR 3.9.10	—	Not yet applicable	—	Desain restorasi	Rendah

Requirement	Referensi resmi	Bukti proyek Pasir (per 20/10/2026)	Status	Gap	Aksi	Prioritas
MoU instansi penegak hukum bila patroli didukung pemerintah	PR 3.9.9	—	Information Required	—	Putuskan model patroli	Sedang
Tidak tumpang tindih/terdaftar di program lain	PR 3.13.1, 3.13.5	—	Information Required	Cek registri	SRN/SRUK, Verra, GS	Tinggi
Bukti otoritas diinformasikan, tanpa keberatan	PR 5.3.2; PIN Annex 5	—	Information Required	Surat	Kirim	Tinggi
Audit keuangan tahunan	PR 5.5.2	—	Not Applicable s.d. ada pendapatan (siapkan)	Anggaran audit	Rencana	Rendah
Rencana keuangan	PR 5.4; PIN 4.3	—	Information Required	Anggaran	Susun	Sedang

Isu kelayakan kritis yang perlu klarifikasi dini dengan Plan Vivo: (1) penerimaan struktur PC (SAMPAN) + LPHD sebagai wakil partisipan; (2) penerapan PT002 pada Hutan Desa berizin sejak 2019 dan perlakuan emisi tanah gambut; (3) cara Plan Vivo memperlakukan persyaratan nasional (persetujuan Menhut, SRUK, PNBP, kemungkinan pembatalan/pemindahan unit ke registri nasional) dalam PIN/PDD; (4) implikasi MRA KLH–Plan Vivo terhadap proyek baru.

Bab 5 — Indonesian Legal and Institutional Requirements

> Basis verifikasi: teks resmi Perpres 110/2025, Permenhut 6/2026, Permen LHK 9/2021, PP 23/2021 telah dibaca (pasal yang dikutip). Ketentuan yang hanya bersumber dari siaran pers resmi atau sumber sekunder ditandai. **Kajian ini bukan opini hukum** — wajib dikonfirmasi oleh penasihat hukum dan instansi terkait.

5.1 Peta regulasi utama per 20/10/2026

Regulasi	Status	Inti relevansi
PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan	Berlaku	Hutan Desa di HL & HP (Ps. 204); usaha jasa lingkungan & kerja sama dengan para pihak (Ps. 206); persetujuan kepada lembaga desa (Ps. 215(1)); jasa lingkungan di HL & HP (Ps. 215(2)); 35 th dapat diperpanjang (Ps. 216); **persetujuan bukan kepemilikan kawasan** (Ps. 218); larangan memindahtangankan/menyewakan areal (Ps. 212)
Permen LHK 9/2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial	Berlaku (tidak ditemukan pengganti 2025–26)	Definisi pendamping & kemitraan (Ps. 1); hak & kewajiban pemegang (Ps. 90, 93 — termasuk PNBP); **penyerapan/penyimpanan karbon** diperbolehkan: HL blok perlindungan (Ps. 121 huruf c), HL blok pemanfaatan (Ps. 124(1) huruf g), HP (Ps. 129 huruf f; 132(1) huruf g); gambut fungsi lindung: perdagangan karbon (Ps. 175(1) huruf d); kerja sama usaha & batas modal mitra bagi hasil 50% (Ps. 151–152); pendampingan (Ps. 154)
Perpres 110/2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen NEK dan Pengendalian Emisi GRK Nasional	Berlaku sejak 10/10/2025; **mencabut Perpres 98/2021** (Ps. 101)	SRUK (Ps. 1 angka 20); Otorisasi (Ps. 1 angka 27); CA (Ps. 1 angka 28); DPP (Ps. 1 angka 41); semua offset dihitung ke NDC kecuali ada CA (Ps. 56); semua perdagangan dicatat di SRUK (Ps. 58–59); penerbitan unit non-SPE oleh standar internasional dengan persetujuan menteri sektor (Ps. 65(6)); unit standar internasional dapat diperdagangkan domestik (Ps. 67); perdagangan luar negeri: Otorisasi + CA wajib untuk Art. 6, linked ETS, dan offset sukarela untuk kewajiban internasional — **tidak** wajib untuk offset sukarela yang tidak dipakai untuk NDC/kewajiban internasional (Ps. 68(1)); validator/verifikator terakreditasi KAN atau badan akreditasi internasional (Ps. 85); pencatatan aksi mitigasi di SRN PPI (Ps. 87); peraturan pelaksana dalam 1 tahun (Ps. 102)

Regulasi	Status	Inti relevansi
Permen LHK 21/2022 Tata Laksana NEK	Berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpres 110 (Ps. 100 huruf c Perpres 110) — **[PRR]** status parsial	Rujukan MRA Plan Vivo
Permenhut 6/2026 Tata Cara Perdagangan Karbon melalui Offset Emisi GRK Sektor Kehutanan	Diundangkan 13/04/2026; berlaku; **mencabut Permen LHK 7/2023**	Lihat §5.2
Permen LH/Kepala BPLH 10/2026 (SRUK)	Berlaku (sumber: siaran pers KLH & Plan Vivo, 9/07/2026) — **teks belum diverifikasi [OCR]**	Registri unit karbon nasional
POJK 14/2023 jo. **POJK 10/2026** (Bursa Karbon)	Berlaku (FAQ resmi OJK)	Unit di bursa harus tercatat di SRUK; unit luar negeri non-SRUK dapat diperdagangkan
MRA Kementerian LH – Plan Vivo	Ditandatangani (diumumkan 17/09/2025) — **teks lengkap tidak publik**	Pengakuan kredit PV Climate dalam kerangka Permen LHK 21/2022 & SPE
Kepmen Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030	Berlaku (nomor lengkap belum diverifikasi)	Target −140 Mt CO2e 2030; PS sebagai pengungkit; Menhut dapat membatasi volume otorisasi (Permenhut 6/2026 Ps. 26)

5.2 Permenhut 6/2026 — ketentuan yang langsung mengikat Pasir [CR — teks resmi]

Pasal	Ketentuan	Implikasi Pasir
1 angka 11; 6(1) huruf b	Pemegang Persetujuan Pengelolaan PS (termasuk Hutan Desa) adalah Pelaku Usaha yang dapat berdagang karbon	LPHD Pasir **dapat** menjadi Pelaku Usaha
6(2)	Pemegang PS **harus didampingi mitra atau pendamping yang teregistrasi**	SAMPAN harus teregistrasi; tata cara registrasi "sesuai peraturan perundang-undangan" **[OCR]**
7	Aksi mitigasi gabungan (IAD atau di luar IAD)	Opsi menggabung dengan Hutan Desa lain di Mempawah/Kalbar
9(1) huruf a	Karbon dari kawasan hutan: HP tetap, HPK, dan/atau **blok pemanfaatan HL** yang telah dibebani persetujuan	**Kritis:** areal di **blok perlindungan HL** tidak tercantum → **[PRR]**

Pasal	Ketentuan	Implikasi Pasir
10	Unit: SPE GRK (diterbitkan Menteri LH) atau **non-SPE GRK oleh standar internasional** (dengan persetujuan Menhut)	PVC = non-SPE GRK
12(1)–(2)	Isi DRAM/DPP: rencana & usulan aksi mitigasi, metodologi, analisis dampak lingkungan & pembangunan berkelanjutan, konsultasi publik, data pendukung: penanggung jawab, additionality, rencana pelibatan masyarakat, **rencana pembagian manfaat karbon yang disepakati masyarakat**, biodiversitas & risiko aksi balik, **rencana dan capaian Padiatapa**	PDD Plan Vivo dapat menjadi basis DPP, tetapi perlu penyesuaian format sistem kementerian
13(1) huruf b	DRAM/DPP pemegang PS **disusun oleh mitra/pendamping teregistrasi**	Peran SAMPAN
14, 16	Kelengkapan ≤5 hari kerja; penilaian ≤14 hari kerja (Ditjen PS untuk pemegang PS)	Jadwal administrasi nasional singkat — tetapi bergantung kesiapan sistem
20–22	Pencatatan DPP; pelaporan validasi, pelaksanaan, verifikasi	Paralel dengan PDD Plan Vivo
24	Persetujuan Menhut untuk penerbitan non-SPE GRK berlaku **6 bulan**; disampaikan ke lembaga standar	Sinkronkan dengan permintaan issuance ke Plan Vivo
25–27	Perdagangan luar negeri yang memerlukan Otorisasi & CA: permohonan ke Menhut dengan perjanjian kerja sama perdagangan → rekomendasi volume ≤7 hari kerja → permohonan ke Menteri LH	Untuk pembeli yang butuh CA
28–29	Safeguard LST wajib & sistem manajemen risiko	Selaras dengan PV Climate
30(4), 31	Program yurisdiksi tidak boleh memperdagangkan karbon dari areal berizin tanpa persetujuan pemegang; **nesting wajib**	Lindungi hak LPHD; antisipasi nesting
42–43	Verifikator terakreditasi KAN/internasional; untuk pemegang PS dapat **ahli perorangan** terdaftar pada lembaga akreditasi internasional	Apakah IE Plan Vivo memenuhi Ps. 43(2)? **[OCR]**
46	**PNBP** pemanfaatan hutan atas penyerapan/penyimpanan karbon untuk setiap transaksi offset, dibayar via SIPNBP	Tarif belum diverifikasi **[OCR]**; masukkan ke model keuangan & BSM ("after payment of any charges, taxes or similar fees levied by the host country" — PR 3.16.2)
48–50, 54–55	Pengaduan publik; pelaporan elektronik (termasuk pelaksanaan pembagian manfaat & pengaduan); evaluasi ≥1×/th	Beban pelaporan ganda (Plan Vivo + nasional)
60	Sebelum SRUK beroperasi penuh, DRAM/DPP dicatat di sistem elektronik kementerian	—
61	Transisi bagi proyek yang sudah validasi/punya unit: lapor ≤6 bulan (≈13/10/2026)	**Tidak berlaku** bagi Pasir (belum validasi)

5.3 Pertanyaan hukum kritis — jawaban kerja

Pertanyaan	Jawaban kerja	Klasifikasi
Apakah LPHD Pasir berwenang mengembangkan proyek karbon berdasarkan persetujuan PS yang ada?	Ya secara prinsip: PP 23/2021 Ps. 206 & 215(2) dan Permen LHK 9/2021 (Ps. 121/124/129/132) membolehkan jasa lingkungan penyerapan/penyimpanan karbon; Permenhut 6/2026 Ps. 6(1)(b) menjadikan pemegang PS Pelaku Usaha. **Syarat:** areal masuk Ps. 9(1)(a), kegiatan konsisten dengan RKPS/RKT, didampingi mitra/pendamping teregistrasi.	CR + PRR (Ps. 9)
Beda hak kelola, partisipasi proyek, dan hak kontraktual atas pendapatan karbon?	(a) **Hak kelola**: dari SK PS kepada lembaga desa — bukan kepemilikan (PP 23 Ps. 218), tidak dapat dipindahtangankan (Ps. 212). (b) **Partisipasi proyek Plan Vivo**: hubungan berbasis Project Agreement dengan PC (PR 3.18). (c) **Hak menjual unit**: tidak otomatis — unit non-SPE harus diterbitkan standar dengan **persetujuan Menhut**, tercatat di SRUK, membayar PNBP; hak PC menjual PVC atas nama partisipan berasal dari Project Agreement (PR 3.18.5).	CR
Apakah mitra/fasilitator independen diwajibkan?	**Ya** untuk perdagangan karbon: Permenhut 6/2026 Ps. 6(2) & 13(1)(b).	CR


Pertanyaan	Jawaban kerja	Klasifikasi
Peran hukum SAMPAN yang tepat?	"Mitra atau pendamping teregistrasi" penyusun DPP + Project Coordinator Plan Vivo atas mandat LPHD. Bentuk kerja sama harus konsisten dengan Permen LHK 9/2021 Ps. 151–154 (kerja sama usaha/pendampingan); **tidak** boleh berupa pengalihan/penyewaan areal. Kepemilikan unit di registry & hak menjual perlu dirumuskan agar tidak bertentangan dengan status LPHD sebagai Pelaku Usaha.	CR + PRR
Apa yang harus terjadi sebelum unit dijual (terutama internasional)?	(1) Registrasi/sertifikasi Plan Vivo & verifikasi/monitoring; (2) pencatatan DPP & laporan validasi/verifikasi di sistem kementerian; (3) **persetujuan Menhut** untuk penerbitan non-SPE GRK (berlaku 6 bulan); (4) pencatatan di **SRUK**; (5) PNBP per transaksi; (6) untuk pembeli yang memerlukan klaim NDC/CORSIA/kewajiban internasional: rekomendasi Menhut + **Otorisasi & CA** Menteri LH + attestation & Letter of CA Risk Acknowledgement ke Plan Vivo (PM §15.7). Untuk penjualan sukarela tanpa klaim NDC/kewajiban internasional: Otorisasi/CA **tidak** wajib (Perpres 110 Ps. 68(1)(b)), tetapi langkah (1)–(5) tetap.	CR (Perpres 110, Permenhut 6/2026, PM)
Interaksi sertifikasi Plan Vivo dengan registri nasional?	Plan Vivo menerbitkan PVC di PV Climate Registry; hukum Indonesia mewajibkan pencatatan di SRUK dan interoperabilitas (Perpres 110 Ps. 65(7)–(8)). PM §15.6 mengizinkan pemindahan ke registri lain bila diwajibkan hukum lokal (dengan *cancellation* di PV Climate Registry). Mekanisme teknis pasca-MRA **[OCR]** — preseden Bujang Raba menunjukkan proses sudah berjalan.	CR + OCR
Apakah sertifikasi Plan Vivo saja cukup?	**Tidak.**	CR

5.4 Regulatory Compliance Matrix

Regulasi	Ketentuan	Kewajiban	Pihak	Tahap	Bukti	Risiko
PP 23/2021	Ps. 212, 218	Tidak memindahtangankan/menyewakan areal; persetujuan ≠ kepemilikan	LPHD, SAMPAN	Semua	PKS tanpa klausul pengalihan	Pembatalan persetujuan
Permen LHK 9/2021	Ps. 90, 93, 121–132, 151–154	Kegiatan sesuai RKPS/RKT; PNBP; kerja sama sesuai bentuk yang diizinkan	LPHD	Pra-PIN →	RKPS/RKT memuat jasa lingkungan karbon	Ketidaksesuaian rencana kelola
Permenhut 6/2026	Ps. 6(2), 13	Pendamping/mitra teregistrasi menyusun DPP	SAMPAN	Pra-PDD	Bukti registrasi	Tidak dapat mencatat DPP
Permenhut 6/2026	Ps. 9(1)(a)	Areal eligible	LPHD/SAMPAN	Pra-PIN	Peta fungsi & blok	Areal tidak dapat diperdagangkan
Permenhut 6/2026	Ps. 12, 20–22	Catat DPP; laporkan validasi/verifikasi	SAMPAN	PDD →	Bukti pencatatan	Unit tidak diakui
Permenhut 6/2026	Ps. 24	Persetujuan penerbitan Menhut (6 bln)	LPHD/SAMPAN	Pra-issuance	Surat persetujuan	Issuance ilegal
Permenhut 6/2026	Ps. 46	PNBP per transaksi	Pelaku Usaha	Penjualan	Bukti SIPNBP	Sanksi
Permenhut 6/2026	Ps. 28–29, 54–55	Safeguard, risiko, pelaporan elektronik, evaluasi	SAMPAN/LPHD	Implementasi	Laporan	Sanksi administratif
Perpres 110/2025	Ps. 58–59, 65(7)	Semua transaksi tercatat di SRUK	Penjual	Penjualan	Bukti SRUK	Transaksi tidak sah
Perpres 110/2025	Ps. 68	Otorisasi & CA bila untuk NDC/kewajiban internasional	Penjual + Menteri LH	Penjualan internasional	LoA	Double claiming
Perpres 110/2025	Ps. 87	Catat aksi mitigasi di SRN PPI	Penanggung jawab aksi	PDD →	Bukti SRN	—
Perpres 110/2025	Ps. 85	Validator/verifikator terakreditasi	VVB/IE	Validasi	Akreditasi	Laporan tidak diakui
POJK 14/2023 jo. 10/2026	—	Unit di bursa harus di SRUK	Penjual via bursa	Penjualan	—	—

Regulasi	Ketentuan	Kewajiban	Pihak	Tahap	Bukti	Risiko
UU PDP 27/2022	—	Lindungi data pribadi partisipan	SAMPAN	Semua	SOP data	Sanksi

5.5 Legal Decision Tree

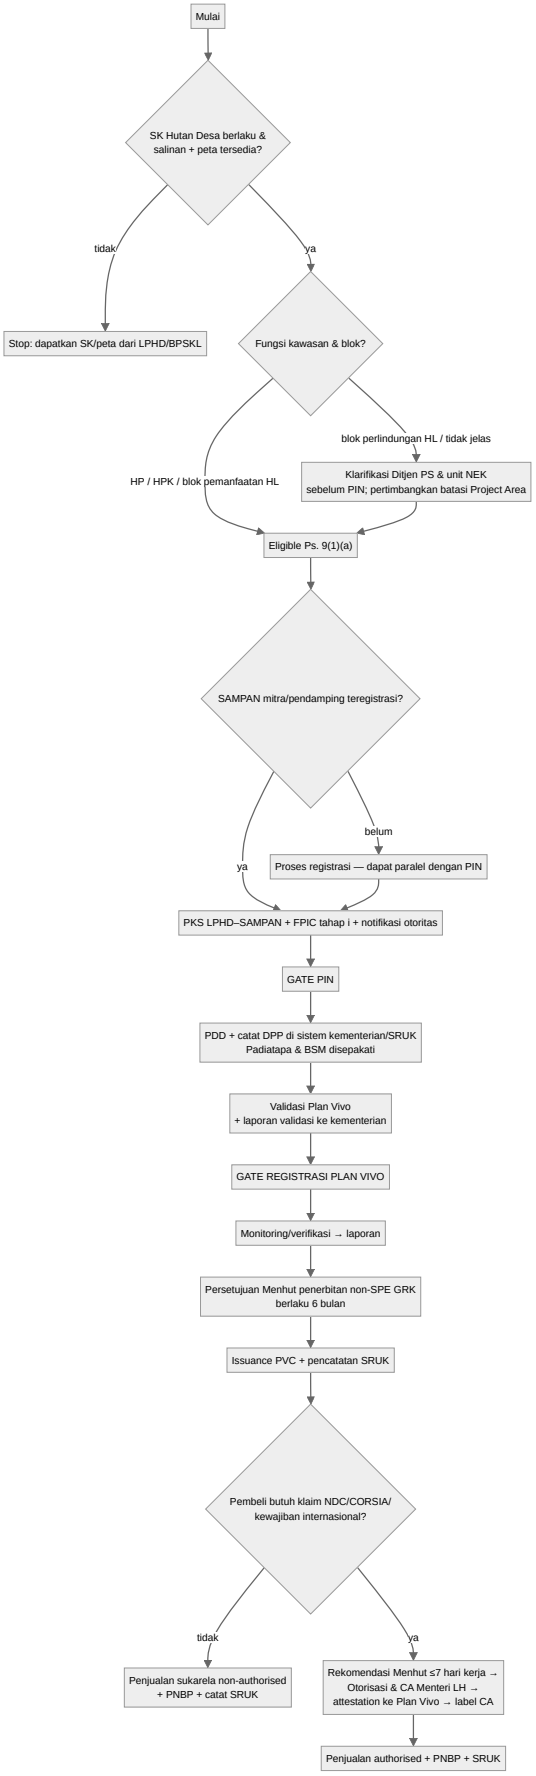

5.6 Isu terbuka (wajib klarifikasi)

1. Prosedur & syarat registrasi "mitra atau pendamping teregistrasi" (Ditjen PS).
2. Kelayakan blok perlindungan HL berdasarkan Ps. 9(1)(a) vs Permen LHK 9/2021 Ps. 121.
3. Teks Permen LH/BPLH 10/2026 (SRUK) dan prosedur Otorisasi/CA.
4. Tarif PNBP karbon (Ps. 46).
5. Isi MRA Plan Vivo–KLH dan panduan KLH untuk proponen Plan Vivo.
6. Apakah IE Plan Vivo memenuhi Ps. 43(2) Permenhut 6/2026.
7. Apakah PVC harus di-*cancel* di PV Climate Registry saat dicatat di SRUK, atau cukup *mirroring* — konfirmasi ke Plan Vivo & KLH.

VOLUME II — PIN DEVELOPMENT DAN SUBMISSION

Pasir Village Forest Community Carbon Project — Hutan Desa Pasir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat Tanggal acuan riset: 20 Oktober 2026 · Disusun untuk: SAMPAN Kalimantan & LPHD Pasir

> Kode klasifikasi temuan yang dipakai di seluruh dokumen (lihat `README.md`): **[CR]** Confirmed Requirement · **[RP]** Recommended Practice · **[PSA]** Project-Specific Assumption · **[OCR]** Official Clarification Required · **[PRR]** Potential Regulatory Risk

Dokumen acuan utama Volume ini:

Kode	Dokumen resmi	Versi	Tanggal rilis versi
PIN-T	PV Climate V5 PIN Template	V1.4	tidak tercantum di dokumen (versi terbaru di laman dokumen per 20/10/2026)
PR	PV Climate Project Requirements	V5.7	30/04/2026
PM	PV Climate Procedures Manual	V3.9	30/04/2026
CF	PV Climate – Costs & Fees (PDF)	tanpa nomor versi	diunduh 20/10/2026
ESRM	Environmental & Social Risk Management in Plan Vivo Projects	V1.0	Agustus 2024

Bab 6 — Pre-PIN Readiness Assessment

6.1 Apa yang sebenarnya dinilai pada tahap PIN

[CR] PM §2.1–2.2 dan instruksi umum PIN-T: PIN adalah *"initial eligibility check"* — pemeriksaan kelayakan awal terhadap PV Climate V5 Project Requirements. PIN **bukan** dokumen desain final, tetapi wajib menjelaskan (PM §2.1):

1. Rencana *Project Interventions*;
2. *Project Region* dan *Project Areas*, **termasuk hak atas lahan dan hak karbon**;
3. Keterlibatan *Stakeholders* (Project Coordinator, Project Participants, Local Stakeholders lain);
4. Kondisi penggunaan lahan, mata pencaharian, dan ekologi sebelum proyek, serta perkiraan perubahannya tanpa proyek (baseline);
5. *Outputs* dan *Outcomes* yang diharapkan;
6. Hambatan (*barriers*) pelaksanaan intervensi;
7. Risiko lingkungan & sosial serta potensi *Double Counting*;
8. Tata kelola dan administrasi proyek.

[CR] PM §2.1: Proyek harus menunjukkan **kapasitas dan keahlian** untuk mengembangkan proyek, serta menyebutkan di mana akan memakai dukungan teknis eksternal. Plan Vivo **tidak** menyediakan pendanaan maupun dukungan teknis selain saran kepatuhan.

[CR] PIN-T, Annex 4: Skrining E&S (kuesioner Section A–C) **wajib diisi Project Coordinator dan diserahkan bersama PIN**; Section D (Screening Report) diisi oleh reviewer E&S Plan Vivo.

6.2 Status kesiapan Pasir per 20 Oktober 2026 (berdasarkan informasi yang tersedia)

Informasi yang **sudah dikonfirmasi** dalam penugasan ini hanya: nama lokasi, nama LPHD, nomor SK Hutan Desa (SK.10885/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2019), nama organisasi fasilitator, dan pilihan standar. Semua parameter teknis lain berstatus belum terverifikasi.

Domain kesiapan	Status	Dasar penilaian
Identitas & legalitas Project Coordinator	Information Required	Belum ada bukti akta/registrasi badan hukum SAMPAN di berkas riset; belum ditetapkan siapa Project Coordinator
Hak kelola areal (Hutan Desa)	Partially Ready	SK 2019 tersedia sebagai referensi; salinan SK, peta areal kerja, dan masa berlaku belum diperiksa
Hak atas manfaat karbon / penjualan PVC	Information Required + **[PRR]**	Lihat Bab 5 (Vol. I): hak karbon & otorisasi perdagangan diatur negara
Batas Project Region / Project Area	Information Required	Belum ada peta digital/shapefile terverifikasi
Kelas ekosistem (gambut / tanah mineral)	Information Required	**Dikonfirmasi tim proyek (21/10/2026): tidak ada mangrove di Desa Pasir/areal Hutan Desa.** Yang perlu dipastikan: hutan rawa gambut atau hutan tanah mineral. Catatan: sumber publik menyebut "Mempawah Mangrove Park" di sebuah Desa Pasir, Kec. Mempawah Hilir — pastikan nama kecamatan & kode desa ditulis tepat di PIN agar reviewer tidak tertukar lokasi
Intervensi & metodologi	Information Required	Lihat Bab 12 (Vol. III)
Stakeholder analysis	Information Required (sedang berjalan)	Disebut "preliminary stakeholder identification" — belum ada dokumen
FPIC tahap 1 ("consider the proposed project")	Information Required	Belum ada notulen/keputusan kolektif yang terdokumentasi
Skrining E&S (Annex 4)	Not started	—
Notifikasi otoritas (Annex 5)	Not started	—
Rencana pendanaan pengembangan	Information Required	—

Kesimpulan Bab 6: Proyek **belum siap** untuk *submission* PIN per 20/10/2026. Proyek **siap untuk memulai penyusunan PIN secara paralel** dengan pengumpulan bukti, dengan target *submission* hanya setelah kriteria kesiapan di §9.8 terpenuhi.

Bab 7 — Complete PIN Preparation Handbook (section-by-section, mengikuti struktur resmi PIN Template V1.4)

7.0 Aturan format wajib PIN Template V1.4 [CR]

Aturan	Isi
Format	Tidak boleh mengubah format template; tabel dan kolom tidak boleh dihapus/diubah (boleh menambah baris & lampiran)
Font	Calibri 11pt, hitam, regular (non-italic)
Angka	Format internasional: pemisah ribuan koma/spasi, **desimal memakai titik** (bukan koma) — perhatikan karena kebiasaan Indonesia terbalik
Instruksi	Seluruh teks instruksi & kotak panduan **harus dihapus** dari dokumen final
Bahasa	**Bahasa Inggris**; dokumen lampiran berbahasa Indonesia wajib disertai terjemahan lengkap bagian yang relevan
Kelengkapan	Semua bagian wajib diisi; tidak boleh menghapus bagian
AI	Penggunaan AI boleh, tetapi wajib diungkapkan di **Annex 6 – AI Tool Use Disclosure**, dan Project Coordinator bertanggung jawab penuh atas akurasi. Pekerjaan lapangan & konsultasi partisipatif **tidak boleh** digantikan AI

> Catatan untuk tim: dokumen panduan ini sendiri disusun dengan bantuan AI. Jika teks dari panduan ini diadopsi ke PIN, cantumkan di Annex 6 dan lakukan verifikasi manusia atas setiap fakta.

7.1 Peta struktur resmi PIN Template V1.4

```
OVERVIEW (Project Title, Location, Project Coordinator, Project Area, Project Participants,
          Project Intervention(s), Expected Benefits, Methodology, PIN Version, Date Approved)
1 General Information
   1.1 Project Interventions          (Table 1.1)
   1.2 Project Boundaries             (peta + Table 1.2)
   1.3 Land and Carbon Rights
2 Stakeholder Engagement
   2.1 Stakeholder Identification
   2.2 Project Coordination and Management   (Table 2.2 — 13 fungsi)
   2.3 Project Participants
   2.4 Participatory Design
   2.5 FPIC Process
3 Project Design
   3.1 Baseline Scenario
   3.2 Livelihood Baseline
   3.3 Ecosystem Baseline
   3.4 Project Logic                  (Table 3.4)
   3.5 Additionality                  (Table 3.5 Initial Barrier Analysis)
   3.6 Exclusion List
   3.7 Environmental and Social Screening
   3.8 Double Counting                (Table 3.8 National Legislation)
4 Governance and Administration
   4.1 Governance Structure
   4.2 Legal and Regulatory Compliance
   4.3 Financial Plan
ANNEXES
   Annex 1 Project Boundaries (file geospasial — "optional")
   Annex 2 Registration Certificate (+ pernyataan persetujuan jika pemohon ≠ Project Coordinator)
   Annex 3 Exclusion List (27 butir Ya/Tidak)
   Annex 4 Environmental and Social Screening (Section A–C diisi proyek; D oleh Plan Vivo)
   Annex 5 Notification of Relevant Authorities
   Annex 6 AI Tool Use Disclosure
```

Pemetaan topik yang diminta TOR ke heading resmi (heading resmi tidak boleh diganti):

Topik TOR	Letak di PIN resmi
Project identification, participants & organizations	OVERVIEW; 2.2; 2.3; Annex 2
Project description, objectives, intervention activities	OVERVIEW; 1.1; 3.4
Location & boundaries	1.2; Annex 1
Land eligibility & tenure	1.3
Carbon benefits	OVERVIEW "Expected Benefits"; 1.1; 3.4 (baris *Carbon Benefit*)
Baseline & additionality	3.1–3.3; 3.5
Methodology selection	OVERVIEW "Methodology"
Stakeholders & beneficiaries	2.1; 2.3
Community engagement	2.4; 2.5; Annex 4 Section C
Environmental & social risks	3.6; 3.7; Annex 3; Annex 4
Benefit sharing	Tidak ada heading khusus di PIN → disinggung di 4.1/4.3; menjadi wajib penuh di PDD (PR §3.16)
Governance	4.1; 2.2
Financing & implementation	4.3
Monitoring arrangements	Tidak ada heading khusus di PIN → disinggung di 2.2 (fungsi monitoring/MRV) & 3.4; wajib penuh di PDD (PR §4)

7.2 Panduan per bagian

Format setiap bagian: **Tujuan · Isi wajib · Data & bukti · Tingkat detail · Pendekatan untuk Pasir · Boleh preliminary · Harus final · Kesalahan umum**.

OVERVIEW

- **Tujuan:** Ringkasan satu halaman yang dipakai reviewer dan dipublikasikan bila PIN disetujui (PM §2.2).
- **Isi wajib [CR]:** Judul; lokasi (negara, kabupaten/provinsi); nama & kontak Project Coordinator; luas total Project Area (ha) pada awal + rencana ekspansi; ringkasan Project Participants (jumlah individu/rumah tangga) + rencana ekspansi; daftar intervensi dengan kategori **Protection / Restoration / Improved Management**; manfaat karbon, ekosistem, mata pencaharian; metodologi Plan Vivo yang disetujui (atau rencana pengembangan metodologi); versi PIN; tanggal disetujui (diisi setelah approval).
- **Pendekatan Pasir:** Gunakan judul kerja "Pasir Village Forest Community Carbon Project". Lokasi: "Pasir Village, [Sub-district — TO BE CONFIRMED], Mempawah Regency, West Kalimantan Province, Indonesia". Methodology: tulis "PM001 (Agriculture & Forestry Carbon Benefit Assessment Methodology) V1.0 with Module PU002 and Tool PT002 [subject to applicability confirmation]" — **hanya jika** hasil skrining Bab 12 mengonfirmasi. Karena tidak ada mangrove, metodologi mangrove (pipeline) tidak relevan; isu yang tersisa adalah perlakuan tanah gambut bila areal bergambut (Bab 12).
- **Boleh preliminary:** luas Project Area (sebutkan "indicative"), jumlah partisipan (estimasi), manfaat karbon (kualitatif atau orde besaran dengan disclaimer).
- **Harus final:** identitas Project Coordinator, kategori intervensi, metodologi yang dirujuk harus berstatus *approved* (bukan pipeline).
- **Kesalahan umum:** menyebut angka tCO2e yang presisi tanpa dasar; menyebut metodologi pipeline (mis. "Coastal Blue Carbon Methodology") seolah sudah disetujui; luas Hutan Desa (SK) dicampur dengan luas Project Area yang layak.

1.1 Project Interventions (Table 1.1)

- **Tujuan:** Menunjukkan bahwa tiap intervensi memberi peningkatan stok karbon/penurunan emisi jangka panjang **dan** dampak positif bagi mata pencaharian serta ekosistem.
- **Isi wajib [CR]:** Satu baris per intervensi: Intervention Type · Project Intervention (deskripsi) · Expected Benefits (iklim, livelihood, ekosistem). PR §1.1.2: manfaat livelihood **tidak boleh hanya** dari penjualan PVC atau upah kerja proyek.
- **Pendekatan Pasir:** Kandidat intervensi (status **[PSA]**, wajib divalidasi dengan data):
    1. *Protection* — perlindungan hutan Hutan Desa dari deforestasi/degradasi (patroli partisipatif, penguatan RKHD/RKT, pencegahan kebakaran bila relevan).
    2. *Restoration* — rehabilitasi areal terdegradasi melalui *assisted natural regeneration* / penanaman spesies asli hutan rawa gambut atau hutan tanah mineral sesuai tipe lahan.
    3. *Improved Management* — hanya jika ada praktik pengelolaan yang terukur karbonnya dengan metodologi yang disetujui. Untuk manfaat livelihood non-karbon, identifikasi usaha HHBK/jasa lingkungan (mis. madu kelulut, HHBK, agroforestri di luar kawasan, ekowisata hutan) **berdasarkan hasil konsultasi**, bukan asumsi.
- **Kesalahan umum:** intervensi "pembangunan ekowisata" ditulis sebagai intervensi karbon; tidak menyebut kategori resmi.

1.2 Project Boundaries (peta + Table 1.2)

- **Isi wajib [CR]:** Peta Project Region, Project Area(s), dan kawasan lindung di dalam/berbatasan; Table 1.2: lokasi, jumlah & luas Project Region, jumlah & luas Project Area, kawasan lindung yang

ditetapkan secara hukum. PR §1.2.2: semua batas harus dipetakan. File geospasial di Annex 1 bersifat *optional* pada PIN (wajib pada PDD — KML dipublikasikan setelah registrasi, PM §4.4).
- **Data:** Peta areal kerja dari SK Hutan Desa (lampiran SK), shapefile dari BPSKL Wilayah Kalimantan / Dinas LHK Kalbar / KPH setempat, peta kawasan hutan (SK penunjukan/penetapan kawasan Kalbar), peta KHG (Kesatuan Hidrologis Gambut) & kedalaman gambut, batas desa.
- **Pendekatan Pasir:** Definisikan **Project Region** = wilayah administrasi Desa Pasir (+ area ekspansi potensial, mis. desa tetangga bila ada rencana), dan **Project Area** = bagian areal kerja Hutan Desa yang memenuhi syarat intervensi. Cek irisan dengan: kawasan konservasi, fungsi lindung ekosistem gambut, izin lain (PBPH, HGU, perkebunan), program rehabilitasi/restorasi gambut pemerintah.
- **Harus final:** batas Project Region (karena semua Project Area masa depan harus berada di dalamnya — PR §1.2 Guidance).
- **Kesalahan umum:** Project Region terlalu sempit sehingga ekspansi kelak memerlukan PDD update + validasi ulang (PM §10.1).

1.3 Land and Carbon Rights

- **Isi wajib [CR]:** Kepemilikan, tenurial, hak guna atau hak kelola Project Area dan hubungannya dengan Project Participants. PR §1.2.1: Project Participants harus memiliki hak statutory/customary yang memungkinkan mereka **melaksanakan pengelolaan lahan dan memperoleh manfaat dari penjualan PVC**. PR §1.2 Guidance: bila tidak ada mekanisme untuk menunjukkan hak hukum atas Carbon Benefits, hak dapat *disimpulkan* dari hak serupa (mis. atas kayu/jasa ekosistem) **apabila disetujui badan pemerintah terkait**.
- **Data & bukti:** SK.10885/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2019 (salinan + terjemahan), SK pembentukan LPHD (Peraturan Desa / SK Kepala Desa), Rencana Kelola Hutan Desa (RKHD/RKPS) & RKT bila ada, bukti status persetujuan masih berlaku, analisis regulasi karbon kehutanan (Vol. I Bab 5).
- **Pendekatan Pasir:** Jelaskan tiga lapis hak secara terpisah: (a) **status kawasan** (milik negara, kawasan hutan); (b) **hak kelola** Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa kepada LPHD; (c) **hak atas manfaat karbon & perdagangan** — tunduk pada regulasi NEK dan perdagangan karbon sektor kehutanan, termasuk registrasi SRN-PPI dan persyaratan otorisasi (Vol. I Bab 5). **Jangan** menyatakan "LPHD owns the carbon rights".
- **Harus final:** salinan SK dan fakta hukumnya. **Boleh preliminary:** jalur perolehan hak/otorisasi karbon, asalkan langkah dan instansinya disebutkan.
- **Preseden [CR — dokumen publik Plan Vivo]:** Dua PIN Hutan Desa Indonesia telah *approved*: *Lemo Nakai Village Forest* (KKI Warsi, Bengkulu; PIN V3.0, disetujui 24/07/2024, metodologi PM001) dan *Community-based Forest Protection and Restoration through Village Forest Management* (CFES & F&F Indonesia, Aceh; PIN V5.1, disetujui 28/05/2025, PM001). Keduanya menyatakan hak karbon berada pada negara dan proyek perlu menempuh registrasi SRN/perizinan nasional secara paralel. Nomor versi (3.0 dan 5.1) mengindikasikan beberapa putaran revisi — rencanakan waktu revisi. Kedua PIN itu disusun sebelum Perpres 110/2025 dan Permenhut 6/2026 — **jangan menyalin** rujukan regulasinya (Perpres 98/2021, Permen LHK 7/2023 sudah dicabut). Preseden pasca-regulasi baru: proyek Plan Vivo **Bujang Raba** (Hutan Desa, Jambi) memperoleh persetujuan Menteri Kehutanan untuk penerbitan dan masuk SRUK (Juli 2026).
- **Tambahan wajib untuk Pasir [PRR]:** nyatakan **fungsi kawasan** (HL/HP) dan **blok** areal (perlindungan/pemanfaatan) karena Permenhut 6/2026 Pasal 9(1)(a) hanya menyebut HP, HPK, dan blok pemanfaatan HL.

2.1 Stakeholder Identification

- **Isi wajib [CR]:** Kelompok stakeholder utama, hubungan dengan proyek, kategori **Local** vs **Secondary** (definisi PR §2.1 Guidance). Identifikasi masyarakat adat/lokal dengan hak statutory/customary atas lahan/sumber daya di Project Area.

- **Pendekatan Pasir:** Local: anggota LPHD; rumah tangga Desa Pasir pengguna sumber daya (pencari kayu bakar/HHBK, petani/pekebun di sekitar areal, pengguna sumber air); kelompok perempuan; pemuda; kelompok rentan (rumah tangga miskin, tanpa lahan). Periksa keberadaan klaim komunitas adat (mis. Dayak/Melayu setempat) — **[TO BE CONFIRMED]**. Secondary: Pemerintah Desa Pasir & BPD; Kecamatan; Pemkab Mempawah (Bappeda, DLH, Dinas Perikanan); Dinas LHK Provinsi Kalbar; KPH wilayah setempat; BPSKL Kalimantan; Ditjen PS dan Ditjen PPI/unit pengelola NEK di kementerian; BPDAS; Pokja PPS Kalbar; pengelola Mempawah Mangrove Park (bila berbeda); LSM/akademisi lain.
- **Kesalahan umum:** hanya mendaftar LPHD; tidak memisahkan kelompok perempuan/rentan; tidak menyebut konflik.

2.2 Project Coordination and Management (Table 2.2)

- **Isi wajib [CR]:** Project Coordinator yang bertanggung jawab penuh; organisasi lain dan pembagian 13 fungsi (Table 2.2); pengalaman relevan (termasuk keterlibatan dengan kelompok adat/rentan); **registration certificate** Project Coordinator di Annex 2; bila pemohon menunjuk organisasi lain sebagai Project Coordinator → **pernyataan bertanda tangan** dari Project Coordinator bahwa PIN diajukan dengan persetujuannya. PR §2.2.1: Project Coordinator harus *legally established*; PR §2.2.2: pembagian fungsi dengan pihak lain harus diformalkan dengan **perjanjian tertulis**.
- **Keputusan kunci untuk Pasir [OCR + PRR]:** Siapa Project Coordinator?
  - *Opsi A — SAMPAN Kalimantan sebagai Project Coordinator*, LPHD Pasir sebagai institusi pengelola lapangan/perwakilan Project Participants. Kelebihan: kapasitas administrasi, rekening & audit, akun registry. Risiko: perlu mandat tertulis LPHD/Desa dan kesesuaian dengan regulasi PS (pendamping vs pemegang persetujuan).
  - *Opsi B — LPHD Pasir sebagai Project Coordinator*, SAMPAN sebagai mitra teknis. Kelebihan: kepemilikan lokal kuat. Risiko: status badan hukum LPHD (lembaga desa, bukan badan hukum mandiri), kapasitas audit keuangan tahunan (PR §5.5.2), due diligence S&P Global untuk akun registry (PM §6.2).
  - *Opsi C — Struktur bersama* (mis. BUMDes/koperasi LPHD sebagai entitas hukum) — memerlukan waktu pembentukan. Rekomendasi kerja: **Opsi A** dengan Perjanjian Kerja Sama yang menegaskan bahwa SAMPAN bertindak atas mandat LPHD/Project Participants, **tanpa** pengalihan hak kelola, dan disertai konfirmasi ke Plan Vivo (Bab 29) serta kajian hukum (Vol. I Bab 5).
- **Usulan isi Table 2.2 (draf, perlu disepakati):** lihat RACI di Vol. III Bab 13.

2.3 Project Participants

- **Isi wajib [CR]:** Untuk tiap intervensi, siapa calon partisipan dan lokasinya relatif terhadap Project Area/Region; identifikasi partisipan yang tidak memenuhi PR §2.3.1–2.3.2 (non-residen, bukan pengelola skala kecil, bergantung tenaga upahan sepanjang tahun) dan langkah agar areal mereka < 30% total Project Area, tidak diakuisisi dari petani kecil, dan bermanfaat jelas.
- **Pendekatan Pasir:** Untuk Hutan Desa yang dikelola kolektif, Project Participant dapat didefinisikan sebagai **LPHD Pasir mewakili rumah tangga Desa Pasir** atau sebagai kelompok-kelompok pengelola blok (KUPS). Tentukan definisi ini secara partisipatif karena berimplikasi pada Project Agreement dan Land Management Plan (PR §3.14, §3.18). **[OCR]**: konfirmasi ke Plan Vivo apakah satu Project Agreement kolektif dengan LPHD diterima (preseden Hutan Desa lain menunjukkan pendekatan kolektif).
- **Data:** jumlah KK & jiwa Desa Pasir (Profil Desa/Prodeskel, BPS Kecamatan dalam Angka), daftar anggota LPHD, peta sosial.

2.4 Participatory Design

- **Isi wajib [CR]:** Proses partisipatif untuk merancang intervensi & project logic bersama perwakilan calon partisipan dan local stakeholders, termasuk langkah inklusi kelompok yang biasa terpinggirkan (gender, usia, etnis, agama, status sosial).
- **Pendekatan Pasir:** Rencanakan rangkaian: (1) sosialisasi umum; (2) FGD terpisah perempuan, pemuda, pengguna sumber daya hutan, kelompok rentan; (3) pemetaan partisipatif (Participatory Toolkit Tool 9 Resource Mapping, Tool 10 Social Mapping, Tool 7 Historical Timeline); (4) analisis masalah & visioning (Tool 2, Tool 3); (5) lokakarya validasi desain. Pada tahap PIN cukup **rencana + bukti kegiatan yang sudah terjadi**.
- **Kesalahan umum:** menulis "the community was consulted" tanpa tanggal, jumlah peserta terpilah gender, dan hasil.

2.5 FPIC Process

- **Isi wajib [CR]:** Proses FPIC yang memungkinkan keputusan kolektif pemegang hak untuk menegosiasikan syarat dan memberi/menolak persetujuan atas: (i) **mempertimbangkan proyek**; (ii) **terlibat dalam desain**; (iii) **melaksanakan proyek** (PR §2.6.4). Annex 4 Section C menanyakan apakah persetujuan "to consider the proposed project" sudah diperoleh dan di mana didokumentasikan.
- **Pendekatan Pasir:** Sebelum PIN, targetkan **keputusan FPIC tahap (i)** terdokumentasi (Berita Acara musyawarah desa/LPHD + daftar hadir terpilah gender + materi informasi dalam Bahasa Indonesia/bahasa lokal + catatan pertanyaan & jawaban). Tahap (ii) dapat berjalan selama desain; tahap (iii) **sebelum** Project Agreement/PDD. Lihat Vol. III Bab 14.
- **Kesalahan umum:** menyamakan sosialisasi dengan consent; memakai tanda tangan daftar hadir sebagai bukti persetujuan.

3.1 Baseline Scenario

- **Isi wajib [CR]:** Perkiraan penggunaan & pengelolaan lahan masa depan **tanpa** intervensi.
- **Pendekatan Pasir:** Gunakan analisis tutupan lahan historis (min. 10 tahun; Landsat/Sentinel; data KLHK/MapBiomas Indonesia/Global Forest Watch) + driver deforestasi/degradasi (konversi ke kebun/ladang, penebangan kayu/arang, kebakaran hutan & lahan — terutama bila bergambut, drainase/kanal di sekitar). **Isu kritis [CR]:** Tool PT002 (REDD in community managed forest) **tidak dapat dipakai** bila baseline mencakup "effective community management" atau deforestasi terencana yang terdokumentasi. Karena Hutan Desa Pasir sudah memiliki persetujuan sejak 2019, baseline harus menunjukkan secara kredibel apakah pengelolaan LPHD saat ini **efektif atau tidak** dalam mencegah kehilangan hutan — dengan data, bukan narasi.
- **Boleh preliminary:** narasi kualitatif dengan data indikatif; **harus final di PDD** mengikuti metodologi.

3.2 Livelihood Baseline

- **Isi wajib [CR]:** Untuk tiap kelompok local stakeholder: status livelihood sebelum proyek dan perubahan tanpa proyek; akses & pemanfaatan lahan/sumber daya, aset, tingkat & sumber pendapatan, kegiatan livelihood.
- **Data:** Profil desa, data BPS, survei rumah tangga cepat (sampel), FGD, Participatory Toolkit Tool 5 Well-being Assessment.

3.3 Ecosystem Baseline

- **Isi wajib [CR]:** Kondisi ekologi per Project Region & perubahan tanpa proyek; ekosistem & habitat utama; spesies yang menjadi perhatian konservasi (IUCN Red List, satwa dilindungi PermenLHK

P.106/2018).
- **Pendekatan Pasir:** Gunakan literatur ekologi hutan rawa gambut/hutan tanah mineral Kalimantan Barat dan data KPH/BKSDA bila ada; literatur tentang mangrove di "Desa Pasir" lain **tidak** relevan. Lengkapi dengan survei cepat vegetasi & satwa.

3.4 Project Logic (Table 3.4)

- **Isi wajib [CR]:** Aim (masalah); Outcomes (Carbon, Livelihood, Ecosystem Benefit + asumsi); Outputs (deskripsi + risiko & mitigasi).
- **Pendekatan Pasir:** Turunkan dari analisis masalah partisipatif. Contoh struktur output (indikatif): Output 1 tata kelola LPHD & RKHD diperbarui; Output 2 sistem patroli & monitoring berbasis masyarakat; Output 3 restorasi X ha [DATA REQUIRED]; Output 4 usaha livelihood berbasis HHBK/jasa lingkungan; Output 5 GRM & sistem benefit sharing.

3.5 Additionality (Table 3.5 Initial Barrier Analysis)

- **Isi wajib [CR]:** Per intervensi: hambatan utama (finansial/ekonomi, teknis, kelembagaan, sosial/budaya, lainnya) dan aktivitas untuk mengatasinya. Nama intervensi **harus sesuai** judul Technical Specification di PDD.
- **Isu khusus Pasir [CR + PRR]:** PR §3.7.3 mewajibkan **Regulatory Surplus** di PDD: kewajiban hukum pemegang Persetujuan PS untuk melindungi hutan (kewajiban dalam SK/peraturan PS) dapat dianggap membuat perlindungan "sudah diwajibkan". Argumen harus menunjukkan intervensi melampaui kewajiban hukum **atau** kewajiban tersebut tidak efektif ditegakkan/didanai. Siapkan sejak PIN.
- **Isu tambahan:** Bila areal pernah menerima program rehabilitasi pemerintah (mis. RHL oleh BPDAS atau restorasi gambut), restorasi tersebut **tidak additional** dan tidak boleh diklaim.

3.6 Exclusion List (Annex 3)

- **Isi wajib [CR]:** Nyatakan apakah proyek mungkin mencakup aktivitas pada Exclusion List; isi lengkap 27 butir Ya/Tidak di Annex 3. PR §3.9.2: proyek tidak boleh mencakup aktivitas yang dikecualikan.
- **Perhatian Pasir:** Butir "procurement and use of firearms", "provision of finances to military institutions", "involuntary physical displacement", "planting of invasive species", "increase dependency on fossil fuels" (mis. perahu patroli bermesin — jelaskan proporsionalitas), serta keterlibatan aparat dalam patroli (PR §3.9.9 mewajibkan MoU dengan instansi penegak hukum jika patroli didukung pemerintah).

3.7 Environmental and Social Screening (Annex 4)

- **Isi wajib [CR]:** Jawaban Project Coordinator pada kuesioner Annex 4: Section A (informasi proyek), Section B (14 topik risiko: Vulnerable Groups; Gender equality; Human Rights; Community Health, Safety & Security; Labour; Resource efficiency/pollution; Access restrictions & livelihoods; Cultural heritage; Indigenous Peoples; Biodiversity; Land tenure conflicts; Climate change; Digital tool use; Other/cumulative), Section C (safeguard provisions: stakeholder engagement PR 2.1.1–2.1.3; consultation 2.5.1–2.5.2; FPIC 2.6.1–2.6.4; GRM).
- **Pendekatan Pasir:** Isi dengan jujur, termasuk "still to be completed" bila memang belum. Risiko yang kemungkinan relevan **[PSA]**: pembatasan akses (pengambilan kayu/HHBK, pembukaan kebun), konflik batas/tenurial, keamanan patroli, kebakaran hutan/lahan (terutama bila bergambut), banjir/kekeringan, data digital (drone/foto patroli).

3.8 Double Counting (Table 3.8)

- **Isi wajib [CR]:** Identifikasi proyek/program/inisiatif GRK yang tumpang tindih (termasuk program nasional/yurisdiksi & NDC) dan jelaskan mengapa tidak ada potensi kredit ganda; Table 3.8 (5 pertanyaan: registri nasional, definisi hak karbon, regulasi harga karbon, RBP bilateral/multilateral, regulasi lain).
- **Pendekatan Pasir:** Jawaban Table 3.8 untuk Indonesia: registri nasional = **Yes** (SRN PPI untuk aksi mitigasi/NDC; **SRUK** untuk unit karbon — Perpres 110/2025, Permen LH/BPLH 10/2026); hak/pengaturan karbon dalam legislasi = **Yes** (Perpres 110/2025; Permenhut 6/2026); regulasi harga karbon = **Yes** (perdagangan karbon, pungutan, bursa karbon POJK 14/2023 jo. 10/2026); RBP = **Yes** (Indonesia menerima RBP REDD+); lainnya = MRA KLH–Plan Vivo (2025), FOLU Net Sink 2030, PNBP karbon. Rincian di Vol. I Bab 5. Periksa: FOLU Net Sink 2030, program RBP (mis. FCPF-Carbon Fund di Kalimantan Timur — bukan Kalbar, tetap sebutkan cakupan yurisdiksi), program mangrove nasional (M4CR/BRGM), proyek karbon lain di Kab. Mempawah. PR §3.13.5: proyek tidak boleh terdaftar aktif di program kredit karbon lain.

4.1 Governance Structure

- **Isi wajib [CR]:** Struktur tata kelola & pengambilan keputusan; bagaimana masukan partisipan dikelola; cara pemilihan wakil partisipan/stakeholder; organigram (dianjurkan).
- **Pendekatan Pasir:** Lihat diagram usulan di Vol. III Bab 13 (Forum/Steering Committee proyek: LPHD, Pemdes, wakil perempuan & kelompok rentan, SAMPAN sebagai sekretariat). Bedakan yang **fakta** (struktur LPHD saat ini) dan yang **usulan**.

4.2 Legal and Regulatory Compliance (Annex 5)

- **Isi wajib [CR]:** Identifikasi otoritas yang bertanggung jawab atas pengelolaan lahan dan penilaian emisi GRK di Project Region; bukti mereka telah diberi tahu (Annex 5); rencana keterlibatan; **pernyataan** bahwa proyek akan mematuhi seluruh kebijakan, hukum, dan regulasi nasional & internasional. PR §5.3.2 (berlaku penuh di PDD): bukti tersubstansi bahwa otoritas telah diinformasikan tentang intervensi **dan** perkiraan Carbon Benefits, tanpa keberatan signifikan, serta persetujuan bila diwajibkan hukum.
- **Pendekatan Pasir:** Kirim surat pemberitahuan resmi (dengan tanda terima/agenda) ke: Dinas LHK Prov. Kalbar; KPH setempat; BPSKL Kalimantan; Ditjen Perhutanan Sosial; unit kementerian yang membidangi pengendalian perubahan iklim/NEK & SRN-PPI; Pemkab Mempawah (Bappeda, DLH). Lampirkan bukti terkirim + notulen audiensi.

4.3 Financial Plan

- **Isi wajib [CR]:** Bagaimana dana pengembangan proyek diperoleh.
- **Pendekatan Pasir:** Sajikan anggaran Pre-PIN s.d. validasi (Vol. IV Bab 19) dan sumber dana (dana hibah, dana internal SAMPAN, calon investor/pembeli *forward* — tanpa menyebut komitmen yang belum ada).

Bab 8 — PIN Data and Document Requirements

8.1 PIN Data Collection Matrix

Data Category	Specific Data	Source	Collection Method	Responsible PIC	Required Stage	Priority
Legal – kelembagaan	Akta pendirian & SK Kemenkumham SAMPAN; NPWP; susunan pengurus	SAMPAN	Arsip internal	SAMPAN – Direktur	PIN (Annex 2)	Tinggi
Legal – kelembagaan	Perdes/SK Kades pembentukan LPHD; SK pengurus LPHD terbaru; AD/ART	Pemdes Pasir, LPHD	Permintaan resmi	LPHD – Ketua	PIN	Tinggi
Legal – hak kelola	SK.10885/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2019 + lampiran peta + luas	LPHD, BPSKL, go-kegiatan PS	Salinan resmi + cek SINAV/akses PS	SAMPAN Legal	PIN	Tinggi
Legal – rencana kelola	RKHD/RKPS & RKT; laporan kinerja PS; hasil evaluasi	LPHD, KPH, Dinas LHK	Pengumpulan dokumen	LPHD + SAMPAN	PIN (bila ada) / PDD	Tinggi
Spasial	Batas areal Hutan Desa (SHP), batas desa, kawasan hutan, KHG & kedalaman gambut, izin lain	BPSKL, Dinas LHK, BIG, KLHK/Kemenhut geoportal	Permintaan data + unduhan	SAMPAN GIS	PIN (peta), PDD (final)	Tinggi
Spasial – historis	Tutupan lahan ≥10 th (idealnya 10–15 th)	Landsat/Sentinel, peta PL KLHK, MapBiomas, GFW	Analisis citra	Konsultan GIS	PIN (indikatif), PDD (wajib, sesuai PT002/PM001)	Tinggi
Ekologi	Tipe ekosistem, tanah (mineral/gambut), kedalaman gambut	Peta KHG, survei lapangan, literatur	Desk + ground check	Konsultan ekologi	PIN (indikatif)	Tinggi
Karbon	Stok karbon per strata (literatur/IPCC/FREL)	IPCC, FREL Indonesia, studi lokal	Desk review	Konsultan karbon	PIN (orde besaran)	Sedang
Karbon	Inventarisasi plot	Lapangan	Plot sampling sesuai metodologi	Konsultan karbon + LPHD	PDD	Tinggi (PDD)
Sosial	Jumlah KK/jiwa, mata pencaharian, kelompok rentan	Profil desa, BPS	Desk + survei cepat	SAMPAN Sosial	PIN	Tinggi
Sosial	Stakeholder map & analisis kepentingan	Lapangan	Tool 1 Stakeholder Analysis	SAMPAN Sosial	PIN	Tinggi
Sosial	Konflik lahan/sumber daya historis	Wawancara, arsip desa	Tool 7 Historical Timeline, wawancara	SAMPAN Sosial	PIN	Tinggi
FPIC	Bukti keputusan tahap (i)	Musyawarah	Notulen, BA, dokumentasi	LPHD + SAMPAN	PIN	Tinggi
E&S	Jawaban kuesioner Annex 4	Tim proyek	Workshop internal	SAMPAN Safeguards	PIN	Tinggi
Otoritas	Surat pemberitahuan & tanda terima	Instansi	Surat resmi + audiensi	SAMPAN Direktur	PIN (Annex 5)	Tinggi
Double counting	Daftar proyek/program karbon di area	SRN-PPI, Plan Vivo/Verra/GS registry, Dinas LHK	Pencarian registri + surat	SAMPAN Legal	PIN	Tinggi
Keuangan	Anggaran pengembangan & sumber dana	SAMPAN	Penyusunan anggaran	SAMPAN Keuangan	PIN	Sedang

8.2 PIN Supporting Document Checklist

Dokumen	Fungsi	Mandatory / Recommended	Status (per 20/10/2026)	Penanggung jawab
PIN (template V1.4, Bahasa Inggris)	Dokumen utama	Mandatory [CR]	Belum disusun	SAMPAN
Annex 1 – file geospasial batas Project Region & Area	Batas	"Optional" di PIN [CR], sangat disarankan [RP]	Belum	SAMPAN GIS
Annex 2 – Registration certificate Project Coordinator (+ terjemahan)	Legalitas PC	Mandatory [CR]	Belum dihimpun	SAMPAN
Annex 2 – Pernyataan persetujuan Project Coordinator (jika pemohon ≠ PC)	Consent PC	Mandatory bila berlaku [CR]	N/A s.d. PC ditetapkan	—
Annex 3 – Exclusion List	Safeguard	Mandatory [CR]	Belum	SAMPAN Safeguards
Annex 4 – E&S Screening Section A–C	Safeguard	Mandatory [CR]	Belum	SAMPAN Safeguards
Annex 5 – Korespondensi pemberitahuan otoritas	Kepatuhan hukum	Mandatory [CR]	Belum	SAMPAN Direktur
Annex 6 – AI Tool Use Disclosure	Transparansi	Mandatory [CR]	Belum	SAMPAN
Salinan SK Hutan Desa + terjemahan	Bukti hak kelola	Recommended kuat (bukti untuk §1.3) [RP]	Ada referensi nomor	LPHD/SAMPAN
Perjanjian/MoU LPHD–SAMPAN (mandat pengembangan proyek)	Bukti peran & mandat	Recommended kuat; wajib secara substansi untuk PDD (PR §2.2.2)	Dalam persiapan	LPHD + SAMPAN
Berita Acara keputusan FPIC tahap (i) + daftar hadir terpilah	Bukti FPIC awal	Recommended kuat (ditanyakan Annex 4 §C)	Belum	LPHD + SAMPAN
Notulen konsultasi & foto	Bukti partisipasi	Recommended	Sebagian (koordinasi awal)	SAMPAN
Bukti pembayaran fee PIN review	Administrasi	Mandatory saat submission [CR] (PM §2.2)	—	SAMPAN Keuangan

---

Bab 9 — SOP Pengajuan PIN dan Proses Masuk Project Pipeline Plan Vivo — Hutan Desa Pasir

9.1 Jawaban atas 23 pertanyaan prosedur (berbasis dokumen resmi)

#	Pertanyaan	Jawaban	Dasar
1	Langkah formal pertama?	**Submission PIN** dengan template terbaru.	PM §1, §2.1 [CR]
2	Konsultasi pendahuluan wajib?	**Opsional**: "Project Coordinators *may* request a call" via projects@planvivofoundation.org.	PM §2.2 [CR]
3	Ada pre-screening sebelum PIN?	Tidak ada tahap pre-screening formal terpisah; PIN review itu sendiri disebut "Project Screening".	PM §1, §2 [CR]
4	Kuesioner kelayakan wajib?	Tidak ada kuesioner kelayakan terpisah; yang wajib adalah **kuesioner E&S Annex 4** di dalam PIN.	PIN-T Annex 4 [CR]
5	Formulir resmi?	PIN Template V1.4 (.docx) di laman PV Climate Documents.	Laman dokumen [CR]
6–8	Cara & penerima submission?	**Email** ke **projects@planvivofoundation.org** (tidak ada portal).	PM §2.2 [CR]
9	Lampiran wajib?	Annex 1–6 sesuai template (Annex 1 opsional).	PIN-T [CR]

#	Pertanyaan	Jawaban	Dasar
10	Fee dibayar sebelum asesmen?	Ya — "On submission of the PIN, Projects must pay a PIN review fee".	PM §2.2 [CR]
11	Kategori fee?	Proyek penerbit PVC: **USD 1,000** (semua proyek); proyek non-issuing: USD 1,500. Fee dapat dikenai VAT 20% untuk organisasi UK; organisasi internasional "typically exempt".	CF §1.1–1.2 [CR]; status VAT untuk entitas Indonesia **[OCR]**
12 – 13	Setelah submission & siapa yang menilai?	**Plan Vivo** (sekretariat) melakukan review dan menerbitkan **PIN review report** (kelayakan, NIR, CAR). Kuesioner E&S dinilai **reviewer E&S Plan Vivo** (Section D).	PM §2.2; PIN-T Annex 4 [CR]
14	Berapa tahap asesmen?	Satu proses review dengan maksimal **3 putaran** submission/feedback.	PM §2.2 [CR]
15	Revisi/klarifikasi ?	Resubmit dalam **6 bulan** sejak feedback; lewat 3 putaran atau 6 bulan → fee PIN review tambahan **atau** PIN ditolak.	PM §2.2 [CR]
16	Kriteria penerimaan?	Memenuhi kriteria kelayakan Project Requirements dan seluruh CAR ditutup.	PM §2.2 [CR]
17	Konfirmasi yang diterima?	PIN review report final menyatakan approved; PIN dipublikasikan di laman pipeline. Bentuk surat/sertifikat khusus tidak disebut.	PM §2.2 [CR]; format bukti formal **[OCR]**
18	Kapan menjadi pipeline project?	**Saat PIN disetujui**: "Once a PIN is approved, the Project enters the Project pipeline".	PM §2.2 [CR]
19	Proyek pra-sertifikasi dipublikasikan?	Ya — laman www.planvivo.org/pipeline menampilkan PIN yang disetujui (dan PDD saat konsultasi publik).	PM §2.2; laman pipeline [CR]
20	PIN approval = registrasi?	**Tidak.** Registrasi terjadi setelah validasi sukses + MoU dengan Plan Vivo + sertifikat registrasi.	PM §1, §6 [CR]
21	Aplikasi pipeline terpisah?	**Tidak ada**; status pipeline adalah konsekuensi otomatis PIN approval.	PM §2.2 [CR]
22	Durasi?	Indikatif: review awal **6 minggu**, review respons CAR/NIR **4 minggu** (tidak termasuk waktu respons proyek).	PM §9 Tabel 1–2 [CR]
23	Jika ditolak/dikeluarkan?	Ditolak bila tidak lolos setelah 3 putaran/tidak resubmit 6 bulan (atau dikenai fee baru). Setelah approved, bila **PDD tidak diajukan dalam 3 tahun**, PIN dihapus dari pipeline dan resubmission dikenai fee PIN baru.	PM §2.2 [CR]

9.2 Pembedaan istilah (wajib dipahami tim)


Istilah	Status formal Plan Vivo?	Penjelasan
Project inquiry / introductory call	Bukan tahap formal (opsional)	Email/call ke projects@planvivofoundation.org untuk membahas kelayakan & jadwal
Preliminary eligibility screening	**Tidak** ada sebagai tahap terpisah	Penilaian kelayakan terjadi melalui PIN review
PIN submission	Tahap formal (+ fee)	Email PIN lengkap + pembayaran fee
PIN technical review	Tahap formal	Plan Vivo menerbitkan PIN review report (NIR/CAR)
PIN acceptance (approval)	Keputusan formal	Seluruh CAR ditutup; PIN dipublikasikan
Project pipeline status	Status formal	Otomatis saat PIN approved; berlaku 3 tahun untuk mengajukan PDD; dan PDD hanya boleh diajukan oleh proyek yang terdaftar di pipeline (PM §4.1)
Project registration	Status formal	Setelah validasi + MoU + registration certificate + nomor registrasi unik (PM §6.1)
Project certification	Status formal	"Upon successful Validation, the Project may complete registration and become Certified" (PM §1) — Certified = Registered & patuh
Registry account	**Bukan** status sertifikasi	Akun di PV Climate Registry (S&P Global) untuk menerima PVC (PM §6.2)

Istilah	Status formal Plan Vivo?	Penjelasan
Methodology pipeline	Status formal **metodologi**, bukan proyek	Metodologi yang concept note-nya disetujui (PM §3.1). **Metodologi pipeline tidak boleh dipakai** untuk PDD; semua metodologi harus *approved* sebelum PDD diajukan (PM §4.1)

9.3 SOP — tahapan, PIC, output, bukti

Tahap	Aktivitas	PIC (usulan)	Saluran	Lampiran /Input	Fee	Decision gate	Output & bukti resmi
S0. Persiapan internal	Tetapkan Project Coordinator, mandat LPHD, tim inti	Rapat LPHD + Direksi SAMPAN	Internal	BA rapat LPHD; MoU/PKS	—	G0: mandat tertulis ada	BA + PKS ditandatangani
S1. Inquiry (opsional, dianjurkan)	Email & intro call ke Plan Vivo; ajukan daftar pertanyaan Bab 29	SAMPAN	projects@planvivofoundation.org	Ringkasan proyek 2 halaman	—	—	Email balasan / catatan call (arsipkan)
S2. Pengumpulan bukti Pre-PIN	Data Bab 8; FPIC tahap (i); notifikasi otoritas	SAMPAN + LPHD	Lapangan/instansi	—	—	G1: kriteria §9.8 terpenuhi	Paket bukti
S3. Penyusunan PIN	Drafting V0.x; translasi lampiran	SAMPAN (penulis), konsultan	Internal	Template V1.4	—	—	Draf PIN
S4. QA internal	Checklist Bab 11; review LPHD; validasi fakta	QA lead + LPHD	Internal	Draf PIN	—	G2: semua butir QA "Lulus"	Lembar QA bertanda tangan
S5. Persetujuan internal	Musyawarah LPHD menyetujui isi PIN (versi ringkas Bahasa Indonesia)	LPHD + Pemdes	Musyawarah	Ringkasan Bahasa Indonesia	—	G3: BA persetujuan	BA persetujuan submission
S6. Submission	Email PIN (Word/PDF) + Annex + pembayaran fee	Project Coordinator	Email ke projects@	PIN + Annex 1–6	**USD 1,000**	—	Email terkirim + bukti transfer + tanda terima Plan Vivo
S7. Review Plan Vivo	Plan Vivo menilai; E&S reviewer mengisi Section D	Plan Vivo	—	—	—	—	PIN review report (≈6 minggu)
S8. Revisi	Tanggapi NIR/CAR (tabel respons), resubmit ≤ 6 bulan	SAMPAN + LPHD	Email	PIN rev. + matriks respons	(fee tambahan jika >3 putaran/>6 bulan)	G4	PIN revisi (review ≈4 minggu)
S9. Keputusan	Approved → masuk pipeline & publikasi	Plan Vivo	Website	—	—	**G5: PIN approved**	PIN review report final + listing di planvivo.org/pipeline
S10. Pasca-approval	Mulai jam 3 tahun untuk PDD; pilih metodologi approved	SAMPAN	—	—	—	—	Rencana PDD

9.4 Flowchart

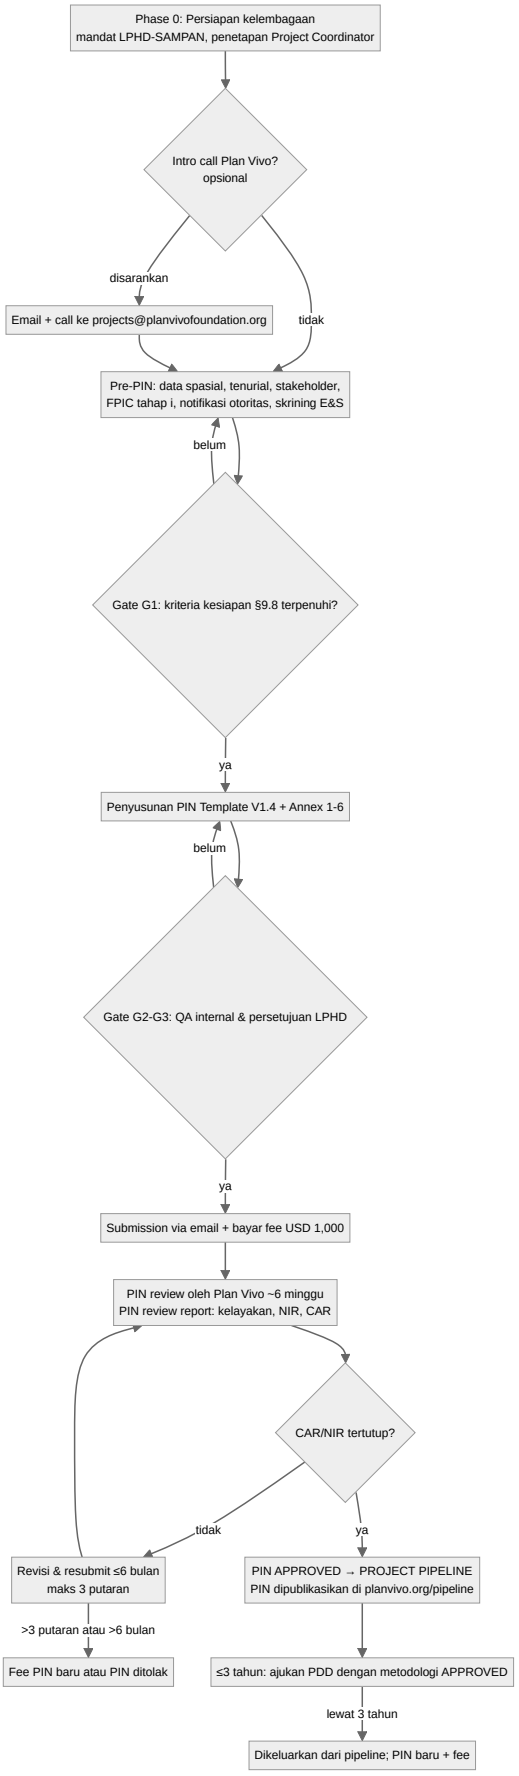

9.5 Apa yang secara tepat merupakan "masuk project pipeline" (berbasis bukti)

1. **[CR]** PM §1: "If a PIN is approved, a Project is listed in the Project pipeline and can then submit a Project Design Document (PDD) for assessment."
2. **[CR]** PM §2.2: "Once a PIN is approved, the Project enters the Project pipeline and the PIN will be published on the Plan Vivo website."
3. **[CR]** PM §4.1 / §5.1: "PDDs can only be submitted for Projects that are listed in the Project pipeline."
4. **[CR]** PM §2.2: pipeline status gugur bila PDD tidak diajukan dalam 3 tahun sejak PIN approval.
5. **[CR]** PM §4.4/§5.3: proyek juga dikeluarkan dari pipeline bila validasi tidak selesai dalam 3 tahun sejak PDD submission.

Bukti keberhasilan masuk pipeline yang harus diarsipkan: (a) PIN review report final yang menyatakan approval; (b) email konfirmasi Plan Vivo; (c) tangkapan layar/arsip laman pipeline yang memuat proyek dan file "approved_pin". **Status pipeline bukan sertifikasi, bukan registrasi, dan tidak menghasilkan PVC.** Proyek pipeline tidak boleh mengklaim "Plan Vivo certified".

9.6 Biaya Plan Vivo sesuai ketentuan resmi (USD & IDR) [CR]

Sumber: *PV Climate – Costs & Fees* (PDF resmi Plan Vivo, diakses 20/10/2026) dan Procedures Manual V3.9 (§2.2, §4.1, §5.1, §7, §8). Kurs perencanaan **Rp17.930/USD** (JISDOR 13/10/2026, sumber sekunder; nilai JISDOR yang lebih baru tidak ditemukan per 21/10/2026). Konversi IDR **bukan** bagian ketentuan Plan Vivo; tagihan resmi dalam USD. Perbarui kurs pada hari pembayaran.

A. Fee per tahap (proyek penerbit PVC)

Tahap	Komponen fee	Kapan dibayar	USD	IDR
PIN	PIN review (semua proyek)	Saat submission PIN	1,000	17.930.000
PIN	PIN review tambahan (gagal setelah 3 putaran, tidak resubmit ≤6 bulan, atau pipeline kedaluwarsa 3 tahun)	Bila terjadi	1,000	17.930.000
PDD	PDD review — macroscale (≥10.000 tCO2e/th)	Saat submission PDD	1,500	26.895.000
PDD	PDD review — microscale (<10.000 tCO2e/th)	Saat submission PDD	3,000	53.790.000
Validasi	Koordinasi Validation & Verification — macroscale	Saat submission PDD untuk validasi	1,000	17.930.000
Validasi	Koordinasi Validation & Verification — microscale	Saat submission PDD untuk validasi	2,000	35.860.000
PDD	Review Technical Specification tambahan	Bila menambah tech spec	500	8.965.000
PDD	Update PDD/Tech Spec	Bila update	Variabel	—
Verifikasi	Koordinasi verifikasi — macroscale / microscale	Setiap verifikasi (≤5 th)	1,000 / 2,000	17.930.000 / 35.860.000
Pelaporan	Annual Report	Tahunan	0	0
Pelaporan	Denda Annual Report terlambat >12 bulan	Bila terlambat	100	1.793.000
Issuance	Per PVC, ≤50.000 PVC/proyek/tahun	Saat issuance	0.40/PVC	7.172/PVC
Issuance	Per PVC, >50.000 PVC/proyek/tahun	Saat issuance	0.35/PVC	6.276/PVC (dibulatkan)
Issuance	Konversi fPVC/rPVC → vPVC	—	0	0
Metodologi (bila perlu)	Review concept note	Saat submit concept note	350	6.275.500
Metodologi (bila perlu)	Asesmen metodologi (di luar biaya panel)	Saat submit metodologi	Variabel	—

Tahap	Komponen fee	Kapan dibayar	USD	IDR
Auditor	Registrasi VVB / Independent Expert di Plan Vivo	Bila auditor belum terdaftar	500 / 100	8.965.000 / 1.793.000
Reseller (opsional)	Akun reseller di PV Climate Registry	Sekali + tahunan	800 + 800/th	14.344.000 + 14.344.000/th

Catatan resmi: semua fee "subject to VAT (20% for UK organisations); international organisations are typically exempt" → status VAT untuk SAMPAN **[OCR]**. Biaya VVB/IE, perjalanan auditor, audit keuangan, PNBP karbon Indonesia, dan pajak **tidak** termasuk.

B. Total fee Plan Vivo sampai registrasi (tanpa biaya auditor)

Jalur	Komponen	USD	IDR
Microscale (IE)	PIN 1,000 + PDD review 3,000 + koordinasi V&V 2,000	**6,000**	**107.580.000**
Macroscale (VVB)	PIN 1,000 + PDD review 1,500 + koordinasi V&V 1,000	**3,500**	**62.755.000**

C. Ilustrasi fee issuance (bukan proyeksi Pasir): 5.000 PVC × USD 0.40 = USD 2,000 (Rp35.860.000); 10.000 PVC × USD 0.40 = USD 4,000 (Rp71.720.000).

Catatan: microscale membayar fee Plan Vivo lebih tinggi karena Plan Vivo melakukan validasi/verifikasi bersama IE; biaya auditor pihak ketiga biasanya lebih rendah dibanding VVB — bandingkan total biaya setelah penawaran IE/VVB diperoleh **[PSA]**.

9.7 Risiko utama di tahap submission

- Resubmission melewati 6 bulan → fee baru.
- Data inti (batas, hak, FPIC) lemah → CAR berulang.
- Metodologi tidak cocok (mis. baseline "effective community management" untuk PT002) → harus pindah jalur/menunggu metodologi baru.

9.8 Readiness criteria sebelum submit PIN (Gate G1–G3)

PIN **hanya** diajukan bila seluruh butir berikut terpenuhi:

1. Project Coordinator ditetapkan, berbadan hukum, registration certificate tersedia.
2. Mandat tertulis LPHD Pasir (dan bila perlu Pemerintah Desa) untuk pengembangan proyek oleh/bersama SAMPAN.
3. Salinan SK Hutan Desa + peta areal kerja + konfirmasi masih berlaku.
4. Peta Project Region & Project Area indikatif (SHP/KML) dengan cek tumpang tindih.
5. Klasifikasi ekosistem indikatif (gambut/mineral) & analisis tutupan lahan indikatif ≥10 tahun.
6. Jalur metodologi approved yang **lolos uji applicability awal** (Bab 12), atau keputusan sadar untuk menempuh pengembangan metodologi (dengan implikasi biaya/waktu).
7. Stakeholder analysis tertulis + identifikasi kelompok adat/rentan + catatan konflik.
8. Bukti keputusan FPIC tahap (i) "consider the proposed project".
9. Annex 3 & Annex 4 (Section A–C) terisi.
10. Bukti pemberitahuan ke otoritas (Annex 5).
11. Analisis Double Counting & Table 3.8 dengan rujukan regulasi yang berlaku per tanggal submission.
12. Rencana pendanaan pengembangan s.d. validasi.
13. QA internal lulus & BA persetujuan LPHD.

9.9 Target PIN Hutan Desa Pasir (usulan target kerja — perlu disepakati SAMPAN & LPHD) [PSA]

Durasi review berasal dari Procedures Manual V3.9 §9 (indikatif, belum termasuk waktu respons proyek). Tanggal adalah **target perencanaan**, bukan komitmen Plan Vivo.

No	Milestone	Target tanggal	Dasar / syarat
T1	PKS LPHD–SAMPAN ditandatangani; Project Coordinator ditetapkan	16 Nov 2026	Rencana 90 hari minggu 4
T2	Fungsi kawasan & blok, peta areal kerja, klasifikasi gambut/mineral terkonfirmasi	7 Des 2026	Gate G1a
T3	Keputusan FPIC tahap (i) terdokumentasi; Annex 3–5 terisi	21 Des 2026	Minggu 9
T4	Draf PIN v0.9 + QA internal	11 Jan 2027	Minggu 12
T5	Rapat go/no-go submission	18 Jan 2027	13 kriteria §9.8
T6	**Submission PIN ke Plan Vivo + bayar USD 1,000 (Rp17.930.000)**	**Target 31 Mar 2027** (paling cepat Feb 2027; paling lambat 30 Apr 2027)	Semua kriteria §9.8 terpenuhi; persetujuan LPHD
T7	PIN review report pertama	± pertengahan Mei 2027	Review awal ±6 minggu
T8	Respons NIR/CAR putaran 1	≤ 4 minggu setelah T7 (batas resmi 6 bulan)	Target internal
T9	Review respons	± pertengahan Juli 2027	±4 minggu per putaran
T10	**PIN approved → masuk project pipeline**	**Target Juli–September 2027** (1–2 putaran)	Semua CAR ditutup; maks. 3 putaran
T11	Batas akhir submission PDD	3 tahun setelah T10 (≈ Q3 2030)	PM §2.2

Target fee tahap PIN: **USD 1,000 = Rp17.930.000** (ditambah biaya transfer bank). Cadangkan satu fee PIN review tambahan (USD 1,000 = Rp17.930.000) sebagai kontinjensi bila terjadi lebih dari 3 putaran atau keterlambatan resubmission.

Bab 10 — Project Pipeline Entry and Status Verification

Status	Bagaimana diverifikasi	Siapa menerbitkan	Masa berlaku / konsekuensi
PIN submitted	Email terkirim + tanda terima	Plan Vivo (balasan email)	—
PIN under review	PIN review report (draf)	Plan Vivo	Respons ≤6 bulan
PIN approved / Pipeline	PIN review report final + listing di planvivo.org/pipeline	Plan Vivo	3 tahun untuk submission PDD
PDD under public consultation	PDD dipublikasikan 4 minggu di laman pipeline	Plan Vivo	Feedback diteruskan ke VVB/IE
Validated	Validation report disetujui Plan Vivo	VVB/IE + Plan Vivo	Validasi harus selesai ≤3 tahun sejak PDD submission
Registered / Certified	MoU + Registration certificate (nomor registrasi unik)	Plan Vivo	Selama patuh MoU
Registry project account	Akun proyek di PV Climate Registry (S&P Global)	S&P Global (setelah due diligence)	—
Suspended / Decertified	Notifikasi tertulis + laman proyek	Plan Vivo	Remediation Plan ≤6 bulan

Bab 11 — PIN Quality Assurance Checklist

Gunakan sebelum Gate G2. Setiap butir: **Lulus / Tidak / N/A** + bukti + nama reviewer.

A. Format & administrasi

Template V1.4 yang dipakai adalah versi terbaru per hari submission (cek ulang laman dokumen).
Semua kotak instruksi dihapus; tidak ada heading/tabel/kolom yang dihapus.
Calibri 11 hitam regular; angka memakai titik desimal.
Bahasa Inggris; lampiran non-Inggris disertai terjemahan.
Nomor versi PIN & tanggal; "Date Approved" dikosongkan.
Annex 1–6 lengkap; Annex 6 jujur tentang penggunaan AI.
Bukti transfer fee siap.

B. Konsistensi angka

Luas di OVERVIEW = Table 1.2 = peta = SHP.
Jumlah partisipan konsisten di OVERVIEW, 2.3, 3.2.
Nama intervensi konsisten di OVERVIEW, 1.1, 3.4, 3.5.
Tidak ada angka tCO2e yang disajikan sebagai "verified"/"guaranteed".

C. Substansi kelayakan

Kategori intervensi = Protection/Restoration/Improved Management.
Metodologi dirujuk berstatus *approved* dan applicability conditions telah diuji (termasuk larangan perubahan muka air tanah di PM001 dan pengecualian "effective community management" di PT002).
Hak kelola vs hak karbon dibedakan; jalur regulasi karbon nasional dijelaskan.
Partisipan memenuhi PR §2.3 (residen, skala kecil).
Stakeholder Local vs Secondary; masyarakat adat dicek.
FPIC 3 tahap dijelaskan; bukti tahap (i) dilampirkan/dirujuk.
Baseline menjawab driver deforestasi/degradasi dengan data.
Barrier analysis per intervensi; isu regulatory surplus PS diantisipasi.
Double counting: SRN, FOLU Net Sink, program RBP, proyek lain.
Exclusion List terisi 27 butir.
Annex 4 Section A–C terisi, termasuk "still to be completed" bila relevan.
Otoritas teridentifikasi; surat pemberitahuan terlampir.
Pernyataan kepatuhan hukum ada.
Rencana pendanaan realistis.

D. Integritas

Setiap klaim faktual punya sumber di folder bukti (Vol. V Bab 26).
Tidak ada placeholder [DATA REQUIRED] tersisa di versi submission.
LPHD telah membaca ringkasan Bahasa Indonesia dan menyetujui.
Data pribadi partisipan tidak dimasukkan ke dokumen publik.

Lampiran Vol. II — PIN Working Draft Structure (English, Pasir-specific)

Draf kerja lengkap dengan placeholder tersedia di berkas terpisah: `LAMPIRAN-A_PIN-Working-Draft_Pasir_EN.md`.

VOLUME III — TECHNICAL PROJECT DEVELOPMENT

Pasir Village Forest Community Carbon Project · Tanggal acuan: 20 Oktober 2026 Kode klasifikasi: **[CR]** Confirmed Requirement · **[RP]** Recommended Practice · **[PSA]** Project-Specific Assumption · **[OCR]** Official Clarification Required · **[PRR]** Potential Regulatory Risk

---

Bab 12 — Methodology Selection and Applicability

12.1 Daftar metodologi, modul, dan tool PV Climate per 20/10/2026 (laman resmi)

Approved Methodologies [CR]

Kode	Nama	Versi	Active from	Cakupan ringkas
PM001	Agriculture & Forestry Carbon Benefit Assessment Methodology	1.0	09/11/2023	Modular; intervensi di lahan hutan, pertanian, padang rumput: agroforestri, perubahan budidaya, ternak, A/R, **forest restoration, forest protection, improved forest management**. Berlaku untuk "all types of forest, including forested wetlands such as swamp forest and mangroves". **Larangan:** aktivitas proyek tidak boleh mencakup irigasi genangan, **drainase, atau aktivitas lain yang memengaruhi muka air tanah** (PM001 §4.1). Protection/IFM hanya menghasilkan **rPVC/vPVC**; fPVC hanya untuk removal (A/R, restorasi) (PM001 §4.2).
PM002	Methodology for Quantifying Carbon Benefits from Small-Scale Agroforestry (Acorn)	1.0	29/09/2025	Agroforestri skala kecil berbasis remote sensing

Approved Modules [CR] — PU001 V1.1 (removals dari carbon pools; A/R, restorasi, agroforestri), **PU002 V1.0 (emisi dari carbon pools — forest protection)**, PU003 V1.0 (emisi dari sumber emisi), **PU004 V1.0 (leakage)**, **PU005 V1.1 (uncertainty)**, PU006–PU009 (khusus agroforestri Acorn).

Approved Tools [CR] — PT001 V2.1 (SHAMBA, tanah pertanian/agroforestri), **PT002 V2.0 (Estimation of carbon benefits from REDD in community managed forest)**, PT003 V1.0 (penggunaan model tervalidasi), PT004 V1.0 (identifikasi lahan terdegradasi), PT005–PT006 (agroforestri Acorn).

Methodology pipeline — BELUM APPROVED, tidak boleh dipakai untuk PDD [CR, PM §3–4] (metodologi/modul mangrove di bawah ini **tidak relevan** bagi Pasir karena tidak ada mangrove — dicantumkan hanya untuk kelengkapan register): Coastal Blue Carbon Methodology (PM00X draft v0.7), **Mangrove Conservation Module** (PU00A draft v0.9), **Simplified Mangrove Restoration Module** (PU00B draft v0.9), Tool emisi akibat kanal di mangrove (PT00A draft), serta concept notes: tree diameter growth, rangelands, baseline/additionality significance testing tool, soil organic carbon, harvested wood products, **Logged to Protected Forest**.

12.2 Uji applicability PT002 (jalur utama untuk Protection) [CR]

PT002 §4.1 — dapat dipakai bila **semua** terpenuhi:

- diterapkan pada **community managed forest**;
- sebagian besar variasi biomassa pohon dijelaskan oleh **tipe hutan**;
- faktor utama driver deforestasi/degradasi dipakai untuk mendefinisikan **strata hutan**.

Tidak dapat dipakai bila:

- baseline mencakup **deforestasi terencana** yang terdokumentasi dalam dokumen perencanaan/pengelolaan lahan; **atau**
- baseline mencakup **effective community management**.

Ketentuan prosedural: wajib **reference region** (mencakup ≥2× luas tiap tipe & klasifikasi hukum hutan di project area, dengan driver serupa, project area tidak termasuk), **leakage area**, **reference period**; hanya untuk rPVC/vPVC.

Implikasi bagi Pasir [PSA + PRR]:

1. Hutan Desa berstatus "community managed" — memenuhi syarat dasar.
2. Karena persetujuan PS sudah ada sejak 2019, Plan Vivo dan validator akan menguji apakah baseline sudah berisi "effective community management". Bila data tutupan lahan 2019–2026 menunjukkan **tidak ada** kehilangan hutan di areal Hutan Desa sementara di reference region ada, argumen bahwa pengelolaan saat ini tidak efektif akan lemah → **potensi tidak eligible untuk PT002**.
3. Bila RTRW/rencana lain mendokumentasikan alokasi konversi (mis. perkebunan, kawasan industri, infrastruktur di Mempawah) di dalam areal — PT002 tidak dapat dipakai untuk bagian tersebut (dan juga menimbulkan isu legalitas).
4. Cek apakah areal punya cukup luasan hutan serupa di sekitar (reference region 2×) — untuk Hutan Desa berukuran kecil, menemukan reference region yang setara bisa sulit.

12.3 Methodology Applicability Matrix

Intervensi	Potensi metodologi	Status persetujuan	Syarat applicability kunci	Kebutuhan data	Kesesuaian untuk Pasir	Risiko
Avoided deforestation (hutan mineral/rawa)	PM001 + PU002 + PT002 + PU004 + PU005 (+PU003)	**Approved**	Lihat §12.2	Peta tutupan lahan multi-waktu, strata, plot biomassa, reference region, leakage area	**Paling menjanjikan bila** areal berupa hutan dengan ancaman nyata & pengelolaan saat ini belum efektif [PSA]	Pengecualian "effective community management"; volume kredit kecil bila areal kecil
Avoided degradation	Sama (PT002 mencakup deforestasi **dan** degradasi)	Approved	Sama	+ data degradasi (kerapatan tajuk, plot berulang)	Mungkin [PSA]	Degradasi sulit dideteksi citra resolusi menengah
Konservasi hutan alam (tanpa ancaman)	Tidak ada jalur kredit	—	Tidak additional	—	**Tidak creditable** bila tidak ada ancaman	—
~~Mangrove conservation~~ — **Not Applicable (tidak ada mangrove di Pasir)**	(a) PM001+PU002+PT002; (b) Mangrove Conservation Module PU00A	(a) **Approved**, kecocokan metodologis untuk mangrove **[OCR]**; (b) **Pipeline – belum approved**	(a) syarat PT002; (b) syarat PM00X + PU00A (tanpa alat berat, tanpa panen selektif, dst.)	Strata mangrove, biomassa (alometri mangrove), driver (konversi tambak, abrasi, penebangan)	**Tergantung konfirmasi Plan Vivo** apakah PT002 dapat dipakai untuk mangrove atau harus menunggu PU00A	Karbon tanah mangrove (pool terbesar) kemungkinan tidak terkuantifikasi memadai dengan PT002 → konservatif/kecil; risiko perubahan versi metodologi

Intervensi	Potensi metodologi	Status persetujuan	Syarat applicability kunci	Kebutuhan data	Kesesuaian untuk Pasir	Risiko
~~Mangrove restoration~~ — **Not Applicable**	(a) PM001+PU001; (b) Simplified Mangrove Restoration Module PU00B	(a) Approved [kecocokan **OCR**]; (b) **Pipeline**	PR: tidak ada konversi ekosistem alami 10 th terakhir; spesies asli; tidak ada perubahan hidrologi (PM001)	Peta lahan terbuka/terdegradasi, sejarah tanam (BPDAS dll.), survival plot	Mungkin untuk areal bekas abrasi/tambak terbengkalai **[PSA]**	**Additionality**: penanaman mangrove oleh program pemerintah/swasta sebelumnya (dilaporkan ±35 ha di pesisir Desa Pasir) **tidak boleh diklaim**; pemulihan hidrologi tambak = memengaruhi muka air → dilarang PM001
Peatland protection (cegah drainase/kebakaran)	PM001+PU002+PT002 untuk biomassa **di atas** tanah	Approved (biomassa saja)	Tidak boleh ada aktivitas yang memengaruhi muka air tanah	Peta KHG & kedalaman gambut	Biomassa saja bisa; emisi gambut (oksidasi/kebakaran) — kuantifikasi **[OCR]**	Kredit jauh di bawah potensi riil; aktivitas sekat kanal **tidak** boleh dalam proyek PM001
Peatland restoration / rewetting	Tidak ada	**Tidak ada jalur approved**	PM001 melarang aktivitas yang memengaruhi muka air tanah	—	**Tidak creditable** saat ini di PV Climate	Butuh metodologi baru (concept note → MAP)
Assisted natural regeneration (ANR)	PM001 + PU001 (+PU003/PU004/PU005), PT004	Approved	Lahan terdegradasi; tidak ada pembukaan/konversi 10 (s.d. 15) th sebelum intervensi (PR §3.8 Guidance)	Peta degradasi, plot pertumbuhan, model	Mungkin [PSA]	Volume kecil; perlu bukti degradasi (PT004)
Sustainable forest management / IFM	PM001 (IFM) — modul spesifik "Logged to Protected Forest" masih concept note	Sebagian (kerangka approved; modul spesifik **pipeline**)	Ada baseline penebangan legal	Rencana tebang, data volume	**Tidak relevan** untuk Hutan Desa tanpa izin pemanfaatan kayu [PSA]	—
Agroforestri	PM001 + PU001 / PM002 + PU006–PU009 / PT001	Approved	Pertanian skala kecil; PT005: tidak ada deforestasi 10 th	Data kebun, biomassa	Hanya bila ada lahan garapan di Project Region di luar hutan [PSA]	Hutan Desa = kawasan hutan; agroforestri di dalamnya harus sesuai RKHD
Intervensi lain (mis. ekowisata, perikanan)	Tidak ada	—	Bukan intervensi karbon	—	Hanya sebagai **livelihood benefit**	—

12.4 Rekomendasi jalur metodologi (bersyarat)

1. **Jalur utama (jika areal dominan hutan dengan ancaman nyata):** *Protection* dengan **PM001 + PU002 + PT002 + PU004 + PU005** (+PU003 bila ada sumber emisi), ditambah *Restoration* dengan **PM001 + PU001** untuk areal terdegradasi yang memenuhi syarat.
2. **Mangrove: tidak relevan** — tim proyek mengonfirmasi tidak ada mangrove di Desa Pasir, sehingga Pasir **tidak bergantung pada metodologi pipeline** mana pun. Ini menyederhanakan jalur: semua intervensi kandidat memakai elemen yang sudah approved (PM001, PU001–PU005, PT002, PT004).

3. **Jika areal dominan gambut dengan ancaman drainase/kebakaran:** hanya biomassa yang bisa dikreditkan di PV Climate saat ini; pertimbangkan apakah nilai ekonominya memadai.
4. **Metodologi baru** (concept note USD 350 + asesmen variabel + biaya panel MAP; indikatif 2+4+4+3 minggu review tanpa waktu respons; minimal 4 minggu konsultasi publik) **tidak direkomendasikan** sebagai jalur pertama bagi proyek tunggal skala kecil.

12.5 Investigasi wajib sebelum rekomendasi final [CR+RP]


1. Peta areal Hutan Desa resmi (SK) dan klasifikasi tutupan & tanah (gambut/mineral; kedalaman gambut bila ada).
2. Analisis perubahan tutupan 2010–2026 di areal & reference region kandidat.
3. Identifikasi driver dan agen deforestasi/degradasi (wawancara, timeline historis).
4. Bukti efektivitas pengelolaan LPHD sejak 2019 (patroli, RKT, laporan).
5. Sejarah program rehabilitasi/restorasi di areal (RHL BPDAS, restorasi gambut, CSR).
6. Rencana tata ruang (RTRW Kab. Mempawah, RZWP3K Kalbar) di areal & sekitar.
7. Estimasi orde besaran Carbon Benefit (untuk mengetahui micro- vs macroscale dan kelayakan finansial).

Bab 13 — Institutional and Community Governance

13.1 Fakta vs usulan

Elemen	Status
LPHD Pasir sebagai lembaga pengelola Hutan Desa berdasarkan SK.10885/2019	**Fakta** (nomor SK; isi belum diperiksa)
SAMPAN Kalimantan sebagai organisasi fasilitator	**Fakta** (per TOR)
Perjanjian kerja sama LPHD–SAMPAN	**Dalam persiapan**
SAMPAN sebagai Project Coordinator	**Usulan**
Forum/Steering Committee proyek	**Usulan**
Rekening khusus proyek, audit tahunan	**Usulan** (wajib PR §5.5 setelah ada pendapatan PVC)

13.2 Diagram struktur kelembagaan (usulan)

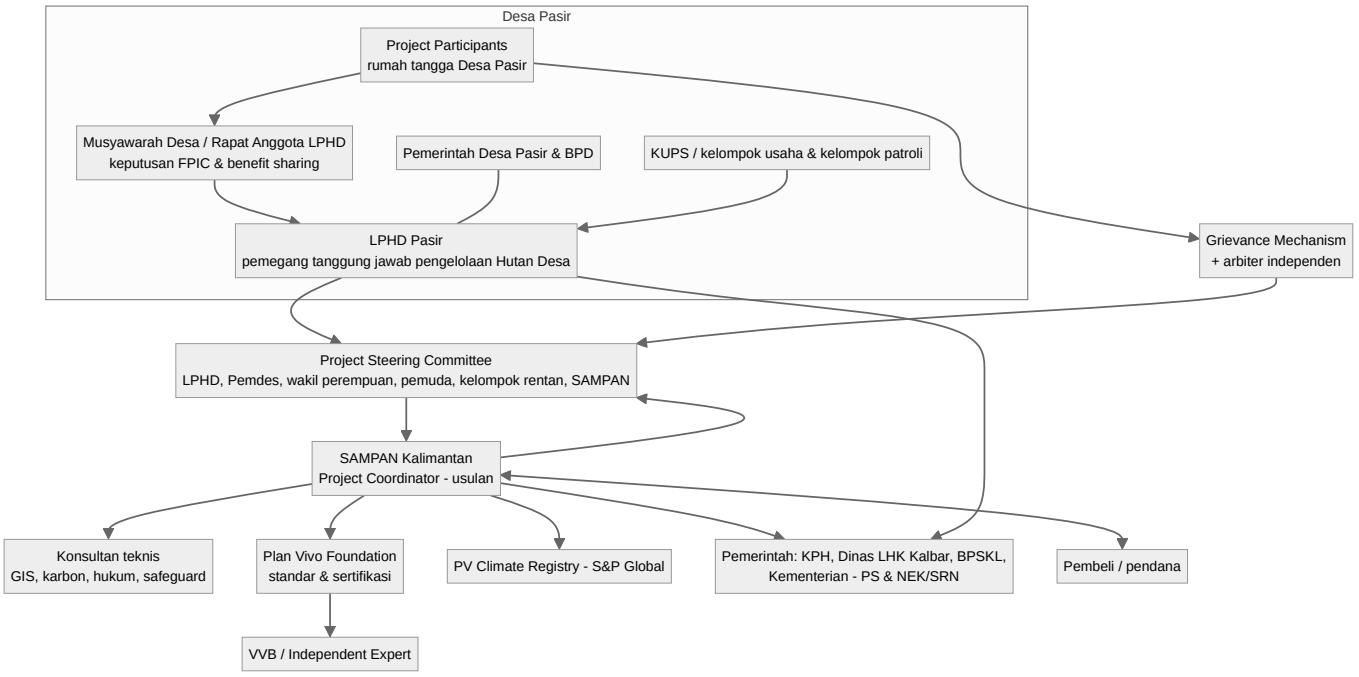

13.3 Roles and Responsibilities Matrix

Aktor	Peran utama	Hak/kewenangan	Kewajiban
LPHD Pasir	Pengelola Hutan Desa; wakil Project Participants	Hak kelola sesuai SK; persetujuan atas desain, PDD, Project Agreement, benefit sharing	Melaksanakan intervensi, monitoring lapangan, kepatuhan RKHD
Pemerintah Desa Pasir	Pembina LPHD; penyelenggara musyawarah desa	Pengesahan Perdes/SK terkait	Dukungan administrasi; tidak boleh menguasai dana partisipan di luar mekanisme yang disepakati
Project Participants (rumah tangga)	Pelaksana intervensi & penerima manfaat	FPIC; akses GRM; menerima salinan Project Agreement	Mematuhi Land Management Plan
SAMPAN Kalimantan	Project Coordinator (usulan) & fasilitator	Mandat tertulis untuk koordinasi, pengajuan, administrasi registry & penjualan **sejauh diberikan** dalam perjanjian	13 fungsi PR §2.2; audit keuangan; pelaporan tahunan
Konsultan teknis	GIS, karbon, hukum, safeguard	—	Kualitas & independensi data
Pendana	Pembiayaan pengembangan	Hak sesuai kontrak (tidak boleh melampaui hak partisipan)	Memenuhi syarat kontrak
Calon pembeli	Pembelian PVC	Hak atas PVC setelah transfer di registry	Klaim sesuai aturan (retire hanya vPVC)
Plan Vivo	Pemilik standar	Review PIN/PDD, keputusan registrasi, suspend	Sesuai Procedures Manual
VVB/IE	Auditor	Menerbitkan temuan	Independen
S&P Global	Penyedia registry	Due diligence akun	Mencatat issuance/transfer/retirement
Kementerian/ Dinas/KPH/BPSKL	Regulator	Persetujuan/registrasi/otorisasi	—

13.4 RACI Matrix (R=Responsible, A=Accountable, C=Consulted, I=Informed)

Aktivitas	LPHD	Pemdes	Partisipan	SAMPAN	Konsultan	Pemerintah	Plan Vivo
Keputusan memulai proyek (FPIC i)	A/R	C	R (memutuskan)	C (memfasilitasi)	I	I	I
Penetapan Project Coordinator & PKS	A	C	C	R	C (hukum)	I	I
Data spasial & tenurial	C	C	C	A	R	C	—
Penyusunan PIN	C	I	C	A/R	R	I	—
Submission PIN & korespondensi	C	I	I	A/R	—	—	R (review)
Notifikasi otoritas	R (co-sign)	C	I	A/R	—	I	—
Desain intervensi (partisipatif)	R	C	R	A	C	C	—
Benefit Sharing Mechanism	A (persetujuan)	C	R (masukan)	R (draf)	C	C	I
Project Agreement	A	C	R	R	C	—	I
Carbon accounting & PDD	C	I	I	A	R	—	—
Monitoring lapangan	R	I	R	A	C	—	—
Pengelolaan registry & penjualan	C (persetujuan tata kelola)	I	I	A/R	—	C (otorisasi)	I
Distribusi pendapatan	A/R (penerima atas nama desa — **usulan**)	C	I	R (penyalur)	—	—	I
Audit keuangan	C	I	I (public audit)	A	R (auditor)	—	I
GRM	R	C	—	A	—	—	I

13.5 Required Legal Documentation Matrix

Dokumen	Para pihak	Isi kunci	Kapan
BA Musyawarah LPHD/Desa — keputusan mempertimbangkan proyek (FPIC i)	LPHD, warga	Persetujuan mempertimbangkan; mandat menjajaki	Sebelum PIN
Perjanjian Kerja Sama / MoU LPHD–SAMPAN	LPHD, SAMPAN (diketahui Kades)	Peran, ruang lingkup, **tidak ada pengalihan hak kelola**, hak & batas SAMPAN mewakili, kerahasiaan data, exit/termination, penyelesaian sengketa, larangan menjual tanpa persetujuan tata kelola	Sebelum PIN
Surat Kuasa/Mandat khusus pengajuan PIN	LPHD → SAMPAN	Kewenangan mengajukan PIN & korespondensi	Sebelum PIN
Pernyataan persetujuan Project Coordinator (Annex 2)	PC	Bila pemohon ≠ PC	PIN
Bukti registrasi SAMPAN sebagai "mitra atau pendamping teregistrasi"	SAMPAN – Kementerian Kehutanan	Wajib untuk pemegang PS yang berdagang karbon (Permenhut 6/2026 Ps. 6(2), 13(1)(b))	Dimulai pra-PIN; wajib sebelum pencatatan DPP
Pencatatan DPP & persetujuan Menhut penerbitan non-SPE GRK	LPHD/SAMPAN – Kemenhut	Permenhut 6/2026 Ps. 20–24 (persetujuan berlaku 6 bulan)	PDD → pra-issuance

Dokumen	Para pihak	Isi kunci	Kapan
Surat pemberitahuan ke otoritas	SAMPAN/LPHD → instansi	Intervensi & perkiraan manfaat karbon	PIN (Annex 5) & PDD (Annex 15)
Dokumen registrasi/izin karbon nasional (SRN-PPI dll.)	Pemegang PS/pengembang	Sesuai regulasi berlaku	Lihat Vol. I Bab 5
Project Agreement(s)	PC – Project Participants/ LPHD	Wajib PR §3.18: estimasi karbon tahunan setelah buffer, hak PC menjual PVC atas nama partisipan, larangan kredit ganda, tidak mengurangi hak lahan, bahasa pilihan, GRM, durasi	PDD
Benefit Sharing Mechanism (draf & final)	Disepakati partisipan	≥60% ke partisipan & local stakeholders	PDD
MoU dengan instansi penegak hukum (bila patroli didukung pemerintah)	PC – instansi	Rujukan safeguard Plan Vivo	PDD (PR §3.9.9)
MoU Plan Vivo	PC – Plan Vivo	Kewajiban registrasi	Setelah validasi
Akun registry S&P Global	PC	KYC	Setelah registrasi
ERPA/Offtake	PC (atas mandat) – pembeli	Lihat Vol. IV	Setelah syarat hukum terpenuhi

13.6 Governance Risk Assessment

Risiko	Likelihood	Dampak	Mitigasi
Ambiguitas siapa pemilik hak menjual PVC	Tinggi	Tinggi	PKS + Project Agreement + kajian hukum; konfirmasi Plan Vivo
Elite capture di LPHD/desa	Sedang	Tinggi	Representasi perempuan & rentan di SC; public audit tahunan (Toolkit Tool 16); rekening terpisah
Pergantian kepala desa/pengurus LPHD	Sedang	Sedang	Perjanjian mengikat kelembagaan, bukan individu; Perdes
Ketergantungan pada SAMPAN	Sedang	Tinggi	Rencana penguatan kapasitas & exit/handover
Konflik kepentingan fasilitator–pengembang	Sedang	Sedang	Transparansi biaya koordinasi (≤40%) dan fee SAMPAN
Ketidakpatuhan regulasi PS (mis. kerja sama tanpa persetujuan yang disyaratkan)	**[PRR]**	Tinggi	Konsultasi BPSKL/Dinas sebelum menandatangani

13.7 Prosedur pengambilan keputusan (usulan)

1. Keputusan strategis (lanjut/tidak, penetapan PC, persetujuan PIN/PDD, Benefit Sharing, kontrak penjualan): **Musyawarah LPHD/Desa** dengan kuorum dan keterwakilan perempuan minimal yang disepakati; dicatat dalam BA.
2. Keputusan operasional: Steering Committee (rapat triwulanan).
3. Keputusan teknis harian: Project Coordinator, dilaporkan ke SC.
4. Semua kontrak penjualan wajib persetujuan SC + BA musyawarah sebelum ditandatangani.

Bab 14 — FPIC and Safeguards

14.1 FPIC Requirement Matrix [CR — PR §2.6]

Persyaratan	Isi	Kapan	Bukti
2.6.1	Proses yang memungkinkan negosiasi syarat desain, implementasi, monitoring, evaluasi	Seluruh siklus	Rencana FPIC, notulen negosiasi
2.6.2	Memenuhi/melampaui hukum nasional & standar internasional (UNDRIP, ILO 169 bila relevan)	Desain proses	Analisis hukum FPIC
2.6.3	Proses & timeline ditentukan pemegang hak; wakil dipilih sendiri; libatkan perempuan & rentan	Sebelum tahap i	BA penetapan proses & wakil
2.6.4	Keputusan kolektif memberi/menolak consent pada: (i) mempertimbangkan; (ii) terlibat desain; (iii) implementasi	i: pra-PIN (ditanya Annex 4 §C); ii: awal desain; iii: sebelum Project Agreement/PDD	BA keputusan tiap tahap
2.6.5	Consent sebelum kegiatan & dikonfirmasi ulang berkala	Berkala (mis. tiap verifikasi & ekspansi)	Jadwal re-konfirmasi
2.6.6	Informasi akurat, tepat waktu, cukup, sesuai budaya, termasuk risiko & dampak negatif	Sebelum tiap keputusan	Materi info (Bahasa Indonesia/lokal), bukti distribusi
2.6.7	Isu consent dapat diangkat kapan saja lewat GRM	Sepanjang proyek	Prosedur GRM

Pembedaan consent [CR+RP]: consent tahap (i) **tidak** sama dengan consent untuk implementasi, apalagi untuk kontrak penjualan. Consent untuk Project Agreement (PR §3.18.1) dan untuk Benefit Sharing (PR §3.16.1) adalah keputusan tersendiri.

14.2 Pre-PIN Safeguard Checklist

- [ ] Stakeholder analysis (Tool 1) selesai — PR 2.1.1.
- [ ] Identifikasi masyarakat adat/lokal pemegang hak + struktur keputusan + keterlibatan perempuan — PR 2.1.2.
- [ ] Daftar sengketa lahan/sumber daya masa lalu & berjalan — PR 2.1.3.
- [ ] Kerangka Stakeholder Engagement Plan (boleh draf) — PR 2.5.1.
- [ ] Semua stakeholder telah diberi informasi proyek dalam format mudah diakses — PR 2.5.2.
- [ ] Analisis persyaratan FPIC nasional & internasional.
- [ ] Wakil pemegang hak teridentifikasi; proses & timeline keputusan dipahami.
- [ ] Consent tahap (i) terdokumentasi.
- [ ] Status GRM (ada/akan dibentuk) dideskripsikan.
- [ ] Exclusion List & kuesioner E&S Section B terisi.

14.3 Stakeholder Consultation Documentation Checklist

Untuk setiap pertemuan: undangan (tanggal kirim); agenda; materi (bahasa); daftar hadir **terpilah gender/usia/kelompok** (dengan persetujuan penggunaan data); notulen (pertanyaan, kekhawatiran, jawaban); keputusan; foto (dengan izin); tindak lanjut & bukti umpan balik ke peserta; tanda tangan notulis & perwakilan peserta; penyimpanan di folder 05_Konsultasi (Vol. V Bab 26).

14.4 GRM Preparation Checklist [CR — PR §3.17]

- [ ] Kanal yang mudah diakses (kotak aduan, nomor WA, petugas desa, melalui perempuan pendamping).
- [ ] Sesuai budaya; bisa anonim.
- [ ] Mencakup insiden sosial, lingkungan, budaya, ketidakpatuhan Project Agreement, isu consent.
- [ ] Registrasi & dokumentasi setiap keluhan; tenggat respons.

Penyelesaian berjenjang: musyawarah para pihak → SC → **arbiter independen** yang diidentifikasi (wajib 3.17.3).
Dicantumkan di setiap Project Agreement (3.17.4, 3.18.8).
Dilaporkan di Annual Report (PR 4.9.3).
Rujukan ke mekanisme keluhan Plan Vivo (laman governance) untuk keberatan terhadap Plan Vivo.

14.5 Community Benefit-Sharing Preparation Matrix [CR — PR §3.16]

Elemen wajib	Pertanyaan yang harus dijawab partisipan	Bukti
≥60% pendapatan PVC (setelah pungutan/pajak negara) langsung bermanfaat bagi partisipan & local stakeholders (boleh <60% per issuance asalkan total periode kredit ≥60%)	Berapa porsi tunai vs program kolektif vs in-kind?	Draf BSM v1, v2, final
Proporsi untuk partisipan, PC, pihak lain (pemerintah, mitra teknis)	Berapa untuk biaya koordinasi & MRV (pedoman ≤40%)?	Tabel alokasi
Bagaimana & kapan manfaat diterima	Jadwal, mekanisme pembayaran, rekening	SOP penyaluran
Dependensi & target progress indicators, konsekuensi bila target tak tercapai	Aturan bila patroli tidak berjalan dll.	Lampiran Project Agreement
Proses iteratif: draf & final dibagikan; bukti umpan balik ditanggapi	—	Notulen + matriks umpan balik
Konsisten dengan hukum nasional	Apakah ada ketentuan pembagian manfaat/PNBP/pajak?	Vol. I Bab 5

14.6 Social Safeguard Action Plan (ringkas)

No	Aksi	Tahap	PIC	Output
1	Stakeholder analysis & social mapping	Pra-PIN	SAMPAN	Laporan
2	FPIC tahap (i)	Pra-PIN	LPHD+SAMPAN	BA
3	Kuesioner E&S Annex 4	PIN	SAMPAN	Annex 4
4	E&S Assessment (tailored ESA; ESIA bila high risk)	PDD	Konsultan safeguard	Annex 10 PDD
5	ESMP (bila moderate risk) + Stakeholder Engagement Plan + GRM	PDD	SAMPAN	Annex PDD
6	FPIC tahap (ii) & (iii)	PDD	LPHD+SAMPAN	BA
7	BSM iteratif	PDD	SC	BSM final
8	Monitoring indikator livelihood/ekosistem ≥ tiap 5 tahun	Implementasi	LPHD+SAMPAN	Annual Report

---

Bab 15 — PIN-to-PDD Development

15.1 Struktur PDD Template V5.7 [CR]

General Information (Project Interventions; Management Rights) → Stakeholder Engagement (Stakeholder Analysis; Coordination; Participants; Participatory Design; Consultation; FPIC) → Project Design: Baselines (Baseline Scenario; Carbon; Livelihood; Ecosystem), Theory of Change (Project Logic), Technical Specification (Activities; Additionality; Carbon Benefits), Risk Management (E&S Safeguards; Achievement; Reversal; Leakage; Double Counting), Agreements (Land Management Plans; Crediting Period; Benefit Sharing; Grievance; Project Agreements) → Monitoring & Reporting (Indicators; Monitoring Plan; Progress/Carbon/Livelihood-Ecosystem Monitoring; Annual Report; Record Keeping) → Governance & Administration (Governance; Equal Opportunities; Legal Compliance; Financial Plan; Financial Management) → **17 Annex** (Boundaries; Registration Certificate & Partner Agreements; Initial Project Areas; Participatory Design; Initial FPIC; **Carbon Calculations Spreadsheet**; Technical Specifications;

Exclusion List; E&S Screening Report; **E&S Assessment Report**; Land Management Plans; Project Agreements; Monitoring Plan; Project Database; **Authority Engagement and Approvals**; Financial Plan; AI Disclosure).

15.2 PIN-to-PDD Gap Analysis

Area teknis	Kebutuhan PIN	Kebutuhan PDD	Studi tambahan	Bukti	Tim
Batas proyek	Peta indikatif	Batas final, KML publik	Delineasi lapangan + GPS	SHP/KML, BA batas	GIS
GIS & tutupan lahan	Indikatif	Analisis sesuai PT002/PU001 (reference region, reference period, akurasi peta)	Klasifikasi multi-waktu + uji akurasi	Peta, matriks akurasi	GIS/karbon
Baseline scenario	Naratif	Per Project Area mengikuti metodologi	Analisis driver	Laporan	Karbon/sosial
Carbon baseline & benefits	Kualitatif/orde besaran	Estimasi tahunan sepanjang Project Period, setelah leakage, uncertainty, buffer	Inventarisasi plot, faktor emisi	Spreadsheet (Annex 6)	Karbon
Additionality	Barrier analysis awal	Barrier + **Regulatory Surplus** per intervensi	Kajian hukum PS	Analisis	Hukum/karbon
Leakage	—	PU004 (estimasi langsung atau diskon)	Identifikasi leakage area	Peta	Karbon
Permanence / reversal	—	Risiko ≥50 th; mitigasi; buffer 20%	Analisis risiko (kebakaran, banjir/kekeringan, kebijakan)	Matriks risiko	Karbon/safeguard
Double counting	Identifikasi awal	Bukti tidak ada overlap; status pelaporan di program pemerintah	Cek registri	Surat/registri	Hukum
Technical Specification	—	Per intervensi: aktivitas, input, Carbon Indicators	—	Annex 7	Karbon
Land Management Plans	—	Per partisipan/kelompok	Pemetaan partisipatif	Annex 11	Sosial
Project Agreements	—	Ditandatangani setelah FPIC iii	—	Annex 12	Hukum/sosial
Benefit Sharing	Disinggung	Mekanisme final + bukti iterasi	Konsultasi	BSM	SC
Safeguards	Screening	ESA (+ESMP), SEP, GRM	ESA	Annex 9–10	Safeguard
Monitoring plan	—	Semua indikator (progress, karbon, livelihood, ekosistem)	—	Annex 13	Semua
Keuangan	Sumber dana pengembangan	Biaya penuh implementasi & mitigasi risiko, konsisten dengan BSM	Model finansial	Annex 16	Keuangan
Legal	Notifikasi	Bukti diinformasikan + persetujuan bila diwajibkan	Proses perizinan nasional	Annex 15	Hukum

15.3 Studi yang harus dimulai lebih awal (critical path)

1. Analisis tutupan lahan historis & reference region (menentukan eligibilitas PT002).
2. Klarifikasi hukum hak karbon/otorisasi (menentukan siapa boleh menjual).
3. Inventarisasi biomassa (musim, akses pasang-surut).
4. FPIC berlapis & BSM iteratif (butuh beberapa siklus musyawarah).
5. Klarifikasi perlakuan emisi tanah gambut dengan Plan Vivo (bila areal bergambut).

Bab 16 — Validation and Certification

16.1 Urutan formal (Macroscale = ≥10.000 tCO2e/th wajib VVB; Microscale <10.000 tCO2e/th boleh jalur IE) [CR — PM §4–6; V&V Req §1]

> Catatan: dokumen resmi memakai ambang yang sedikit berbeda (PM: "less than 10,000"; CF: "less than or equal to 10,000 PVCs"; V&V Req: "≥10,000 = macroscale") — konfirmasi bila estimasi mendekati ambang **[OCR]**.

Tahap	Persyaratan	Lead	Reviewer independen	Deliverable	Gate	Durasi indikatif
1. Pemilihan metodologi	Semua metodologi harus **approved** sebelum PDD	PC	—	—	—	—
2. PDD submission	Template V5.7; email; bayar fee PDD review + V&V coordination; hanya untuk proyek pipeline	PC	—	PDD + annex	Pembayaran	—
3. PDD screening	Kelengkapan & konsistensi; CAR/NIR; resubmit ≤6 bln; maks 3 putaran	Plan Vivo	—	Screening report	CAR ditutup	6 mg + 4 mg/putaran
4. Konsultasi publik	PDD dipublikasikan 4 minggu	Plan Vivo	Publik	Feedback	—	4 mg
5a. PDD review (macro)	Review terhadap PR + review teknis ahli metodologi	Plan Vivo	Ahli metodologi	PDD review report	CAR/NIR ditutup saat validasi	8 mg
5b. Validasi (macro)	Kontrak VVB approved → VVB tanda tangan ToR → audit plan disetujui Plan Vivo → site visit (setelah konsultasi publik selesai) → CAR/NIR/FAR (maks 3 FAR) → laporan disetujui Plan Vivo	PC + VVB	**VVB**	Validation report	Approval Plan Vivo	Tergantung VVB
5′. Validasi (micro)	Review PDD (8 mg) + review teknis → ToR IE → proposal site visit disetujui → kontrak IE → site visit → laporan ≤1 tahun setelah site visit	Plan Vivo + IE	**IE**	Validation report	Approval Plan Vivo	8+5+4+4 mg (tanpa waktu respons)
6. Registrasi	**MoU** dengan Plan Vivo → **registration certificate** + nomor registrasi unik → publikasi PDD/validation report/KML	PC	—	Sertifikat	MoU	—
7. Registry account	Akun koordinator (due diligence S&P Global) → akun proyek (PDD approved, validation report, registration certificate)	PC	S&P Global	Akun	KYC	—
8. Annual Report pertama	Mulai dari Start Date, berakhir ≤12 bln setelah registrasi; kemudian tiap 12 bln, berkesinambungan	PC	Plan Vivo review	AR + permintaan issuance	Approval AR	4 mg + 2 mg
9. Verifikasi	≤5 tahun setelah validasi; periode verifikasi ≤5 th	PC + VVB/IE	VVB/IE	Verification report	Approval Plan Vivo	Tergantung VVB
10. Kepatuhan berkelanjutan	Update PDD (baseline/logic/techspec ≤10 th; additionality & double counting ≤5 th)	PC	Plan Vivo	PDD update	—	—

Batas waktu kritis [CR]: PDD ≤3 th setelah PIN approval; validasi ≤3 th setelah PDD submission; Start Date ≤5 th sebelum selesainya validasi.

Label CCP/CORSIA [CR]: hanya untuk vPVC, wajib verifikasi oleh **VVB** (jalur microscale IE tidak eligible), dan Project Period ≥40 tahun dengan metodologi yang disetujui CCP.

Bab 17 — Monitoring and Verification

Aspek	Persyaratan [CR]	Implikasi Pasir
Progress Indicators	SMART; target & corrective action; ringkasan di setiap AR	Mis. jumlah patroli, luas restorasi, survival
Carbon Indicators	Sesuai metodologi; dimonitor sepanjang crediting period	Peta tutupan berkala; plot
Livelihood & Ecosystem Indicators	≥ tiap 5 th; terpilah gender; terkait SDGs	Survei rumah tangga sampel
Annual Report	Tiap 12 bln, diajukan ≤12 bln setelah akhir periode; terlambat → fee USD 100; >24 bln → suspend	Siapkan kapasitas pelaporan
Record keeping	Database Project Agreement, LMP, lokasi, monitoring, PVC; dapat diakses verifier	Sistem dokumen Vol. V Bab 26
Audit keuangan	Tahunan oleh auditor independen bersertifikat, ≤12 bln setelah tahun buku	Anggarkan biaya KAP
Verifikasi	≤ tiap 5 th; final verification di akhir crediting period	Siklus biaya VVB/IE

Bab 18 — Registry and Credit Issuance

18.1 Apa itu PVC [CR — PM §14]


Satu PVC merepresentasikan Carbon Benefit 1 tCO2e (tCO2e adalah satuan metodologi). Tiga jenis:

Jenis	Kapan diterbitkan	Dapat dialokasikan ke pembeli?	Dapat di-retire?	CCP/CORSIA?	Relevansi Pasir
fPVC (future)	Saat validasi / saat AR menunjukkan areal ditambahkan; **hanya untuk intervensi removal**	Ya	**Tidak**	Tidak	Hanya untuk komponen restorasi; **tidak** untuk protection/REDD
rPVC (reported)	Saat AR menunjukkan Carbon Benefit tercapai (belum diverifikasi)	Ya	**Tidak**	Tidak	Jalur pendanaan awal untuk protection
vPVC (verified)	Setelah verifikasi	Ya	**Ya**	Ya (dengan syarat)	Unit akhir untuk klaim offset

18.2 Pengurangan wajib [CR]

- fPVC/rPVC: maksimal **90%** dari Carbon Benefit yang diharapkan (10% **Achievement Reserve**), lalu **20% Future Risk Buffer**.
- vPVC: **20%** ke **Risk Buffer** gabungan.
- Contoh ilustratif (bukan proyeksi Pasir): 1.000 tCO2e terverifikasi → 800 vPVC ke akun proyek, 200 ke Risk Buffer.

18.3 Siklus hidup kredit



18.4 Jawaban pertanyaan registry

Pertanyaan	Jawaban	Dasar
Sistem registri	PV Climate Registry oleh **S&P Global**	PM §6, §6.2 [CR]
Pemegang akun	Project Coordinator (akun koordinator → akun proyek); reseller dapat membuka akun (fee USD 800 + 800/th)	PM §6.2; CF [CR]
Siapa meminta issuance	Proyek, melalui permintaan issuance bersama AR/verification report; ditinjau Plan Vivo & S&P Global	PM §7, §15.8 [CR]
Identifikasi	Nomor seri unik	PM §6.2 [CR]
Transfer	Perpindahan kepemilikan manfaat antar pemegang akun di registry	PM Definitions [CR]
Retirement	Inaktivasi permanen vPVC untuk klaim	PM Definitions [CR]
Pencegahan double issuance/counting	Nomor seri; larangan overlap (PR 3.13); larangan terdaftar di program lain (PR 3.13.5; PM §7); cancellation sebelum pindah registri; CA untuk Article 6/CORSIA	[CR]
Ex-ante	fPVC (removal saja) & rPVC (belum diverifikasi) diizinkan; tidak bisa di-retire	PM §14 [CR]
Biaya	Issuance **USD 0,40/PVC** (≤50.000 PVC/proyek/tahun), USD 0,35 di atasnya; konversi gratis; biaya akun koordinator S&P Global **[OCR — tidak tercantum di dokumen Plan Vivo]**	CF [CR]
Sertifikasi = unit?	**Tidak.** Registrasi tidak otomatis menghasilkan unit; issuance memerlukan AR/verifikasi dan permintaan issuance	PM §6–7 [CR]
Issuance ≠ penjualan	Issuance mencatat unit di akun proyek; penjualan adalah transaksi komersial + transfer di registry	[CR]
Corresponding Adjustment	Untuk Article 6.2/CORSIA/klaim yang butuh otorisasi: attestation otorisasi dari *national focal point* + Letter of CA Risk Acknowledgement; label CA	PM §15.7; PR 3.13.3 [CR]
Pindah registri	Diizinkan bila diwajibkan hukum lokal; PVC dibatalkan dulu di PV Climate Registry	PM §15.6 [CR] — relevan untuk regulasi Indonesia (Vol. I Bab 5)

VOLUME IV — COMMERCIAL AND FINANCIAL DEVELOPMENT

Pasir Village Forest Community Carbon Project · Tanggal acuan: 20 Oktober 2026 Kode: **[CR]** Confirmed Requirement · **[RP]** Recommended Practice · **[PSA]** Project-Specific Assumption · **[OCR]** Official Clarification Required · **[PRR]** Potential Regulatory Risk

Kurs perencanaan: Rp17.930 per USD — JISDOR Bank Indonesia 13 Oktober 2026 sebagaimana dilaporkan media (sumber sekunder; angka resmi untuk 14–20 Oktober tidak ditemukan). **Wajib** diperbarui dari https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/jisdor/ pada saat pembayaran. Semua konversi dibulatkan.

Bab 19 — Project Development Costs

19.1 Fee resmi Plan Vivo (proyek penerbit PVC) [CR — *PV Climate – Costs & Fees*]

Komponen biaya	Fee resmi / estimasi	Mata uang	Setara IDR	Tahap pembayaran	Penanggung	Klasifikasi	Sumber
PIN review	1,000	USD	17.930.000	Saat submission PIN	Project Coordinator	Official Confirmed Fee	CF §1.1; PM §2.2
PIN review ulang (>3 putaran / >6 bulan / pipeline kedaluwarsa)	1,000 (fee PIN review tambahan)	USD	17.930.000	Bila terjadi	PC	Official Confirmed Fee	PM §2.2
PDD review — macroscale	1,500	USD	26.895.000	Saat submission PDD	PC	Official Confirmed Fee	CF
PDD review — microscale	3,000	USD	53.790.000	Saat submission PDD	PC	Official Confirmed Fee	CF
Validation & Verification coordination — macroscale	1,000	USD	17.930.000	Per validasi & per verifikasi	PC	Official Confirmed Fee	CF; PM §4.1, §8
Validation & Verification coordination — microscale	2,000	USD	35.860.000	Per validasi & per verifikasi	PC	Official Confirmed Fee	CF
Additional Technical Specification review	500	USD	8.965.000	Bila menambah tech spec	PC	Official Confirmed Fee	CF
PDD/Tech Spec update	Variabel	USD	—	Bila update	PC	Not Yet Confirmed	CF
Annual Report	Gratis (proyek penerbit)	—	0	Tahunan	—	Official Confirmed Fee	PM §7
Late Annual Report (>12 bulan terlambat)	100	USD	1.793.000	Bila terlambat	PC	Official Confirmed Fee	CF
Issuance	0,40/PVC (≤50.000 PVC/proyek/tahun); 0,35/PVC di atasnya	USD	7.172 / 6.276 per PVC	Saat issuance	PC (dari pendapatan)	Official Confirmed Fee	CF

Komponen biaya	Fee resmi / estimasi	Mata uang	Setara IDR	Tahap pembayaran	Penanggung	Klasifikasi	Sumber
Konversi fPVC/rPVC→vPVC	Gratis	—	0	—	—	Official Confirmed Fee	CF
Methodology concept note review	350	USD	6.275.500	Bila mengembangkan metodologi	Developer metodologi	Official Confirmed Fee	CF
Methodology assessment	Variabel + biaya panel MAP	USD	—	—	Developer	Third-Party Quotation Required	CF; PM §3.2
Registrasi VVB / IE di Plan Vivo	500 (VVB) / 100 (IE)	USD	8.965.000 / 1.793.000	Dibayar auditor bila belum terdaftar **[OCR siapa menanggung]**	VVB/IE (dapat dibebankan ke proyek)	Official Confirmed Fee	CF
Akun reseller di registry	800 sekali + 800/tahun	USD	14.344.000 + 14.344.000/th	Hanya bila menjadi reseller	Reseller	Official Confirmed Fee	CF
VAT	20% untuk organisasi UK; organisasi internasional "typically exempt"	—	—	—	—	OCR untuk SAMPAN	CF
Akun Project Coordinator di PV Climate Registry (S&P Global)	Tidak tercantum di dokumen Plan Vivo	—	—	Setelah registrasi	PC	Not Yet Confirmed	PM §6.2

Total fee Plan Vivo sampai registrasi [CR]: microscale USD 6,000 (Rp107.580.000) = PIN 1,000 + PDD 3,000 + koordinasi V&V 2,000; macroscale USD 3,500 (Rp62.755.000) = PIN 1,000 + PDD 1,500 + koordinasi V&V 1,000. Per verifikasi berikutnya: USD 2,000 (Rp35.860.000) micro / USD 1,000 (Rp17.930.000) macro. Lihat juga Vol. II §9.6.

19.2 Biaya pihak ketiga & nasional

Komponen	Estimasi	Klasifikasi	Catatan
Validasi oleh VVB (macroscale)	—	Third-Party Quotation Required	Minta ≥2 penawaran dari roster VVB Plan Vivo; perhatikan biaya perjalanan ke Mempawah
Validasi/verifikasi microscale — honor & perjalanan IE	—	Third-Party Quotation Required	Ditanggung proyek (PM §5.1)
Verifikasi berkala (≤5 tahun)	—	Third-Party Quotation Required	Berulang sepanjang Project Period
Audit keuangan tahunan (KAP)	—	Third-Party Quotation Required	Wajib PR §5.5.2 setelah ada pendapatan PVC
PNBP karbon per transaksi (Permenhut 6/2026 Ps. 46)	Tarif belum diverifikasi	Not Yet Confirmed	Dikurangkan sebelum perhitungan 60% (PR 3.16.2)
Pajak atas pendapatan penjualan (PPh/PPN)	—	Not Yet Confirmed	Perlu konsultan pajak
Biaya transfer bank internasional	—	Planning Estimate	—

19.3 Biaya pengembangan proyek (Planning Estimate — rentang kasar, wajib diganti penawaran)

> Rentang di bawah adalah **asumsi perencanaan internal** untuk menyusun anggaran awal, **bukan** data pasar terverifikasi. Gunakan hanya untuk memperkirakan kebutuhan dana; ganti dengan penawaran resmi.

Komponen	Rentang perencanaan (IDR)	Tahap	Klasifikasi
Analisis GIS & perubahan tutupan lahan (indikatif PIN)	30–100 juta	Pra-PIN	Planning Estimate
Analisis GIS lengkap sesuai metodologi (reference region, akurasi)	75–250 juta	PDD	Planning Estimate
Studi baseline sosial-ekonomi & livelihood	50–150 juta	Pra-PIN (ringan) / PDD	Planning Estimate
Kajian ekologi (vegetasi & satwa)	40–150 juta	PDD	Planning Estimate
Inventarisasi karbon (plot)	100–400 juta	PDD	Planning Estimate
FPIC & konsultasi (3 tahap + BSM iteratif)	75–250 juta	Pra-PIN → PDD	Planning Estimate
E&S Assessment + ESMP	50–200 juta	PDD	Planning Estimate
Kajian & dokumentasi hukum (PKS, Project Agreement, regulasi)	40–150 juta	Pra-PIN → PDD	Planning Estimate
Penyusunan PIN (staf/konsultan, terjemahan)	30–100 juta	PIN	Planning Estimate
Penyusunan PDD & carbon calculations	150–500 juta	PDD	Planning Estimate
Pencatatan DPP nasional & registrasi pendamping	Belum diketahui	PDD	Not Yet Confirmed
MRV tahunan (patroli, monitoring, AR)	Belum diketahui	Implementasi	Planning Estimate (disusun dari desain)
Implementasi intervensi	Belum diketahui	Implementasi	Planning Estimate (dari Technical Specification)

19.4 Skenario anggaran indikatif per fase

Fase	Komponen resmi Plan Vivo (USD)	Komponen pengembangan (rentang perencanaan, IDR)	Total indikatif (IDR)
Persiapan awal + PIN	PIN review 1,000 (≈17,9 jt)	GIS indikatif, sosial ringan, FPIC tahap i, legal awal, penyusunan PIN: ≈ 225–750 jt	≈ 0,24–0,77 miliar
PDD → validasi (microscale)	PDD 3,000 + koordinasi V&V 2,000 = 5,000 (≈89,7 jt) + IE (quotation)	GIS lengkap, karbon, ekologi, ESA, FPIC lanjutan, PDD: ≈ 0,5–1,8 miliar	≈ 0,6–1,9 miliar + IE
PDD → validasi (macroscale)	PDD 1,500 + koordinasi V&V 1,000 = 2,500 (≈44,8 jt) + VVB (quotation)	sama	≈ 0,55–1,85 miliar + VVB
Issuance pertama	0,40/PVC; verifikasi: koordinasi 1,000/2,000 + VVB/IE	MRV, audit, pelaporan nasional, PNBP	Tergantung volume

Implikasi: total biaya hingga validasi kemungkinan berada pada orde **ratusan juta hingga ~2 miliar rupiah** (asumsi) — keputusan *go/no-go* harus memakai estimasi Carbon Benefit dari analisis teknis (Vol. III §12.5), bukan asumsi.

Bab 20 — Carbon Financing Options

Opsi	Tahap paling awal	Kelebihan	Risiko / syarat
Hibah (donor, filantropi, dana iklim, CSR)	Sekarang	Tidak membebani PVC	Persaingan; jangan mengikat hak PVC tanpa FPIC
Dana internal SAMPAN	Sekarang	Cepat	Kapasitas terbatas
Pendanaan pengembangan dari pembeli/investor (pre-financing) dengan hak pertama membeli (ROFR)	Setelah PIN approved (dianjurkan)	Membiayai PDD & validasi	Harus disetujui musyawarah; batasi volume; tidak boleh melanggar larangan pengalihan areal (PP 23/2021 Ps. 212) dan batas modal mitra 50% (Permen LHK 9/2021 Ps. 152(3))
Forward purchase / offtake bersyarat	Setelah PIN; lebih kuat setelah registrasi	Kepastian pasar	Risiko gagal serah; syarat persetujuan Menhut & SRUK
Penjualan rPVC	Setelah registrasi + AR	Arus kas lebih awal (protection tidak bisa fPVC)	rPVC tidak bisa di-retire; pembeli harus menunggu konversi vPVC
Penjualan fPVC (hanya komponen restorasi)	Setelah validasi	Dana awal penanaman	10% Achievement Reserve + 20% Future Risk Buffer; risiko "not delivered"
Penjualan vPVC	Setelah verifikasi	Unit dapat di-retire; label CCP/CORSIA bila memenuhi syarat	Paling lambat
Pembayaran berbasis hasil (RBP) / program pemerintah	Kondisional	—	Risiko double counting; Permenhut 6/2026 Ps. 30(4) melindungi hak pemegang PS

Bab 21 — Carbon Credit Commercialization

21.1 Akses pasar

- **Penjualan langsung** ke pembeli korporasi (dominan untuk proyek komunitas kecil).
- **Broker/reseller** — reseller dapat membuka akun di PV Climate Registry (fee USD 800 + 800/th) [CR]; Plan Vivo menampilkan daftar reseller di https://www.planvivo.org/buy-credits/resellers.
- **Bantuan buyer-matching dari Plan Vivo:** dokumen resmi tidak menjanjikan layanan perjodohan pembeli; Plan Vivo menyatakan tidak menyediakan pendanaan/dukungan teknis selain saran kepatuhan (PM §2.1) **[OCR]**.
- **Bursa karbon (IDXCarbon):** unit harus tercatat di SRUK (POJK 10/2026 — FAQ OJK) [CR — sumber resmi OJK].

21.2 Matriks waktu: apa yang boleh dilakukan pada tiap tahap

Tahap	Penjualan unit terbit (mengikat)	Komitmen forward bersyarat	Pembiayaan	Catatan
Sebelum PIN approved	**Tidak** (tidak ada unit)	Hanya LoI tidak mengikat	Hibah/pre-financing	Jangan klaim "Plan Vivo project"; hindari menjanjikan volume
Setelah PIN approved (pipeline)	**Tidak**	Mungkin (term sheet/ERPA bersyarat)	Pre-financing	Boleh menyebut "Plan Vivo pipeline project"; bukan certified
Pengembangan PDD	**Tidak**	ERPA bersyarat (CP: validasi, persetujuan Menhut, SRUK)	Pre-financing	Volume berdasar estimasi konservatif
Setelah validasi/registrasi	fPVC (restorasi) setelah validasi; **tidak** untuk protection	ERPA	—	Persetujuan Menhut & SRUK **[CR nasional]**

Tahap	Penjualan unit terbit (mengikat)	Komitmen forward bersyarat	Pembiayaan	Catatan
Setelah AR & issuance rPVC	**Ya** (transfer rPVC; tidak bisa di-retire)	—	—	PNBP; SRUK
Setelah verifikasi (vPVC)	**Ya**, termasuk retirement	—	—	CA bila untuk NDC/CORSIA

21.3 Perjanjian komersial — klausul kunci

Instrumen	Klausul wajib/kunci
ERPA / Forward Sale	Conditions precedent (registrasi Plan Vivo, persetujuan Menhut penerbitan, pencatatan SRUK, Otorisasi/CA bila disyaratkan); jenis unit (rPVC/vPVC; label CA/CCP); vintage; volume minimum/maksimum; harga & eskalasi; jadwal serah; **tanpa** kewajiban penggantian yang tak terbatas bagi komunitas; alokasi risiko non-delivery & pembatalan CA (PM §15.7 menempatkan tanggung jawab rekonsiliasi pada PC — alihkan sebagian ke pembeli secara kontraktual); force majeure; hukum yang berlaku & penyelesaian sengketa; anti-korupsi; kewajiban klaim & retirement pembeli; pengungkapan ≥60% benefit sharing
Offtake (multi-tahun)	Sama + prioritas pembelian, mekanisme harga berkala
Prepayment	Penggunaan dana (budget & milestone), pengembalian bila gagal (dibatasi), jaminan yang **tidak** menggunakan areal Hutan Desa
Transfer	Hanya melalui PV Climate Registry (+ SRUK); kepemilikan berpindah saat transfer tercatat
Klaim pembeli	Hanya vPVC dapat di-retire untuk klaim offset; rPVC/fPVC tidak dapat dipakai untuk klaim

21.4 Harga

- **Tidak ada data harga PVC terverifikasi** yang ditemukan dalam riset ini. Jangan memasukkan harga ke proyeksi tanpa bukti transaksi.
- Determinan harga: jenis unit (vPVC > rPVC/fPVC), label (CA, CCP, CORSIA), tipe intervensi (removal vs avoidance), co-benefit komunitas & biodiversitas, rekam jejak proyek, volume, reputasi standar, risiko regulasi negara tuan rumah (persetujuan/CA), vintage.
- Sumber yang perlu dikonsultasikan: laporan Plan Vivo *Perception vs Reality* (laman dokumen), Ecosystem Marketplace, penawaran dari reseller Plan Vivo, dan data transaksi proyek Plan Vivo Indonesia (mis. Bujang Raba) bila dapat diperoleh.
- Model pendapatan harus menyajikan **tiga skenario harga** yang bersumber dari penawaran nyata, dan selalu memotong: buffer (20%), achievement reserve (10% bila rPVC/fPVC), uncertainty deduction metodologi, leakage, PNBP, fee issuance, pajak.


Bab 22 — Carbon Revenue and Benefit Sharing

22.1 Persyaratan yang terverifikasi

Sumber	Ketentuan	Klasifikasi
PR 3.16.2	≥60% pendapatan penjualan PVC, **setelah** pungutan/pajak/fee negara tuan rumah, langsung bermanfaat bagi Project Participants & Local Stakeholders; boleh <60% untuk issuance tertentu asalkan total periode kredit ≥60%	CR
PR 3.16 Guidance	Bila biaya koordinasi, manajemen & MRV >40% pendapatan, PC harus mencari sumber dana lain	CR

Sumber	Ketentuan	Klasifikasi
PR 3.16.1, 3.16.3–3.16.6	BSM iteratif; draf & final dibagikan; proporsi untuk partisipan, PC, pihak lain; bentuk (tunai, pelatihan, in-kind); dependensi & target; ringkasan di Project Agreement	CR
PR 5.5	Prosedur keuangan transparan; audit tahunan independen; rekening terpisah dianjurkan	CR/RP
Permenhut 6/2026 Ps. 12(2)(d), 54, 55	Rencana pembagian manfaat karbon disepakati masyarakat dalam DPP; dilaporkan & dievaluasi	CR
Permen LHK 9/2021 Ps. 152(3)	Modal mitra dalam kerja sama bagi hasil maks. 50% modal pemegang PS	CR — relevansi pada struktur investasi **[PRR]**
Persentase pembagian nasional untuk karbon PS	**Tidak ditemukan** regulasi yang menetapkan persentase	—

22.2 Revenue Distribution Governance Framework (usulan)

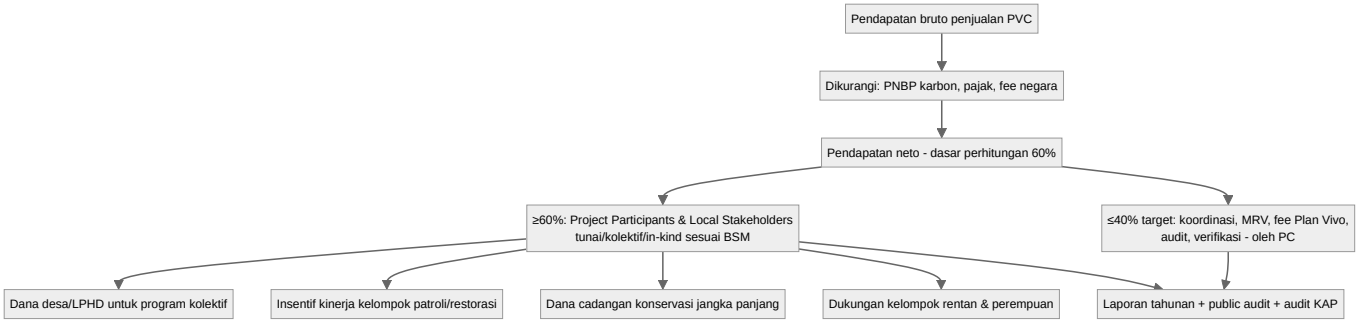

Prinsip: (1) rekening khusus proyek; (2) persetujuan alokasi tahunan oleh musyawarah; (3) public audit tahunan (Toolkit Tool 16); (4) pelaporan di Annual Report & sistem nasional; (5) biaya pengembangan yang telah dibiayai pihak ketiga hanya dapat dikembalikan dari porsi ≤40% atau sesuai kontrak yang disetujui musyawarah dan tetap menjaga ≥60% sepanjang periode kredit.

Alokasi indikatif di atas **bukan** persentase wajib; ditetapkan melalui proses BSM partisipatif.

Bab 23 — Financial and Commercial Risks

23.1 Commercial Risk Matrix

Risiko	Penyebab	Likelihood	Dampak	Mitigasi
Volume kredit kecil	Areal kecil; PT002 tidak applicable; deduction	Tinggi [PSA]	Tinggi	Uji kelayakan teknis sebelum investasi besar; pertimbangkan proyek gabungan (Permenhut Ps. 7)
Regulasi berubah/tertunda	Peraturan pelaksana baru (Perpres 110 Ps. 102)	Sedang	Tinggi	Klausul CP; pemantauan regulasi
Areal tidak eligible perdagangan	Permenhut Ps. 9(1)(a)	Belum diketahui	Kritis	Klarifikasi sebelum PIN
Persetujuan Menhut kedaluwarsa (6 bulan)	Keterlambatan issuance/penjualan	Sedang	Sedang	Sinkronkan jadwal
Otorisasi/CA ditolak/dibatasi	Kebutuhan NDC (Ps. 26)	Sedang	Tinggi untuk pembeli CA	Jual sebagai non-authorised; jangan janjikan CA
Pembatalan CA setelah penjualan	Pelaporan negara	Rendah–Sedang	Tinggi	Alihkan risiko kontraktual; asuransi; tunggu konfirmasi (PM §15.7.1)

Risiko	Penyebab	Likelihood	Dampak	Mitigasi
Gagal serah forward	Underperformance, reversal	Sedang	Tinggi	Volume forward ≤ porsi konservatif; tanpa denda berat bagi komunitas
Reversal (kebakaran, banjir/kekeringan, konversi)	Faktor alam/manusia	Sedang	Tinggi	Mitigasi di project logic; buffer 20%
Harga rendah	Pasar sukarela	Sedang	Tinggi	Pembeli berbasis co-benefit; diversifikasi pendanaan
Biaya > pendapatan	Skala kecil	Tinggi [PSA]	Tinggi	Microscale route; proyek gabungan; hibah
Reputasi (klaim berlebihan)	Komunikasi	Rendah	Tinggi	Pakai status resmi (pipeline ≠ certified)
Kurs	IDR/USD	Sedang	Sedang	Kontrak USD; lindung nilai sederhana

VOLUME V — IMPLEMENTATION MANUAL

Pasir Village Forest Community Carbon Project · Mulai: 20 Oktober 2026 Kode: **[CR]** Confirmed Requirement · **[RP]** Recommended Practice · **[PSA]** Project-Specific Assumption · **[OCR]** Official Clarification Required · **[PRR]** Potential Regulatory Risk

Bab 24 — Complete Project Roadmap

24.1 Implementation matrix

Durasi bertanda **(R)** = durasi resmi/indikatif Plan Vivo (PM §9) atau batas resmi; tanpa tanda = asumsi perencanaan.

Fase	Aktivitas	Prasyarat	Deliverable	PIC	Durasi	Dependensi	Decision gate
0 Persiapan	Koordinasi LPHD, PKS, penetapan PC, registrasi pendamping	—	PKS, BA, bukti registrasi (proses)	SAMPAN + LPHD	1–3 bln	—	G0 mandat
0 Persiapan	Pengumpulan SK, peta, RKPS/RKT, fungsi & blok kawasan	PKS	Dossier legal-spasial	SAMPAN	1–2 bln	Respons instansi	—
1 Pre-PIN	Analisis tutupan & uji applicability PT002/PM001; klasifikasi ekosistem	Peta	Memo metodologi	Konsultan GIS/karbon	1–2 bln	Data citra	G1a jalur metodologi
1 Pre-PIN	Stakeholder analysis; FPIC tahap i; notifikasi otoritas; skrining E&S	PKS	BA FPIC i; Annex 3–5	SAMPAN + LPHD	2–3 bln	Jadwal musyawarah	G1 kesiapan
1 Pre-PIN	Intro call Plan Vivo	Ringkasan proyek	Catatan klarifikasi	SAMPAN	2–6 mgg	Respons Plan Vivo	—
2 PIN	Drafting, QA, persetujuan LPHD, submission	G1	PIN + Annex; bukti fee	SAMPAN	1–2 bln	—	G2–G3
2 PIN	Review & revisi	Submission	PIN review report	Plan Vivo / SAMPAN	6 mgg (R) + 4 mgg/putaran (R); respons ≤6 bln (R); maks 3 putaran (R)	—	G5 approved
3 Pipeline	Publikasi PIN; rencana PDD	Approval	Listing pipeline	Plan Vivo	—	—	Jam 3 tahun dimulai (R)
4 PDD	Inventarisasi karbon, GIS penuh, ESA, FPIC ii–iii, BSM iteratif, Project Agreement, LMP, monitoring plan, DPP nasional	Pipeline + metodologi approved	PDD V5.7 + 17 annex; DPP tercatat	SAMPAN + konsultan + LPHD	9–18 bln	Musim, pendanaan	PDD submit ≤3 th setelah PIN (R)
5 Validasi	Screening, konsultasi publik, review, audit VVB/IE	PDD	Validation report; MoU; registration certificate	Plan Vivo, VVB/IE	Screening 6 mgg (R); konsultasi 4 mgg (R); review 8 mgg (R); audit: tergantung auditor	Ketersediaan auditor	Validasi ≤3 th setelah PDD (R)
5 Validasi	Akun PV Climate Registry; laporan validasi ke kementerian	Registrasi	Akun proyek	SAMPAN	1–3 bln	KYC S&P Global	—

Fase	Aktivitas	Prasyarat	Deliverable	PIC	Durasi	Dependensi	Decision gate
6 Monitoring & issuance	AR pertama (akhir ≤12 bln setelah registrasi (R)); permintaan rPVC; persetujuan Menhut; SRUK	Registrasi	AR; rPVC; persetujuan (6 bln)	SAMPAN + LPHD	AR review 4+2 mgg (R)	Data monitoring	Issuance
6 Monitoring & issuance	Verifikasi pertama ≤5 th setelah validasi (R)	AR	vPVC	VVB/IE	—	—	—
7 Komersialisasi	Buyer engagement, ERPA, transfer, distribusi	Unit terbit + syarat nasional	Kontrak; transfer; laporan BSM	SAMPAN + SC	Berkelanjutan	Pasar	Persetujuan musyawarah

24.2 Tiga skenario (semua tanggal = asumsi perencanaan)

Milestone	Optimistis	Realistis	Konservatif
Submission PIN	Feb 2027	**31 Mar 2027 (target)**	Apr 2027 (batas target) – Q3 2027
PIN approved / pipeline	Mei–Jun 2027 (1 putaran)	**Jul–Sep 2027 (target)**	Q1–Q2 2028 (3 putaran)
Metodologi	PT002 applicable	PT002 dengan penyesuaian strata/areal	PT002 perlu pengumpulan data tambahan/penyesuaian areal; isu gambut berlarut
Submission PDD	Q4 2027	Q3–Q4 2028	2029–Q2 2030 (≤3 th batas)
Validasi & registrasi	Q2–Q3 2028	Q2–Q3 2029	2030–2031
AR pertama & rPVC + persetujuan Menhut + SRUK	Q3 2029	Q3 2030	2031–2032
Penjualan pertama unit terbit	2029	2030	2032
Verifikasi pertama (vPVC)	≤5 th setelah validasi (R)	idem	idem

24.3 Critical path & risiko keterlambatan

Critical path: mandat & PC → fungsi kawasan/blok (Permenhut Ps. 9) → analisis tutupan & metodologi → FPIC i → PIN → (metodologi approved) → inventarisasi karbon & FPIC iii → PDD → validasi → registrasi → AR → persetujuan Menhut → issuance → penjualan. **Risiko keterlambatan utama:** ketidakcocokan PT002 ("effective community management"); ketidakjelasan registrasi pendamping; revisi PIN berulang; pendanaan PDD; ketersediaan VVB/IE; musim hujan/pasang untuk survei; perubahan pengurus LPHD/desa; sistem nasional (SRUK) baru.

Bab 25 — 90-Day Action Plan (20 Oktober 2026 – 18 Januari 2027)

Tujuan: **siap untuk submission PIN yang patuh**, bukan memaksa submission dalam 90 hari.

Minggu	Prioritas	Tugas rinci	PIC	Bukti	Deliverable	Dependensi
1 (20–26 Okt)	Struktur kerja	Bentuk tim inti (PM, GIS, sosial/safeguard, legal); siapkan folder dokumen (Bab 26); unduh & arsipkan dokumen resmi Plan Vivo versi terkini	Direktur SAMPAN	SK tim; folder	Struktur proyek	—
1	Plan Vivo	Kirim email permintaan introductory call (Bab 29)	PM	Email terkirim	—	—

Minggu	Prioritas	Tugas rinci	PIC	Bukti	Deliverable	Dependensi
2 (27 Okt–2 Nov)	Legal-kelembagaan	Rapat LPHD: paparan rencana; minta salinan SK, Perdes LPHD, SK pengurus, RKPS/RKT; draf PKS	PM + Legal	Notulen	Daftar dokumen LPHD	Ketersediaan LPHD
2	Legal	Telaah Permenhut 6/2026 Ps. 6, 9, 13; cari prosedur registrasi pendamping/mitra	Legal	Memo	Memo hukum v1	—
3 (3–9 Nov)	Spasial	Permintaan data ke BPSKL/Dinas LHK/KPH: SHP areal kerja, fungsi & blok kawasan, KHG & kedalaman gambut	GIS	Surat	Data diterima (target)	Respons instansi
3	Sosial	Desain stakeholder analysis & rencana FPIC (bersama LPHD menentukan proses & wakil)	Sosial	Rencana	Rencana FPIC	—
4 (10–16 Nov)	Legal	Finalisasi & tanda tangan PKS LPHD–SAMPAN (melalui musyawarah LPHD; diketahui Kades)	Direktur + LPHD	BA, PKS	**PKS**	Musyawarah
4	Plan Vivo	Intro call (bila dijadwalkan); catat jawaban	PM	Notulen call	Memo klarifikasi	Plan Vivo
5 (17–23 Nov)	Teknis	Analisis tutupan lahan 2010–2026 (indikatif), reference region kandidat	GIS	Peta	Memo applicability PT002	Data
5	Sosial	Pemetaan sosial & sumber daya partisipatif (Tool 9, 10), timeline historis (Tool 7)	Sosial + LPHD	Notulen, peta	Laporan lapangan 1	—
6 (24–30 Nov)	Sosial	Stakeholder analysis tertulis; identifikasi kelompok rentan, klaim adat, konflik	Sosial	Laporan	Stakeholder analysis	Minggu 5
6	Otoritas	Kirim surat pemberitahuan ke Dinas LHK, KPH, BPSKL, Ditjen PS, unit NEK, Pemkab	Direktur	Tanda terima	Annex 5 (bagian)	PKS
7 (1–7 Des)	**Decision gate G1a**	Rapat keputusan jalur metodologi & batas Project Area (incl. Ps. 9 Permenhut)	PM + konsultan	Notulen	Keputusan metodologi	Minggu 5–6
7	FPIC	Distribusi materi informasi (Bahasa Indonesia, ringkas, risiko & manfaat) ≥2 minggu sebelum musyawarah	Sosial	Bukti distribusi	Materi FPIC	Rencana FPIC
8 (8–14 Des)	FPIC	FGD terpisah: perempuan, pemuda, pengguna sumber daya hutan, rentan	Sosial	Notulen, daftar hadir	Catatan FGD	Materi
9 (15–21 Des)	FPIC	**Musyawarah keputusan FPIC tahap (i)**	LPHD (pemimpin), SAMPAN (fasilitator)	BA, daftar hadir terpilah	**BA FPIC i**	FGD
9	E&S	Workshop pengisian Annex 3 & Annex 4 (Section A–C)	Safeguard	Draf	Annex 3–4 v1	—
10 (22–28 Des)	Penulisan	Drafting PIN v0.5 (bagian 1–2)	PM	Draf	PIN v0.5	—
11 (29 Des–4 Jan)	Penulisan	Drafting PIN bagian 3–4; Table 3.8; rencana keuangan	PM + Legal	Draf	PIN v0.8	—
12 (5–11 Jan)	QA	QA internal (Bab 11 Vol. II); reviewer independen internal; terjemahan lampiran	QA lead	Lembar QA	PIN v0.9 + daftar gap	—
13 (12–18 Jan)	**Gate G1/G2**	Rapat kesiapan: cek 13 kriteria; putuskan submit atau tunda; susun rencana penutupan gap	Direktur + LPHD	Notulen	**Keputusan go/no-go**	Semua

25.1 Top 10 critical actions

1. Tandatangani PKS LPHD–SAMPAN dan tetapkan Project Coordinator.
2. Pastikan fungsi kawasan & blok areal Hutan Desa (Permenhut 6/2026 Ps. 9(1)(a)).
3. Mulai registrasi SAMPAN sebagai mitra/pendamping teregistrasi.

4. Peroleh SK Hutan Desa lengkap + peta + RKPS/RKT.
5. Analisis tutupan lahan ≥10 tahun & uji PT002 ("effective community management").
6. Klasifikasi gambut/tanah mineral & cek riwayat rehabilitasi.
7. Intro call & klarifikasi tertulis dengan Plan Vivo.
8. FPIC tahap (i) terdokumentasi.
9. Notifikasi otoritas (Annex 5).
10. Draf PIN + QA.

25.2 Top 10 missing data categories

1. Batas & luas areal Hutan Desa (SHP) dan luas Project Area eligible.
2. Fungsi kawasan (HL/HP) & blok pengelolaan.
3. Tipe ekosistem & tanah (gambut/mineral; kedalaman gambut).
4. Tutupan lahan historis & driver deforestasi/degradasi.
5. Stok karbon per strata.
6. Data demografi & livelihood rumah tangga.
7. Struktur, keanggotaan, kinerja LPHD sejak 2019.
8. Konflik/klaim lahan & keberadaan masyarakat adat.
9. Proyek/program karbon & rehabilitasi lain di areal.
10. Anggaran & sumber dana pengembangan.

25.3 Top 10 risks to PIN readiness

1. Areal tidak eligible (blok perlindungan HL) untuk perdagangan karbon nasional.
2. PT002 tidak applicable (pengelolaan sudah efektif / tidak ada ancaman).
3. Areal bergambut: emisi tanah gambut belum jelas perlakuannya & risiko kebakaran.
4. Mandat LPHD belum jelas / konflik internal.
5. SAMPAN belum teregistrasi sebagai pendamping/mitra.
6. FPIC tahap (i) ditunda/ditolak.
7. Data spasial resmi lambat diperoleh.
8. Kapasitas penulisan PIN berbahasa Inggris.
9. Pendanaan pra-PIN tidak cukup.
10. Perubahan regulasi pelaksana Perpres 110/2025.

25.4 Readiness criteria sebelum submit PIN

Lihat Vol. II §9.8 (13 kriteria).

Bab 26 — Master Document Checklist & Document Control System

26.1 Struktur folder

```
PASIR-PV/
 01_Legal-Kelembagaan/          (akta SAMPAN, SK LPHD, PKS, surat kuasa, registrasi pendamping)
 02_Tenurial-Batas/             (SK Hutan Desa, RKPS/RKT, peta fungsi & blok, BA batas)
 03_GIS-Spasial/                (SHP/KML, citra, peta tutupan, metadata, akurasi)
 04_Metodologi-Teknis/          (memo applicability, data plot, carbon calc, tech spec)
 05_Konsultasi-Stakeholder/     (undangan, notulen, daftar hadir, materi, foto)
 06_FPIC/                       (rencana, materi, BA tahap i/ii/iii, re-konfirmasi)
 07_Safeguards-ES/              (Annex 3–4, ESA, ESMP, SEP, GRM register)
 08_Benefit-Sharing/            (draf BSM, matriks umpan balik, final)
 09_Keuangan-Pendanaan/         (anggaran, hibah, rekening, audit)
 10_PIN/                        (draf, QA, versi submission, review report, respons CAR/NIR)
 11_PDD/                        (draf, annex 1–17, spreadsheet)
 12_Korespondensi-PlanVivo/     (email, notulen call, invoice, bukti bayar)
 13_Review-Persetujuan/         (BA musyawarah, lembar QA, persetujuan SC)
 14_Monitoring-Verifikasi/      (AR, data monitoring, laporan VVB/IE)
 15_Registry-Komersial/         (akun S&P, persetujuan Menhut, SRUK, ERPA, transfer)
 16_Regulasi-Nasional/          (salinan regulasi, DPP, korespondensi kementerian)
 99_Superseded/
```

26.2 Konvensi penamaan file

`PASIR-PV_[Folder]_[JenisDok]_[Deskripsi]_v[Mayor.Minor]_[YYYYMMDD]_[STATUS].[ext]` Contoh: `PASIR-PV_10_PIN_Main_v0.9_20270110_IR.docx`

Kode status: **DR** Draft · **IR** Under Internal Review · **RS** Ready for Submission · **SB** Submitted · **RR** Revision Required · **AC** Accepted · **SS** Superseded (dipindah ke 99_Superseded).

Aturan: versi mayor naik saat submission eksternal; minor untuk revisi internal; file "AC" dan "SB" bersifat read-only; setiap dokumen bukti diberi ID (mis. EV-06-003) yang dirujuk dari PIN/PDD.

26.3 Document Readiness Tracker (template)

ID	Dokumen	Folder	Wajib untuk	PIC	Status	Versi	Tanggal	Bukti/lokasi	Catatan
D-01	Akta & SK Kemenkumham SAMPAN (+EN)	01	PIN Annex 2	Admin	DR	—	—	—	—
D-02	SK.10885/2019 + peta (+EN)	02	PIN 1.3	LPHD	DR	—	—	—	—
D-03	Peta fungsi & blok kawasan	02	Gate legal	GIS	DR	—	—	—	Permenhut Ps. 9
D-04	PKS LPHD–SAMPAN	01	PIN 2.2	Legal	DR	—	—	—	—
D-05	Bukti registrasi pendamping/mitra	01	DPP	Legal	DR	—	—	—	—
D-06	SHP/KML Project Region & Area	03	PIN Annex 1	GIS	DR	—	—	—	—
D-07	Memo applicability metodologi	04	PIN Overview	Karbon	DR	—	—	—	—
D-08	Stakeholder analysis	05	PIN 2.1	Sosial	DR	—	—	—	—
D-09	BA FPIC tahap i	06	PIN 2.5 / Annex 4C	Sosial	DR	—	—	—	—

ID	Dokumen	Folder	Wajib untuk	PIC	Status	Versi	Tanggal	Bukti/lokasi	Catatan
D-10	Annex 3 Exclusion List	07	PIN	Safeguard	DR	—	—	—	—
D-11	Annex 4 E&S Screening	07	PIN	Safeguard	DR	—	—	—	—
D-12	Annex 5 surat ke otoritas + tanda terima	16	PIN	Direktur	DR	—	—	—	—
D-13	Rencana keuangan pengembangan	09	PIN 4.3	Keuangan	DR	—	—	—	—
D-14	PIN utama	10	Submission	PM	DR	—	—	—	—
D-15	Lembar QA PIN	13	Gate G2	QA	DR	—	—	—	—
D-16	BA persetujuan LPHD atas PIN	13	Gate G3	LPHD	DR	—	—	—	—
D-17	Bukti bayar fee PIN	12	Submission	Keuangan	DR	—	—	—	—

Bab 27 — Roles and Responsibilities

Lihat Vol. III Bab 13 (Roles Matrix, RACI, Legal Documentation Matrix). Ringkasan peran tim inti SAMPAN untuk 90 hari: **Direktur** (keputusan, korespondensi resmi), **Project Manager** (koordinasi, penulisan PIN), **GIS Lead**, **Social & Safeguards Lead**, **Legal Lead** (internal/eksternal), **Finance Officer**, **QA Lead** (tidak menulis PIN). LPHD menunjuk **2–3 focal point** termasuk minimal satu perempuan **[RP]**.

Bab 28 — Project Readiness Dashboard (per 20/10/2026)

Domain	Skor (0–3)	Status	Tindakan berikut
Kelembagaan & mandat	1	PKS dalam persiapan	Tanda tangan PKS (Mg 4)
Legal hak kelola	1	Nomor SK diketahui	Dossier SK (Mg 2–3)
Legal perdagangan karbon nasional	0	Belum dikaji terhadap Permenhut 6/2026	Memo hukum (Mg 2)
Spasial	0	—	Permintaan data (Mg 3)
Metodologi	0	Kandidat PT002	Gate G1a (Mg 7)
Stakeholder & FPIC	1	Konsultasi awal	FPIC i (Mg 9)
Safeguards	0	—	Annex 3–4 (Mg 9)
Otoritas	0	—	Surat (Mg 6)
Keuangan	0	—	Anggaran (Mg 11)
PIN drafting	0	Struktur kerja tersedia (Lampiran A)	v0.9 (Mg 12)

Skor: 0 belum mulai · 1 dimulai · 2 sebagian besar siap · 3 siap/terbukti. **PIN submission hanya bila semua domain ≥2 dan legal-karbon, metodologi, FPIC = 3.**

Bab 29 — Official Clarifications Required

29.1 Pertanyaan prioritas untuk Plan Vivo (belum terjawab oleh dokumen resmi)

1. **Struktur Project Coordinator:** Apakah dapat diterima bila SAMPAN Kalimantan (NGO berbadan hukum) menjadi Project Coordinator atas mandat LPHD Pasir, dengan LPHD sebagai wakil kolektif

Project Participants dan satu Project Agreement kolektif (selain/atau alih-alih perjanjian per rumah tangga)?
2. **PT002 & Hutan Desa berizin:** Bagaimana Plan Vivo menilai pengecualian "baseline includes effective community management" untuk Hutan Desa yang memperoleh persetujuan pada 2019? Bukti apa yang diharapkan pada tahap PIN?
3. **Hutan rawa gambut (bila relevan):** Bila areal mencakup hutan rawa gambut, apakah PT002 dapat diterapkan dengan hanya mengkreditkan biomassa, dan bagaimana emisi tanah gambut (oksidasi/kebakaran) harus diperlakukan — dikecualikan secara konservatif atau wajib dikuantifikasi?
4. **Gambut:** Bagaimana emisi dari tanah gambut diperlakukan bila areal mencakup gambut tetapi proyek tidak melakukan perubahan hidrologi?
5. **Interaksi dengan regulasi Indonesia pasca-MRA:** Bagaimana Plan Vivo mengoperasionalkan persetujuan Menteri Kehutanan untuk penerbitan (Permenhut 6/2026 Pasal 24), pencatatan SRUK, dan PNBP — apakah PVC dibatalkan di PV Climate Registry, dicerminkan (*mirrored*), atau tetap di kedua registri? Adakah panduan tertulis untuk proponen Indonesia?
6. **Microscale & IE di Indonesia:** Apakah IE Plan Vivo yang diakui memenuhi persyaratan Permenhut 6/2026 Pasal 43 (ahli perorangan terdaftar pada lembaga akreditasi internasional)? Apakah Plan Vivo memiliki roster IE berbasis Indonesia?
7. **Bukti formal pipeline:** Selain PIN review report dan listing web, apakah Plan Vivo menerbitkan surat konfirmasi status pipeline yang dapat dipakai untuk pendanaan atau untuk instansi pemerintah?
8. **Kedalaman data PIN:** Untuk proyek yang baseline teknisnya masih dikembangkan, apakah estimasi Carbon Benefit kualitatif/indikatif dapat diterima di PIN?
9. **VAT & pembayaran:** Apakah fee berlaku tanpa VAT untuk organisasi Indonesia, dan apa metode pembayaran yang diterima?
10. **Ambang microscale:** Bagaimana bila estimasi mendekati 10.000 tCO2e/th (perbedaan redaksi "<" vs "≤")?

(Tidak ditanyakan karena sudah jelas di dokumen resmi: alamat submission, fee PIN, durasi review indikatif, batas 3 putaran/6 bulan, masa 3 tahun pipeline, larangan metodologi pipeline, aturan buffer.)

29.2 Pertanyaan untuk instansi Indonesia

1. Ditjen PS / BPSKL: prosedur registrasi "mitra atau pendamping teregistrasi" (Permenhut 6/2026 Ps. 6(2)).
2. Ditjen PS / unit NEK Kemenhut: kelayakan perdagangan karbon dari **blok perlindungan HL** (Ps. 9(1)(a)) vs Permen LHK 9/2021 Ps. 121.
3. Kemenhut: format & sistem pencatatan DPP untuk proyek standar internasional; tarif PNBP karbon (Ps. 46).
4. KLH: teks & ketentuan Permen LH/BPLH 10/2026 (SRUK); panduan proponen Plan Vivo pasca-MRA; prosedur Otorisasi/CA.
5. Dinas LHK Kalbar / KPH: status kinerja & RKPS/RKT Hutan Desa Pasir; perlunya revisi RKPS untuk memuat jasa lingkungan karbon.

29.3 Draf email ke Plan Vivo (English)

> **To:** projects@planvivofoundation.org **Subject:** Request for introductory call — Pasir Village Forest Community Carbon Project (West Kalimantan, Indonesia) — PV Climate PIN preparation
>
> Dear Plan Vivo Projects Team,
>
> I am writing on behalf of SAMPAN Kalimantan, an Indonesian non-governmental organisation based in West Kalimantan, which is facilitating the Village Forest Management Institution (LPHD) of Pasir

> Village, Mempawah Regency, in exploring the development of a community-led forest carbon project under PV Climate.
>
> The Pasir Village Forest (Hutan Desa Pasir) is managed by LPHD Pasir under a Social Forestry management approval granted by the Indonesian Ministry of Environment and Forestry in 2019 (Decree SK.10885/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2019). We are at an early, pre-PIN stage: we are currently consolidating institutional arrangements with LPHD Pasir, assembling spatial and tenure documentation, planning the FPIC process, and screening applicable PV Climate methodologies. We have reviewed the Project Requirements V5.7, the Procedures Manual V3.9, the PIN Template V1.4 and the approved methodologies, modules and tools.
>
> We would be grateful for an introductory call to discuss eligibility and timescales before we finalise our PIN. In particular, we would value your guidance on:
>
> 1. Whether SAMPAN Kalimantan may act as Project Coordinator under a written mandate from LPHD Pasir, with LPHD Pasir representing Project Participants collectively;
> 2. How the PT002 applicability condition on "effective community management" in the baseline is assessed for Village Forests that already hold a management approval;
> 3. If the Project Area includes peat swamp forest (the area contains no mangrove), whether PT002 may be applied crediting biomass only, and how peat soil emissions are expected to be treated;
> 4. How Plan Vivo is operationalising, following its Mutual Recognition Agreement with Indonesia's Ministry of Environment, the national requirements for Ministerial approval of issuance and recording in the national Carbon Unit Registry System (SRUK);
> 5. The level of detail expected in the PIN for carbon benefit estimates while technical baselines are still being developed.
>
> We are available at your convenience and can adapt to UK time. Please let us know if a short project summary in advance would be helpful.
>
> Kind regards, [Name] [Position], SAMPAN Kalimantan [Address] · [Email] · [Phone]

Bab 30 — Immediate Recommendations for SAMPAN Kalimantan

1. **Jangan mengajukan PIN sebelum 13 kriteria terpenuhi** — PIN yang lemah memakan putaran revisi (maks. 3) dan berisiko fee ulang.
2. **Prioritaskan dua pemeriksaan "show-stopper"** dalam 6 minggu: (a) fungsi kawasan & blok terhadap Permenhut 6/2026 Ps. 9(1)(a); (b) uji applicability PT002 dengan data tutupan lahan.
3. **Formalkan mandat sebelum berbicara dengan pembeli.** Fasilitasi tidak memberi SAMPAN hak memiliki/menjual kredit; hak menjual PVC lahir dari Project Agreement (PR 3.18.5) dan persetujuan negara.
4. **Daftarkan SAMPAN sebagai mitra/pendamping teregistrasi** sejak dini — wajib untuk pencatatan DPP.
5. **Gunakan preseden Indonesia** (Bujang Raba, Lemo Nakai, Mane) sebagai referensi struktur dokumen, tetapi **jangan menyalin rujukan regulasi lama**.
6. **Rancang FPIC berlapis** dan dokumentasikan secara terpilah gender; consent awal ≠ consent implementasi ≠ persetujuan kontrak.
7. **Siapkan model keuangan realistis** dengan semua deduction (buffer, reserve, uncertainty, leakage, PNBP, fee) sebelum menjanjikan manfaat kepada warga.
8. **Pertimbangkan skala:** bila Carbon Benefit kecil, gunakan jalur microscale (IE) dan/atau aksi mitigasi gabungan dengan Hutan Desa lain (Permenhut 6/2026 Ps. 7).
9. **Komunikasi publik akurat:** sebelum approval gunakan "project under development"; setelah approval "Plan Vivo pipeline project"; "Plan Vivo certified" hanya setelah registrasi.

10. **Terapkan sistem dokumen Bab 26 hari ini** — auditor, Plan Vivo, dan kementerian akan meminta jejak bukti.

LAMPIRAN A — PIN Working Draft (English) — Pasir Village Forest Community Carbon Project

> **Status: WORKING DRAFT v0.1 — NOT FOR SUBMISSION.** Follows the heading sequence of the official *PV Climate V5 PIN Template V1.4*. When transferring to the official .docx: use Calibri 11pt, delete all guidance boxes, keep all tables, use a dot (.) as decimal separator.
>
> Placeholders: **[DATA REQUIRED]** = data must be collected · **[TO BE CONFIRMED]** = information exists but must be verified · **[TECHNICAL ASSESSMENT REQUIRED]** = requires a technical study/decision.
>
> Only facts confirmed in the research brief are stated as facts: project name, location (Hutan Desa Pasir, Mempawah Regency, West Kalimantan), LPHD Pasir, decree SK.10885/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2019, SAMPAN Kalimantan as facilitating organisation, PV Climate as intended standard. Everything else is a placeholder. AI was used to prepare this draft structure; disclose in Annex 6 if retained.

OVERVIEW

Field	Draft content
Project Title	Pasir Village Forest Community Carbon Project
Location	Indonesia; Pasir Village, [Mempawah Hilir Sub-district — TO BE CONFIRMED], Mempawah Regency, West Kalimantan Province
Project Coordinator	[TO BE CONFIRMED — proposed: SAMPAN Kalimantan], [address], [email], [phone]
Project Area	Initial Project Area of [DATA REQUIRED] ha within the Village Forest (Hutan Desa) working area granted under Decree SK.10885/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2019 (total Hutan Desa area: [TO BE CONFIRMED] ha). Expansion plans: [DATA REQUIRED / none at this stage].
Project Participants	The Village Forest Management Institution (LPHD) Pasir, representing [DATA REQUIRED] households ([DATA REQUIRED] people) of Pasir Village who use land and natural resources in the Project Region for subsistence or small-scale production.
Project Intervention(s)	1. Protection — [community-based protection of the Village Forest against deforestation and forest degradation — TECHNICAL ASSESSMENT REQUIRED]. 2. Restoration — [assisted natural regeneration / planting of native species on degraded areas — TECHNICAL ASSESSMENT REQUIRED].
Expected Benefits	Carbon: [reduced emissions from avoided deforestation/degradation and/or removals from restoration — magnitude TECHNICAL ASSESSMENT REQUIRED]. Livelihood: [DATA REQUIRED — from participatory design]. Ecosystem: [DATA REQUIRED — e.g. habitat conservation, hydrological and peat protection if peat is present — TO BE CONFIRMED].
Methodology	[TECHNICAL ASSESSMENT REQUIRED] Candidate: PV Climate PM001 *Agriculture & Forestry Carbon Benefit Assessment Methodology* V1.0, with Module PU002 and Tool PT002 (*Estimation of carbon benefits from REDD in community managed forest*) for protection, and Module PU001 V1.1 for restoration, subject to confirmation of applicability conditions.
PIN Version	0.1 (draft)
Date Approved	(leave blank)

1 General Information

1.1 Project Interventions

Table 1.1 – Project Interventions

Intervention Type	Project Intervention	Expected Benefits
Protection	[Draft] Strengthening LPHD Pasir's management of the Village Forest through an updated Village Forest Management Plan, community patrols and monitoring, [fire prevention — TO BE CONFIRMED if peat present], and agreed resource-use rules, to reduce deforestation and degradation driven by [DATA REQUIRED: drivers].	Climate: avoided emissions relative to the baseline [magnitude TECHNICAL ASSESSMENT REQUIRED]. Livelihood: [DATA REQUIRED]. Ecosystem: [DATA REQUIRED].
Restoration	[Draft] Assisted natural regeneration and enrichment planting with native species on [DATA REQUIRED] ha of degraded land within the Village Forest.	Climate: GHG removals [TECHNICAL ASSESSMENT REQUIRED]. Livelihood: [DATA REQUIRED]. Ecosystem: [DATA REQUIRED].

1.2 Project Boundaries

[Insert map(s): Project Region, Project Area(s), legally designated protected areas within/adjacent — DATA REQUIRED]

Table 1.2 Project Boundaries

Field	Content
Location	Indonesia; West Kalimantan Province; Mempawah Regency; [Sub-district TO BE CONFIRMED]; Pasir Village
Project Region(s)	1 Project Region: [administrative area of Pasir Village — TO BE CONFIRMED], [DATA REQUIRED] ha
Project Area(s)	[DATA REQUIRED] Project Area(s) totalling [DATA REQUIRED] ha within the Village Forest working area
Protected Areas	[DATA REQUIRED — check national conservation areas, protection forest (Hutan Lindung) status, peat ecosystem protection function (KHG)]

1.3 Land and Carbon Rights

[Draft wording — legal review required before use] The Project Areas are located within state forest land for which the Minister of Environment and Forestry granted a Village Forest management approval (*Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa*) to Pasir Village, managed by LPHD Pasir, through Decree SK.10885/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2019 dated [TO BE CONFIRMED], for a period of [TO BE CONFIRMED — 35 years as per regulation, TO BE CONFIRMED in decree] covering [TO BE CONFIRMED] ha. Under this approval, LPHD Pasir holds the right to manage and utilise the Village Forest in accordance with its approved management plan. The land remains state forest land.

Under Indonesian law, carbon is governed by Presidential Regulation No. 110/2025 on Carbon Economic Value Instruments and National GHG Emission Control (which revoked Presidential Regulation No. 98/2021) and, for the forestry sector, Minister of Forestry Regulation No. 6/2026 on Procedures for Carbon Trading through GHG Emission Offsets in the Forestry Sector. Under Regulation No. 6/2026, holders of Social Forestry management approvals (including Village Forests) are eligible to trade carbon (Art. 6(1)(b)) with the support of a registered partner or facilitator (Art. 6(2)), which prepares the project design document for recording with the Ministry (Art. 13(1)(b)). Carbon units issued by an international standard require the Minister of Forestry's approval for issuance (Art. 10, 24), must be recorded in the national Carbon Unit Registry System (SRUK), and are subject to a non-tax state levy on transactions (Art. 46). Transfers used towards another country's NDC or other international obligations additionally require authorisation and a corresponding adjustment (Presidential Regulation 110/2025, Art. 68). [Confirm the

forest function and management block of the Project Areas against Art. 9(1)(a) of Regulation 6/2026 — TO BE CONFIRMED.] [Describe status of each step — DATA REQUIRED.] The Project will pursue these requirements in parallel with PIN/PDD development.

---

2 Stakeholder Engagement

2.1 Stakeholder Identification

Stakeholder group	Local / Secondary	Relationship to the project
LPHD Pasir (members and board)	Local	Holder of village forest management responsibilities; proposed representative of Project Participants
Households of Pasir Village using forest resources	Local	Potential Project Participants; affected by resource-use rules
Women's groups	Local	[DATA REQUIRED]
Youth	Local	[DATA REQUIRED]
Vulnerable households (landless, low-income)	Local	[DATA REQUIRED]
[Fuelwood/NTFP collectors, smallholder farmers — TO BE CONFIRMED]	Local	[DATA REQUIRED]
Pasir Village Government & Village Consultative Body (BPD)	Secondary [TO BE CONFIRMED — may be Local]	Village governance; establishment of LPHD
Forest Management Unit (KPH) [name TO BE CONFIRMED]	Secondary	Site-level forest administration
Social Forestry & Environmental Partnership Center (BPSKL) Kalimantan	Secondary	Social forestry facilitation & oversight
West Kalimantan Provincial Environment & Forestry Service	Secondary	Provincial forestry authority
Mempawah Regency Government (Bappeda, Environment Service)	Secondary	Local planning
National ministry unit(s) responsible for social forestry and for climate change / SRN-PPI	Secondary	Licensing, registration, authorisation
SAMPAN Kalimantan	Secondary (facilitator / proposed Project Coordinator)	Facilitation and coordination
[Other NGOs, academia, private sector — DATA REQUIRED]	Secondary	

Indigenous Peoples / local communities with statutory or customary rights in the Project Area: [DATA REQUIRED — results of stakeholder analysis and customary claims assessment].

2.2 Project Coordination and Management

[Describe Project Coordinator and partners; summarise experience; reference Annex 2.]

Table 2.2 Responsibility for Project Coordination and Management Functions (draft allocation — subject to LPHD–SAMPAN agreement)

Function	Responsible Party/Parties
Stakeholder engagement during project development and implementation	SAMPAN Kalimantan with LPHD Pasir
Ensuring conformance with PV Climate and compliance with applicable policies, laws and regulations	SAMPAN Kalimantan

Function	Responsible Party/Parties
Developing technical specifications, land management plans and project agreements with project participants	SAMPAN Kalimantan (technical lead) with LPHD Pasir
Ensuring that the PDD is updated with any changes to the project	SAMPAN Kalimantan
Registration and recording of land management plans, project agreements, monitoring results, and sales agreements	SAMPAN Kalimantan
Managing project finances and dispersal of income to project participants as described by the benefit sharing mechanism	[TO BE CONFIRMED — SAMPAN Kalimantan and LPHD Pasir under joint oversight]
Managing Plan Vivo Certificates in the PV Climate Registry	[TO BE CONFIRMED — Project Coordinator]
Preparing annual reports and coordinating validation and verification events	SAMPAN Kalimantan
Securing certificate sales and other means of funding the project	[TO BE CONFIRMED — Project Coordinator with LPHD consent per governance rules]
Assisting project participants to secure any legal or regulatory permissions required to carry out the project	SAMPAN Kalimantan
Providing technical assistance and capacity building	SAMPAN Kalimantan [+ technical partners TO BE CONFIRMED]
Monitoring progress, livelihood and ecosystem indicators and providing ongoing support	LPHD Pasir (field monitoring) with SAMPAN Kalimantan
Measurement, reporting and verification of carbon benefits	SAMPAN Kalimantan [+ technical consultant TO BE CONFIRMED]

2.3 Project Participants

[For each intervention: participants, location relative to Project Area/Region — DATA REQUIRED.] Participants not meeting PR 2.3.1/2.3.2: [None expected — TO BE CONFIRMED].

2.4 Participatory Design

[Describe completed and planned activities with dates, numbers of participants disaggregated by gender, tools used, and inclusion measures — DATA REQUIRED.]

2.5 FPIC Process

[Describe the rights-holder-defined decision process and timeline; representatives; how women and vulnerable groups are involved; stage (i) consent status and documentation; plans for stage (ii) and (iii) — DATA REQUIRED.]

---

3 Project Design

3.1 Baseline Scenario

[Land-use change analysis ≥10 years; drivers; expected trajectory without the project; explicit assessment of the effectiveness of existing LPHD management since 2019 — TECHNICAL ASSESSMENT REQUIRED.]

3.2 Livelihood Baseline

[Per local stakeholder group — DATA REQUIRED.]

3.3 Ecosystem Baseline

[Ecosystem types (peat swamp forest / mineral-soil forest — TO BE CONFIRMED; the Project Area contains no mangrove), habitat condition, species of conservation concern — DATA REQUIRED.]

3.4 Project Logic (Table 3.4)

	Description	Assumptions/Risks
Aim	[Problem statement from participatory problem analysis — DATA REQUIRED]	
Carbon Benefit	[TECHNICAL ASSESSMENT REQUIRED]	[e.g. drivers can be addressed through community management and alternative livelihoods]
Livelihood Benefit	[DATA REQUIRED]	
Ecosystem Benefit	[DATA REQUIRED]	
Output 1	Updated village forest management plan and LPHD governance	[risk/mitigation]
Output 2	Community patrol and monitoring system operational	[risk/mitigation, incl. safety of patrollers]
Output 3	[DATA REQUIRED] ha under restoration	[seedling mortality, fire, flooding — TO BE CONFIRMED]
Output 4	[Livelihood enterprises — DATA REQUIRED]	
Output 5	Grievance mechanism and benefit-sharing system established	

3.5 Additionality (Table 3.5)

Project Intervention	Main Barriers	Activities to Overcome Barriers
Protection	Financial: [e.g. no sustained funding for patrols — DATA REQUIRED]. Technical: [DATA REQUIRED]. Institutional: [DATA REQUIRED]. Social: [DATA REQUIRED]. Regulatory surplus: [TECHNICAL/LEGAL ASSESSMENT REQUIRED].	[DATA REQUIRED]
Restoration	[DATA REQUIRED]	[DATA REQUIRED]

3.6 Exclusion List

[Statement that no excluded activities are included — complete Annex 3.]

3.7 Environmental and Social Screening

See Annex 4.

3.8 Double Counting

[Overlap check: other GHG projects (Verra, Gold Standard, Plan Vivo, national registry), government programmes (FOLU Net Sink 2030, results-based payment programmes, forest and land rehabilitation (RHL) and peat restoration programmes) — DATA REQUIRED.]

Table 3.8 — [Complete with current regulations; see Vol. I Ch. 5 for the legal analysis.]

---

4 Governance and Administration

4.1 Governance Structure

[Current LPHD structure (fact) + proposed project governance (proposal) + organigram.]

4.2 Legal and Regulatory Compliance

Authorities: [list]. Evidence of notification: Annex 5. Statement: "The Project will operate in full compliance with all applicable national and international policies, laws and regulations, and will obtain all registrations, approvals and authorisations required under Indonesian law before any transfer of carbon units."

4.3 Financial Plan

[Development budget to validation and funding sources — DATA REQUIRED.]

ANNEXES

- Annex 1 – Project Boundaries: [KML/SHP]
- Annex 2 – Registration Certificate: [Project Coordinator deed + Ministry of Law approval, with English translation]; [consent statement if applicable]
- Annex 3 – Exclusion List: [complete 27 items]
- Annex 4 – Environmental and Social Screening: [Sections A–C]
- Annex 5 – Notification of Relevant Authorities: [letters + receipts]
- Annex 6 – AI Tool Use Disclosure: [complete]
